

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

RENDICION PUBLICA DE CUENTAS

2017

Prof. Artemio Mamani Characayo

Alcalde Municipal.

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

POTOSI - BOLIVIA

La Presente Rendición Pública de Cuentas Contiene toda la información de la gestión 2017, concerniente a la Administración del Gobierno Autónomo Municipal de Llalagua. En función de una planificación estratégica que nos permitió:

Formular la Programación Operaciones Anual (POA) de la gestión 2017 y la programación presupuestaria.

Determinar los recursos Municipales en función de Objetivos Institucionales, de Objetivos de Gestión, de los objetivos que persigue el desarrollo de nuestro Municipio.



POTOSI - BOLIVIA

M

A

R

C

O

L

E

G

A

L

De acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ley N° 482 del 9 de enero del 2014 donde los Gobiernos Autónomos Municipales están constituidos por:


a

Concejo Municipal.

b

Órgano Ejecutivo.

El presupuesto Municipal se elabora bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, y está conformado por el presupuesto del Órgano Ejecutivo y el presupuesto del Concejo Municipal.



POTOSI - BOLIVIA

M

A

R

C

O

L

E

G

A

L

Artículo 24. (Estructura organizativa) según la ley 482 el órgano ejecutivo estará conformado por:

- a La alcaldesa o el alcalde municipal.
- b Las Secretarías Municipales.
- c Sub Alcaldías.

Artículo 26. Parágrafo 20.- Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto,



POTOSI - BOLIVIA

TRANSFORMAR LLALLAGUA:

Se está transformando y consolidado en una ciudad intermedia, de oportunidades con infraestructura urbana y rural de vanguardia, con mayores niveles de acceso a

a servicios básicos

b Mejorar la Educación

c Mejorar la Salud

d Con avances cualitativos en desarrollo humano



GENERAL:

Impulsar el desarrollo Integral, sustentable de Transformación del Municipio de Llalagua Trabajando en la mejora siempre de la Educación, Salud, Servicios básicos, infraestructura, seguridad Ciudadana y otros, tanto en el área Urbana y El Área Rural del Municipio.

ESTRATEGICOS:

- a) Ejecutar El Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo
- b) Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y Rural
- c) Priorizar la Transparencia como paradigma

RECURSOS POA 2017



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

POTOSI - BOLIVIA

1.- ASIGNADOS 2017 M.E.F.P. Y REGALIAS

Cuadro N° 1

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Coparticipación Tributaria	31.857.693 Bs.	32.861.428 Bs.	1.003.735 Bs.
2	Recursos IDH	10.479.374	11.544.388	1.065.014
3	Recursos Regalías Mineras	450.000	727.765	277.765
	TOTAL	42.787.067 Bs.	45.133.581 Bs.	2.346.514 Bs.

2.- RECURSOS PROPIOS 2017

Cuadro N° 2

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Recursos Propios	8.000.000 Bs	7.607.008 Bs.	-392.992 Bs.
2	Recursos de Energía eléctrica	6.000.000	6.964.034	964.034
	TOTAL	14.000.000 Bs.	14.571.042 Bs.	571.042 Bs.



Fuente: Dirección Financiera

3.- SALDOS 2016

Cuadro N° 3

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Saldos Caja Bancos 2016	21.956.095 Bs.	21.956.095 Bs.	0
	TOTAL 2	21.956.095 Bs.	21.956.095 Bs.	0

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro N° 4

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
o	Otras fuentes UPRE GOB. POTOSI, MIN DE MEDIO AMBIENTE UNFPA	13.229.437 Bs.	13.229.437 Bs.	0
	TOTAL 2	13.229.437 Bs.	13.229.437 Bs.	0



TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION POA 2017

Cuadro N° 5

N°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO
1	RECURSOS ASIGNADO 2017	42.787.067 Bs	45.133.581 Bs.
2	RECURSOS PROPIOS	14.000.000 Bs.	14.571.042 Bs.
3	SALDOS CAJA BANCOS 2016	21.956.095 Bs.	21.956.095 Bs.
4	RECURSOS DE CONTRA PARTE (TRANSFERIDOS)	13.229.437 Bs.	13.229.437 Bs.
	TOTAL DE RECURSOS	91.972.599 Bs.	94.890.155 Bs.

TOTAL PROGRAMADO POA 2017

91.972.600 Bs

Fuente: Dirección Financiera

1

GASTOS RECURRENTE OBLIGATORIOS POR LEY

2

GASTOS RECURRENTE POR COMPETENCIAS MUNICIPAL

3


GASTOS PARA CONVENIOS

4

GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO

5

GASTOS PARA INVERSION (Disponible para Formular)



DESGLOSE DE GASTO POR PARTIDA

Cuadro N° 6

a) Programas e Inversion

N°	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
1	PROM. Y FOMENTO A LA PROD AGROPECUARIA	512.829 Bs.	82.000 Bs.	430.829 Bs.	16
2	SANEAMIENTO BASICO	632.005	207.105	424.900	33
3	CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS	361.089	344.280	16.809	95
4	DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	428.741	428.741	-	100
5	ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.050.429	1.050.429	0	100
6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	741.511	633.235	108.277	85
7	INFRAESTUCTURA URBANA Y RURAL	8.565.403	5.755.113	2.810.290	67
8	GESTION DE CAMINOS VECINALES	1.858.202	1.114.459	743.743	60
9	SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL	329.148	121.167	207.981	37
10	GESTION DE SALUD (2)	16.043.959	11.467.151	4.576.808	71

Fuente: Dirección Financiera

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

EJECUCION

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
11	GESTION DE EDUCACION	20.525.503	17.438.126	3.087.377	85
12	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	7.426.421	1.352.402	6.074.019	18
13	PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO	120.733	120.733	0	100
14	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	4.208	4.208	-	100
15	PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	731.379	300.377	431.002	41
16	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)	311.048	269.140	41.908	87
17	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	250.608	250.608	0	100
18	GESTION DE RIESGOS	157.392	155.436	1.956	99
19	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	521.573	453.804	67.769	87
20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10.854.695	10.607.896	246.799	98
21	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	10.581.301	7.145.344 Bs.	3.435.957	68
TOTAL		91.972.600	69.113.703	22.858.895	75

Fuente: Dirección Financiera

b) Gasto de funcionamiento del H. Concejo

Cuadro N° 7

N°	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO AL 31/12/2017
1	SERVICIOS PERSONALES	960.357	960.355	2
2	SERVICIOS NO PERSONALES	114.312	111.686	2.626
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.479	84.593	3.886
SUB TOTAL		1.163.148	1.156.634	6.514



99 %

Fuente: Dirección Financiera

c) Gasto de funcionamiento del Ejecutivo Municipal

Cuadro N° 8

N°	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	7.323.091	7.323.091	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	453.927	308.467	145.460
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	968.640	968.140	500
4	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	1.714	1.714	-
5	OTROS GASTOS	53.903	53.903	-
	SUB TOTAL	8.801.275	8.655.315	145.960

TOTAL CONCEJO Y EJECUTIVO MUNICIPAL	9.964.423	9.811.949	152.474	98%
--	------------------	------------------	----------------	------------

Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO

Cuadro N° 9

No	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	%
		PROGRAMADO	EJECUTADO	31/12/2017	%
3	GASTOS DE INVERSION	82.008.176 Bs.	59.301.755 Bs.	22.706.421 Bs.	72
1	GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.163.148 Bs.	1.156.634 Bs.	6.514 Bs.	99
2	GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	8.801.275 Bs.	8.655.315 Bs.	145.960 Bs.	98
	TOTAL	91.972.600 Bs.	69.113.703 Bs.	22.858.897	75%



Fuente: Dirección Financiera



POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

RESUMEN TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA

75%

Cuadro N° 10



Ejecución Física



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Procesos de contratación Nuevos)

Nº	MODALIDAD	CUANTIA	TIPO DE CONTRATACION	CANTID
1	CONTRATACION MENOR	De Bs20.000 hasta Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	32
			ADQUISICIONES	40
			CONSULTORIAS	15
			SERVICIOS GENER.	13
2	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)	Mayor a Bs 50.000.-(00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs.1.000,000 UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	32
			ADQUISICIONES	27
			CONSULTORIAS	4
			SERVICIOS GENER.	3
3	LICITACION PUBLICA (LP)	Mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON UN 00/100 BOLIVIANOS ADELANTE)	OBRAS	1
			ADQUISICIONES	3
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	0
4	CONTRATACION POR EXCEPCION	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	8
			ADQUISICIONES	14
			CONSULTORIAS	3
			SERVICIOS GENER.	0
5	CONTRATACION DIRECTA	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	2
			ADQUISICIONES	0
			CONSULTORIAS	0
			SERVICIOS GENER.	1
TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION				200




POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (OBRAS)

TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION	OBSERVADO				
117	93	17	2	5				
100,00%	79,49%	14,53%	1,71%	4,27%				

AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
86,75%	13,25%	100,00%

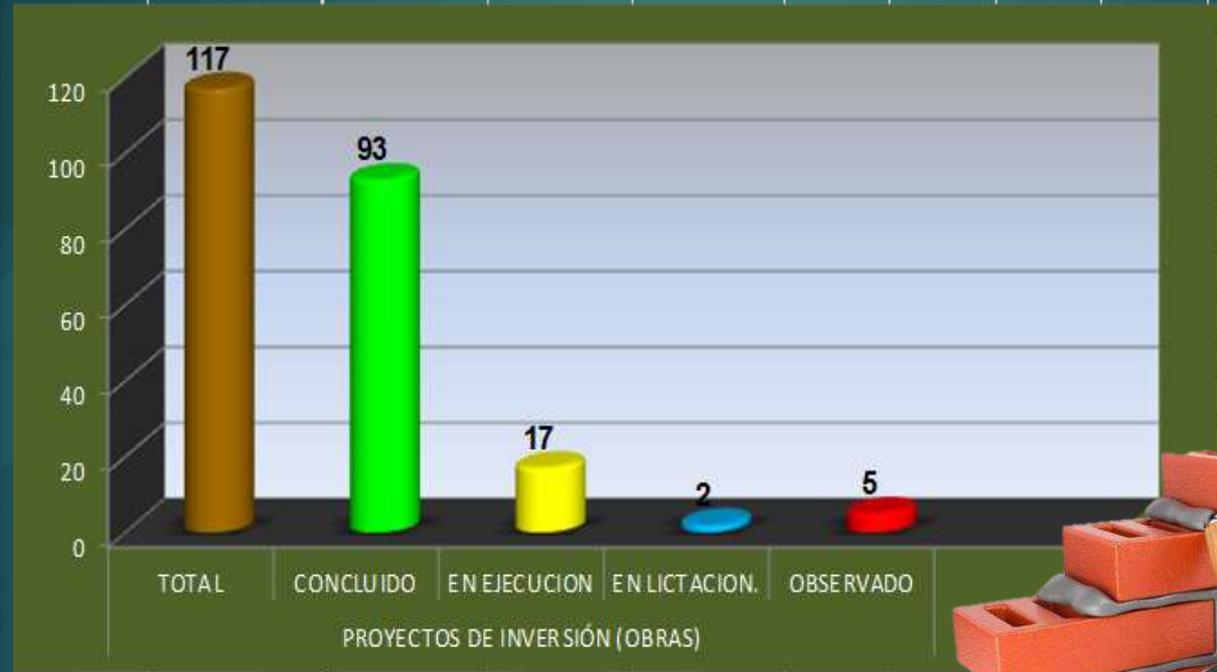


POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Adquisición de Bienes)

TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO				
41	29	7	2	3				
100,00%	70,73%	17,07%	4,88%	7,32%				

AVANCE FISICO	POR EJECUTAR	TOTAL
79,27%	20,73%	100,00%

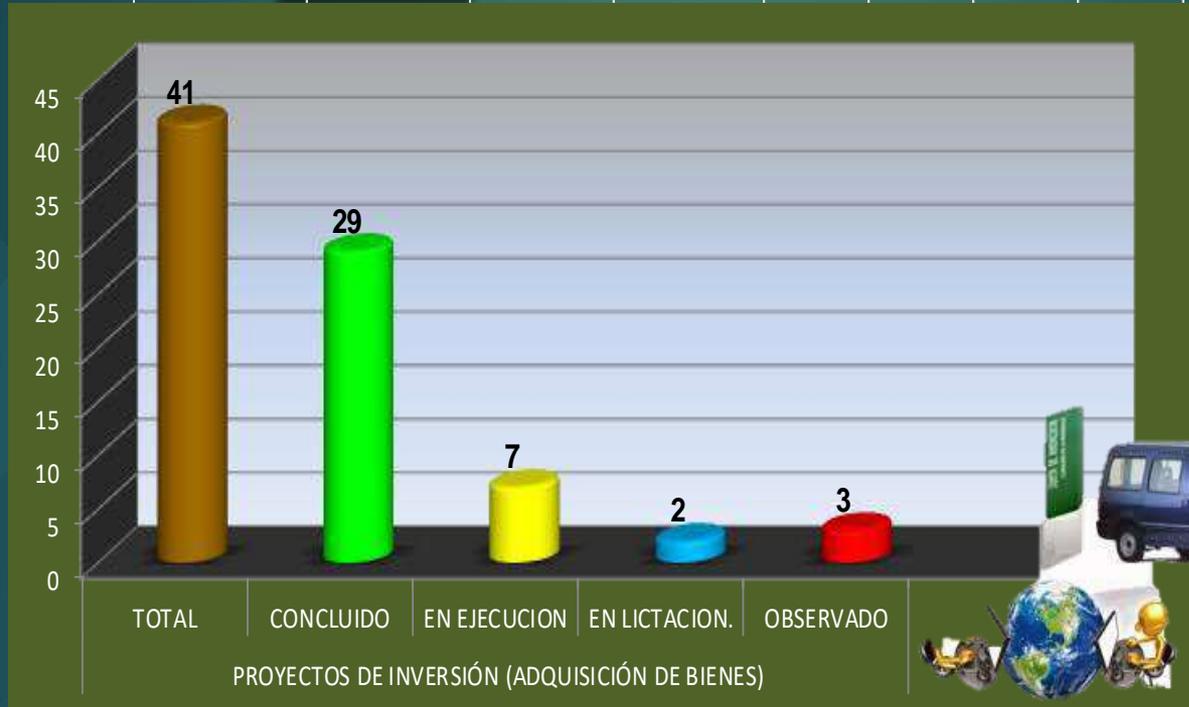


POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Estudios de Pre inversión)

TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO				
16	3	8	2	3				
100,00%	18,75%	50,00%	12,50%	18,75%				

AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
43,75%	56,25%	100,00%

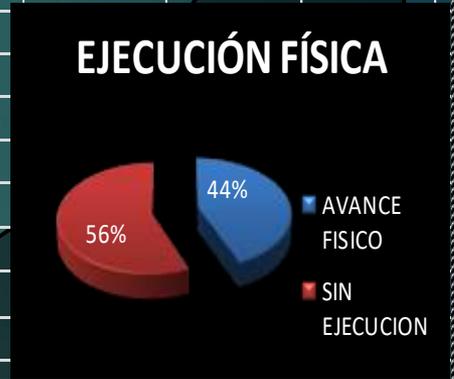



POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Programas)

PROGRAMAS								EJECUCIÓN FÍSICA GENERAL		
TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO				AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
54	34	17	0	3				78,70%	21,30%	100,00%
100,00%	62,96%	31,48%	0,00%	5,56%						



Fuente: Dirección Financiera



POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Convenios)

TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO						AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
8	2	4	1	1						50,00%	50,00%	100,00%
100,00%	25,00%	50,00%	12,50%	12,50%								





POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Funcionamiento)

TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO				
10	9	1	0	0				
100,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%				

AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
95,00%	5,00%	100,00%



Fuente: Dirección Financiera



POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Otros Programas)

TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO				
18	8	9	0	1				
100,00%	44,44%	50,00%	0,00%	5,56%				

AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
69,44%	30,56%	100,00%



Fuente: Dirección Financiera




POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FISICA (Resumen Total)

TOTAL							
TOTAL	CONCLUIDO	EN EJECUCION	EN LICITACION.	OBSERVADO			
264	178	63	7	16			
100,00%	67,42%	23,86%	2,65%	6,06%			

EJECUCIÓN FÍSICA GENERAL		
AVANCE FISICO	SIN EJECUCION	TOTAL
79,36%	20,64%	100,00%

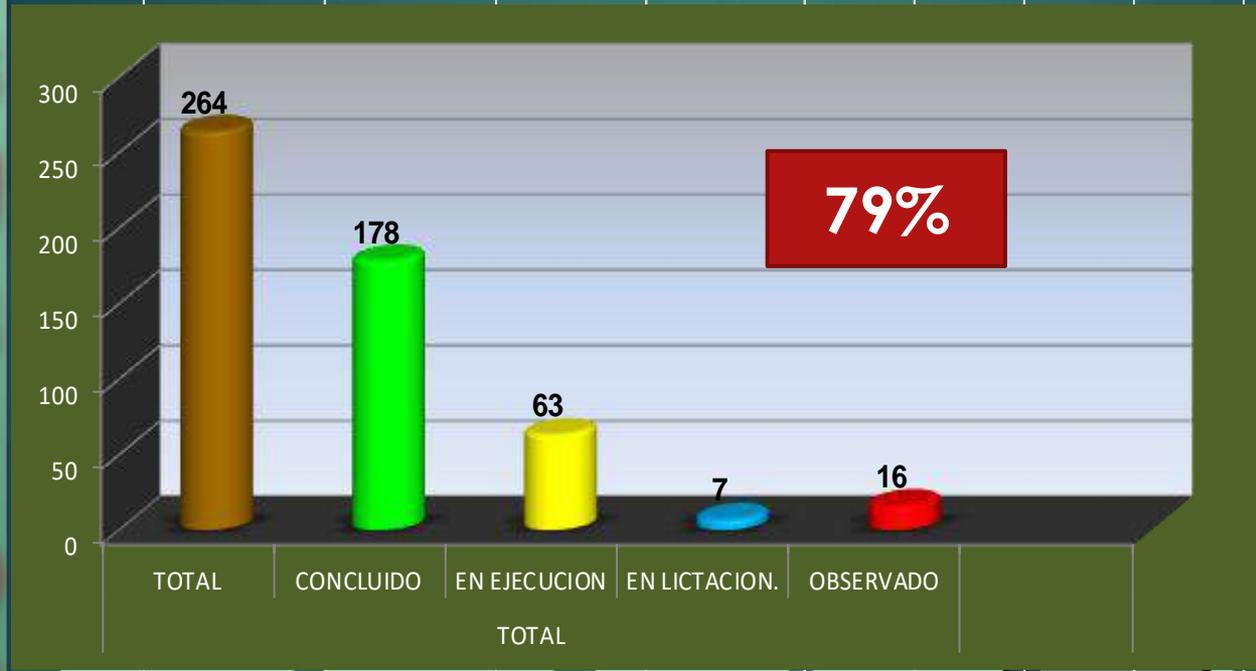




POTOSI - BOLIVIA

E
J
E
C
U
C
I
O
N

EJECUCION FINANCIERA VS. FISICA

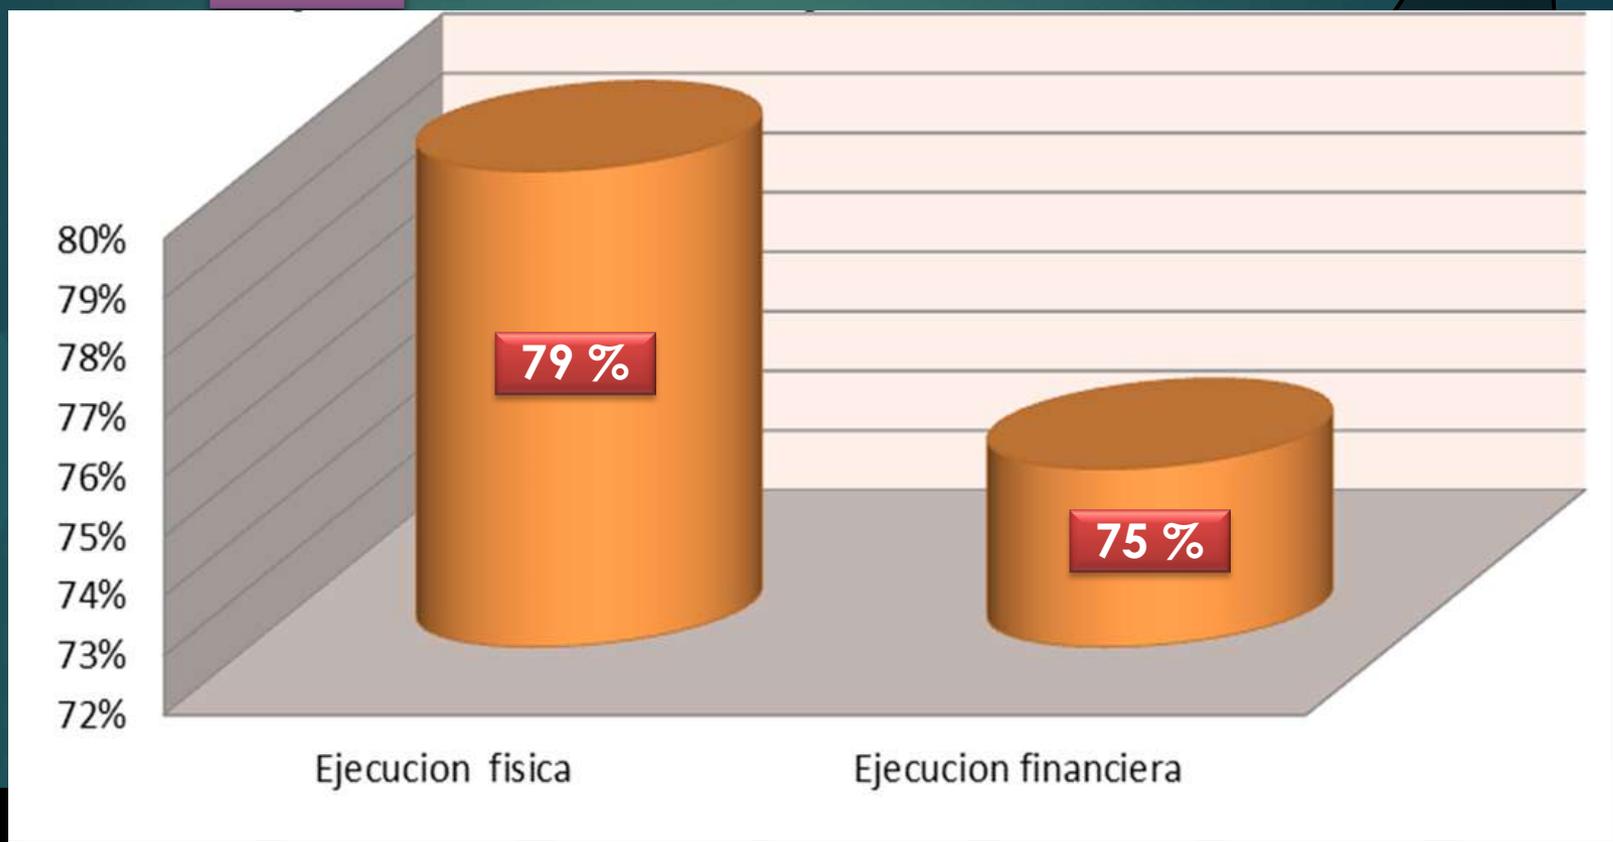

DESGLOSE DE PROGRAMAS



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

ADQUICISION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS Y VERDURAS) para los centros PAPI Gestión 2017



DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD CONTRATO POR EXCEPCION/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	174.492,50 Bs
TOTAL EJECUTADO	168.509,90 Bs
MONTO TOTAL DE CONTRATO	174.492,50 Bs
CONTRATISTA	UNIALIMENTOS Heidi Eskarlen González Saavedra
SUPERVISOR	Ximena Paillo Aguilar
TIEMPO DE EJECUCION	245 D/C

FECHA INICIO DEL PROGRAMA	13/marzo/2017
FECHA DE EN CONCLUSIÓN	19 de Noviembre 2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 96,57 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 168.509,90

Observaciones.- Se realizo la entrega de alimentos frescos (frutas y verduras) con toda normalidad durante la gestión 2017.



IMAGEN ACTUAL



ADQUICISION DE ALIMENTOS FRESCOS (CARNES) para los centros PAPI Gestión 2017



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD CONTRATO POR EXCEPCION/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	140.58, 00 Bs
TOTAL EJECUTADO	125.427, 96 Bs
MONTO TOTAL DE CONTRATO	140.581,00 Bs
CONTRATISTA	FRIAL SANTIAGO Heidi JENNY ESCARLEN MARISCAL ROSELIO
SUPERVISOR	Ximena Paillo Aguilar
TIEMPO DE EJECUCION	245 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	13/marzo/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	19 de Noviembre 2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 89 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 125.427,96

Observaciones.- Se realizo la entrega de alimentos frescos (CARNES) con toda normalidad durante la gestión 2017.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA CONCENTRADA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
PRESUPUESTO PROGRAMADO	3.435.641,60
COSTO PROYECTO	43,707,73 Bs.
CONTRATISTA	UNIALIMENTOS
SUPERVISOR	Alain Daza Ojeda
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión Escolar 2017

FECHA ORDEN A PROCEDER	21/03/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	04/05/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	16/06/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 43,707,73
MONTO POR PAGAR	Bs.- 0,00



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMA HOSPEDAJE ESTUDIANTIL EN FAMILIA (CAPUNITA, JISKANKI Y UYUNI)



PULLANA WASI

FECHA INICIO DE FUNCIONAMIENTO	27/FEBRERO/2017
FECHA DE CULMINACION	15/DICIEMBRE/2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 98.70 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 493,504.56

Observaciones.- NINGUNA

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	500.000 Bs.
COSTO PROYECTO	500.000 Bs.
SUPERVISOR	Cinthia Ramírez Guzmán
TIEMPO DE EJECUCION	GESTION 2017



PULLANA WASI



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA



DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	459,606,00 Bs
COSTO PROYECTO	459,195,00 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL: RUBEN MITMA JORGE
TIEMPO DE EJECUCION	165 D/E

Observaciones.- Tiene el propósito de garantizar la permanencia y continuidad escolar de estudiantes, que viven en lugares alejados a la escuela, dentro el Ayllu Chullpa del municipio de Llallagua

TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA

DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	459,606,00 Bs
COSTO PROYECTO	459,195,00 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL: RUBEN MITMA JORGE
TIEMPO DE EJECUCION	165 D/E

Observaciones.- Tiene el propósito de garantizar la permanencia y continuidad escolar de estudiantes, que viven en lugares alejados a la escuela, dentro el Ayllu Chullpa del municipio de Llallagua



SEGURIDAD CIUDADANA GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO



DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
COSTO PROYECTO	521.573 Bs.
SUPERVISOR	Milton Rojas
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2017



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA ORDEN A PROCEDER	
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	
MONTO EJECUTADO	Bs.- 453.804.41 Bs
MONTO POR PAGAR	Bs.- 67768,49



Observaciones.- Presupuesto destinado al fortalecimiento y apoyo de la Policía Regional y programas de Seguridad Ciudadana.

IMAGEN ACTUAL



SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL SLIM



VIOLENCIA PSICOLOGICA	180 Casos
VIOLENCIA FISICA-PSICOLOGICA	121 Casos
VIOLENCIA PSICOLOGICA-ECONOMICA	22 Casos
VIOLENCIA SEXUAL	7 Casos
VIOLENCIA FISICA-PSICOLOGICA-SEXUAL	2 Casos
VIOLENCIA FISICA-SEXUAL	1 Casos
TOTAL	333 Casos

ACTIVIDADES REALIZADAS

PREVENCION Y DIFUSION	<ul style="list-style-type: none"> -Taller de socialización sobre la Ley N° 348. -Taller Código de Familia. -Caravana Pre-Carnavalera en contra de la Violencia en la familia. -Taller de Socialización de la Red Municipal de lucha contra la violencia del municipio de Llallagua -Otros talleres.
CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD	<ul style="list-style-type: none"> -Se realizo una campaña de solidaridad con apoyo de los vecinos de la Zona 2, para recolectar un apoyo económico el cual cubra los gastos de sepelio de una victima de cáncer de cuello uterino.



Observaciones.- Ninguna



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD



DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	40,000 Bs.
UNIDAD	Unidad Municipal de Apoyo a la Discapacidad.
RESPONSABLE	Rossio E. Carvajal Ch.
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2017

PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA

Discapacidad Auditiva	25
Discapacidad Físicas Motoras	56
Discapacidad Intelectual	59
Discapacidad Múltiple	34
Discapacidad Psíquico	2



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.-(Unidad de Atención Municipal a la Discapacidad) tiene el deber de realizar actividades positivas a favor de las Personas con Discapacidad velando su dignidad, derechos, bienestar, participación e igualdad de oportunidades.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN



PROGRAMA DE POST-ALFABETIZACION G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	20.000,00.- Bs.
FINANCIAMIENTO EJECUTADO G.A.M.LL.	15.590,00 Bs.
CONTRATADO	JUAN JOSE MAMANI QUISPE
SUPERVISOR	HENRRY VARGAS JIMÉNEZ
TIEMPO DE EJECUCION	6 MESES

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE CONTRATO	01/07/2017
FECHA DE CLAUSURA	28/11/2017
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/12/2017
AVANCE DEL PLAN CURRICULAR ANUALIZADO SEGÚN AL R.M. 001/2017	95 %

Observaciones.- El programa de Post – Alfabetización brinda apoyo con el desarrollo Pedagógico en Unidades Educativas para personas adultas las cuales tienen la oportunidad de culminar sus estudios.



IMAGEN ACTUAL

G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017




APOYO A FUNCIONAMIENTO SALUD



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	4,174,625
Programa apoyo al funcionamiento Salud	4,174,625

APOYO A FUNCIONAMIENTO UNI

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	110,000,00
Funcionamiento UNI	89,059,62

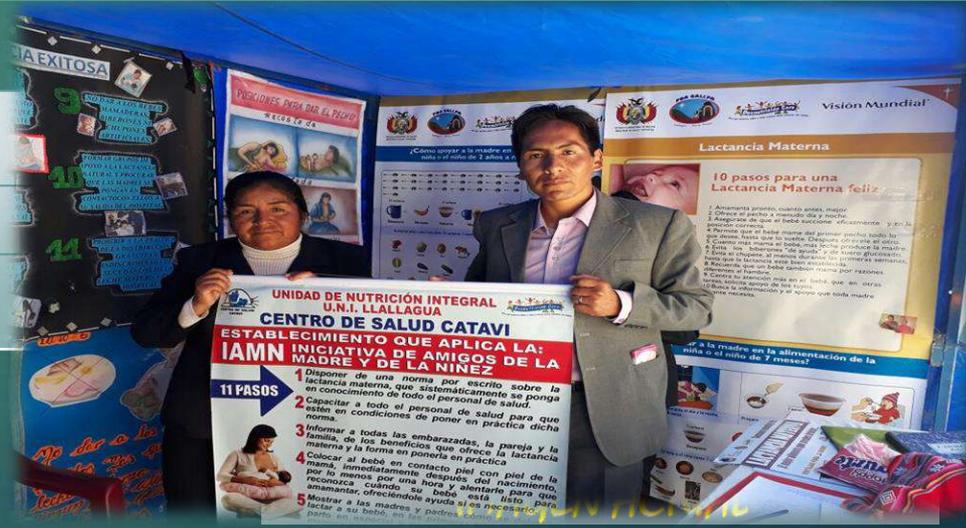

APOYO A FUNCIONAMIENTO SALUD



Personal con contratos Municipales

Medicos	6
Odontólogos	2
Bioquímicos	12
Lic. Enfermería	20
Tec. Laboratorio	1
Aux. de enfermería	13
Planter administrativa	15
Choferes porteros tecnicos	10
Personal de servicio	11

Total 92



PRIMER NIVEL : 33

CSMO 13

CATAVI 9

SIGLO XX 11

SEGUNDO NIVEL: 48

SAFCI: 3

UNI: 2

CRILL: 5

SACA -SACA : 1

TOTAL: 92 CONTRATOS MUNICIPALES



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

BONO JUANA AZURDUY



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	17,248,00
BONO JUANA AZURDUY	15,149,00
Empresa	
Avance Financiero	88%



Observaciones.-



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

PROGRAMA VIH SIDA

CASOS DE VIH

2010	3
2011	6
2012	7
2013	4
2015	2
2016	6
2017	3
TOTAL	31

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	45,819,00
VIH SIDA	43,895,00
Empresa	
Avance Financiero	95 %



ADQUISICION DE TIRAS RAPIDA



ADQUISICION DE PVM

Adquisición de Bienes



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO EDUCATIVO U.E. MARISCAL SUCRE



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100%
COSTO PROYECTO	249.661,00 BS.-
CONTRATISTA	MANUFACTURAS METALICAS "VOLCAN"
SUPERVISOR	COMISION DE RECEPCION DE BIENES
TIEMPO DE EJECUCION	39 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	25/SEPTIEMBRE/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	23/OCTUBRE/2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 100 %
MONTO CANCELADO	249.661,00 Bs.-
MONTO POR PAGAR	0.00 Bs.-

Observaciones.-



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVO 1° DE MAYO B



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100 %
COSTO PROYECTO	539.630,00 BS.-
CONTRATISTA	MANUFACTURAS METALICAS "VOLCAN"
SUPERVISOR	COMISION DE RECEPCION DE BIENES
TIEMPO DE EJECUCION	39 D/C

FECHA INICIO DE LA ADQUISICION	20/JUNIO/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	23/OCTUBRE/2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 100 %
MONTO CANCELADO	539.630,00 Bs.-
MONTO POR PAGAR	0.00 Bs.-

Observaciones.-



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EDUCATIVO U.E. JUNIN



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100 %
COSTO PROYECTO	269.970,00 BS.-
CONTRATISTA	MANUFACTURAS METALICAS "VOLCAN"
SUPERVISOR	COMISION DE RECEPCION DE BIENES
TIEMPO DE EJECUCION	28 D/C

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE LA ADQUISICION	22/JULIO/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	18/AGOSTO/2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 100 %
MONTO CANCELADO	269.970,00 Bs.-
MONTO POR PAGAR	0.00 Bs.-

Observaciones.-



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO COLEGIO 1° DE MAYO "B"



IMAGEN ANTERIOR

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	INSTITUCIONAL
COSTO PROYECTO	49.977,00 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA MANO DE OBRA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaño
TIEMPO DE EJECUCION	45 D/C

Observaciones.- No existió apoyo por parte de los beneficiarios



IMAGEN ACTUAL

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO 200 KVA PLANTA DE GAS VIRTUAL



IMAGEN ANTERIOR

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	FUNCIONAMIENTO DIRECCION DE LUZ Y FUERZA
COSTO PROYECTO	37.687,00 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaño
TIEMPO DE EJECUCION	120 D/C

Observaciones.- No existe línea de media tensión de propiedad del municipio de Llallagua por la que se recurrió a solicitar anexas a la línea de cobre de propiedad de ENDE DE ORURO.



IMAGEN ACTUAL

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO COLEGIO TECNICO HUMANISTICO LLALLAGUA

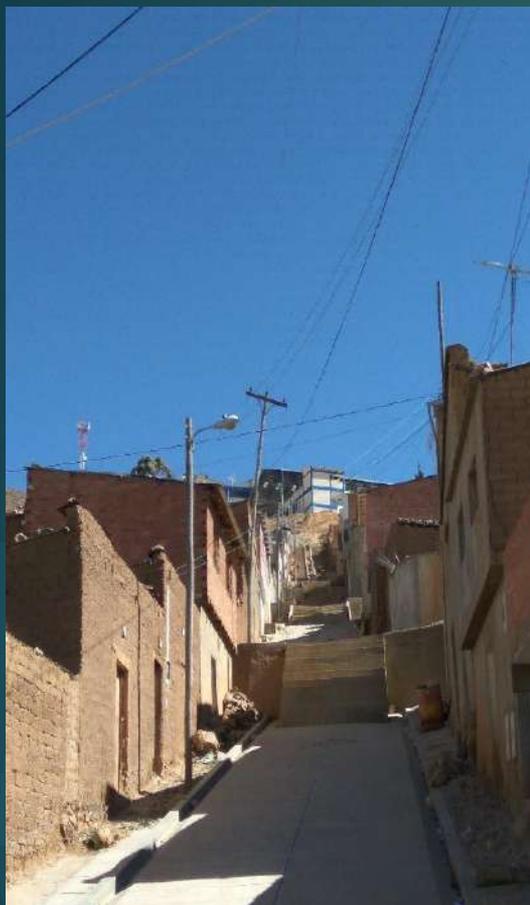


IMAGEN ANTERIOR

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	INSTITUCIONAL
COSTO PROYECTO	49.976,50 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA MANO DE OBRA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaña
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

Observaciones.- Se monto un Transformador trifásico de 50 KVA mas el tendido de línea de Media y Baja Tensión para la distribución de energía eléctrica en este colegio



IMAGEN ACTUAL



ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO TENDIDO DE LINEA DE MEDIA TENSION ZONA 1 Y 4



IMAGEN ANTERIOR

DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
COSTO PROYECTO	43.183,95 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA MANO DE OBRA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaño
TIEMPO DE EJECUCION	45 D/C

Observaciones.- No existió apoyo de los beneficiarios a pesar del trabajo de envergadura para eliminar los conductores de media tensión que pasaba de la calle 1° de mayo a la General Saenz.



IMAGEN ACTUAL



ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO TENDIDO DE LINEA DE MEDIA TENSION ZONA 6



IMAGEN ANTERIOR

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	DIRECCION DE LUZ Y FUERZA LLALLAGUA
COSTO PROYECTO	48.065,02 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA MANO DE OBRA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaño
TIEMPO DE EJECUCION	45 D/C

- **Observaciones.**- Mucha incomprensión de los vecinos del sector que no comprendieron de la magnitud del trabajo efectuado para eliminar los riesgos que estaban con la línea de media tensión que pasaba por en cima de sus casas los mismos que obstaculizaron dentro el tiempo de ejecución de este tramo.



IMAGEN ACTUAL

MEJORAMIENTO RED BAJA TENSION ZONA 9



IMAGEN ANTERIOR

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD NN/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	INSTITUCIONAL
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	REFORMULACION POA 2017
COSTO PROYECTO	49.945,45 Bs.
CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA MANO DE OBRA
SUPERVISOR	Ing. Jhonny Osnayo Montaña
TIEMPO DE EJECUCION	45 D/C



- **Observaciones.-** Mucha incomprensión de los vecinos del sector que no comprendieron de la magnitud del trabajo mejoraría la tensión de suministro eléctrico en esta zona.



IMAGEN ACTUAL

ADQUISICION DE NUTRIBEBES



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	500,000,00
MONTO EJECUTADO	499,989,60
CONTRATISTA	Sigma
Avance Financiero	100%



Observaciones.- Se adjudicaron 21.186 bolsas de NUTRIBEBES para los centros y puestos de salud del municipio el mismo ira en beneficio de los niños y niñas menores de 2 años.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONVENIO DE CENTRO REGULADOR DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS EQUIPOS PARA AL AMBULANCIA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	60,000,00
Centro regulador de emergencias y urgencias	60,000,00
Empresa	
Avance Financiero	100%

ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALUD PRIMER NIVEL

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD /2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	92,736
Mobiliario primer nivel	91,876,00
Empresa	COMERCIAL MONTREI
Avance Financiero	100%



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.-



ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE 2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 670.241,00
COSTO PROYECTO	Bs. 670.241,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2017

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 68,10 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 670.241,00

Observaciones.-



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE 2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 345.243,00
COSTO PROYECTO	Bs. 345.243,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2017



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 68,10 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 345.243,00

Observaciones.-



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ADQUISICION DE REACTIVOS HOSPITAL GENERAL MADRE OBRERA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE 2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 215.000,00
COSTO PROYECTO	Bs. 215.000,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2017



IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 68,10 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 215.000,00

Observaciones.-



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRIMER NIVEL



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE 2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	Bs. 499.523,00
COSTO PROYECTO	Bs. 499.523,00
SUPERVISOR	Dra. Paola Tapia Gutiérrez
TIEMPO DE EJECUCION	Gestión 2017

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	GESTION 2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	GESTION 2017
AVANCE FISICO	Porcentaje 68,10 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 499.523,00

Observaciones.-



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 1 KILO LECHE ENTERA EN POLVO

DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	1.050.000,00 Bs
COSTO PROYECTO	985.840,00 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA: PIL ANDINA S.A.
TIEMPO DE EJECUCION	15 D/C



IMÁGENES DE LA DEGUSTACIÓN

FECHA INICIO DE OBRA	24/07/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	27/07/2016
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	09/08/2017
AVANCE FISICO	0 %
MONTO CANCELADO	En Ejecución
MONTO POR PAGAR	985.840,00 Bs

Observaciones.- La empresa entrego el 90 % del producto, a través de una solicitud por los padres de familia y autoridades, entregara en su totalidad dentro los plazos estipulados en el Contrato Por Excepción a la comisión de recepción definitiva, para proceder a la distribución de las unidades educativas.

La cancelación se la realizara una ves echa la entrega definitiva, la forma de pago es contra entrega.



IMAGEN DE ENTREGA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LOS MODULOS UNIDOCENTE Y AULAS MULTIGRADO



IMAGEN DE INSPECCION



DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	245,119,00 Bs
COSTO PROYECTO	242,600,00 Bs
CONTRATISTA	Mario Miguel Montaña Robles
TIEMPO DE EJECUCION	15 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	12/05/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	242,600 Bs
MONTO POR PAGAR	0,00 Bs

Observaciones.- Se hizo la entrega de los equipos computacionales, a las unidades educativas que contemplan las Aulas Multigrado y los Módulos Unidocente, las Unidades Educativas Beneficiarias son: German Buchs, Libertada Sakamarca, 3 Potosí, Chayacari y Viluyo. Los mismos se encuentran registrados por la Unidad de Activos Fijos.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO EDUCATIVO BLOQUE DE AULAS CAPUNITA AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	49.965,00 Bs
CONTRATISTA	MANUFACTURAS METALICS "VOLCAN"
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	06/06/2017
FECHA DE CONFORMIDAD	06/07/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	49.965,00 Bs
MONTO POR PAGAR	0 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- Proyecto concluido y cerrado.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

PROYECTOS DE INVERSION (OBRAS)



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

REFACCION RETEN POLICIAL MERCADO CAMPESINO ZONA 4



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	45,000 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	43,707,73 Bs.
CONTRATISTA	EMP. CONSTRUCTORA G.V.P.
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.



FECHA ORDEN A PROCEDER	21/03/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	04/05/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	16/06/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 43,707,73
MONTO POR PAGAR	Bs.- 0,00

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE H°C° ZONA 9 LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	100,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	98,211,50 Bs.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA VENOZ
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	70 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA ORDEN A PROCEDER	15/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	19/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	17/10/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 98,211,50
MONTO POR PAGAR	Bs.- 0,00

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION CORDONES DE ACERA PARTE BAJA ZONA 7 LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	136,609,99 Bs.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA VILLAFAN
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	65 D/C



FECHA ORDEN A PROCEDER	15/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	19/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	18/08/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 136,609,99
MONTO POR PAGAR	Bs.- 0,00



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUELO CANCHA POLIFUNCIONAL ZONA 2



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	50,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	49,998,4 Bs.
CONTRATISTA	EMP. UNIP. ROLANDO CHAMBI Q
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA ORDEN A PROCEDER	29/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	28/06/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	12/08/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 49,998,40
MONTO POR PAGAR	Bs.- 0,00

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

AMPLIACION BAÑO HIGIENICO UNIDAD EDUCATIVA JAIME MENDOZA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	120,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	119,971,82 Bs.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLCAM
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	80 D/C

FECHA ORDEN A PROCEDER	10/07/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	08/09/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	23/10/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 119,971,80
MONTO POR PAGAR	Bs.- 0,00



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION CANCHA DE WALLY ZONA 3 LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	120,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	119,973,59 Bs.
CONTRATISTA	EMP. UNIP. HILARION PACARA
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	72 D/C

FECHA ORDEN A PROCEDER	07/08/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	27/10/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	11/12/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 119,973,59
MONTO POR PAGAR	DEV. GARANTIAS

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION MINI COLISEO CANCHA ZONA 4



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	71,696,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	59,066,69 Bs.
CONTRATISTA	EMP. UNIP. AMPROBOL
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	36 D/C



FECHA ORDEN A PROCEDER	28/08/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	04/10/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	18/12/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 48.962,31
MONTO POR PAGAR	Bs.- 10,104,38

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado.



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCION DE BAÑO HIGIENICO CEMENTERIO GENERAL LLALLAGUA



DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	95,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	94,991,99 Bs.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SOLCAM
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	67 D/C

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA ORDEN A PROCEDER	02/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	10/11/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	10/12/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 94,991,99
MONTO POR PAGAR	DEV. GARANTIAS

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado.



IMAGEN ACTUAL

G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017



CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE ARCE DISTRITO LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	950,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	818,298,06 Bs.
CONTRATISTA	CONSUL. CONSTRUC. CALVIMONTES A.C.
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	90 D/C

FECHA ORDEN A PROCEDER	23/10/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	21/01/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	55 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 308,298,86
MONTO POR PAGAR	Bs.- 509,999,20

Observaciones.- El Proyecto se encuentra en ejecución.



CONSTRUCCION DE BAÑO HIGIENICO SECTOR POSITOS DIST. 22 DE DICIEMBRE



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	85,000,00 Bs.
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	84,393,01 Bs.
CONTRATISTA	EMP. CONST. CASTELO
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	70 D/C



FECHA ORDEN A PROCEDER	27/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	05/02/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	40 %
MONTO CANCELADO	Bs.- 39,381,93
MONTO POR PAGAR	Bs.- 45,011,08

Observaciones.- El proyecto se encuentra en ejecución.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN MODULO GAVIONES COLEGIO LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO G.A.M.LL. – MODALIDAD ANPE/2017	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	
COSTO PROYECTO	811,044,56 Bs.
CONTRATISTA	CARUSE CONST. Y CONSULT. S.R.L.
SUPERVISOR	ARQ. GONZALO FERNANDEZ V.
TIEMPO DE EJECUCION	70 D/C



IMAGEN ACTUAL

FECHA ORDEN A PROCEDER	05/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	13/02/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	30 %
MONTO CANCELADO	
MONTO POR PAGAR	Bs.- 811,044,56

Observaciones.- El proyecto se encuentra en ejecución.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

AMPLIACION TINGLADO, MURO Y GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO U.E. SIGLO XX AMERICA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO

COSTO DEL PROYECTO	848.058,40 Bs.
CONTRATSITA	GROVER COPA CALA
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	180 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	15/09/2016
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	24/04/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	07/06/2017
AVANCE FISICO	100%
MONTO CANCELADO	848.058,40 Bs.

Observaciones.- LA OBRA TUBO UN CONTRATO MODIFICATORIO n°1, PROYECTO CERRADO.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO PASAJE ODONTOLOGIA CAMP. 6"B" SIGLO XX



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	20/10/2016
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	09/12/2016
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	08/02/2017
AVANCE FISICO	100%
MONTO CANCELADO	130.394,93 Bs.

Observaciones.- PROYECTO CERRADO

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	130.394,93 Bs.
CONTRATSITA	EMPRESA CONSTRUCTORA "YATO"
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	60 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION SALA DE COMPUTACION U.E. BOLIVIA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	13/12/2016
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	16/01/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	16/03/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	28,325,13 Bs

Observaciones.- PROYECTO CONCLUIDO Y CERRADO

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	28,325,13 Bs
CONTRATSITA	HILARION PACARA JORGE
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	28 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

REFACCIÓN COCINA U.E. KINDER SIGLO XX



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	22,338,59 Bs
CONTRATSITA	LAUREANO SARZOSA RAMIREZ
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	20 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	16/12/2016
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	11/01/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	13/03/2017
AVANCE FISICO	100%
MONTO CANCELADO	22,338,59 Bs

Observaciones.- PROYECTO CONCLUIDO Y CERRADO



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCIÓN MERCADO SIGLO XX SEGUNDA FASE



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	09/01/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	21/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	29/08/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	1'202,679,42 Bs

Observaciones.- Se realizo contrato Modificatorio N°1 de ampliación monto y plazo, actualmente se encuentra cerrado.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	1'202,679,42 Bs
CONTRATSITA	Asociación Accidental NUEVO CIMENTO
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	211 D/C



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCIÓN BAÑO HIGIENICO U.E. KINDER SIGLO XX



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	93,255,77 Bs.
CONTRATSITA	IVAN SEVILLANO PACO
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	41 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	26/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	07/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	04/09/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	93,255,77 Bs.

Observaciones.- PROYECTO CERRADO Y CONCLUIDO



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL CAMPAMENTO SALVADORA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	16/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	21/08/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	19/10/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	145,791,91

Observaciones.- PROYECTO CONCLUIDO Y CERRADO

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	145,791,91
CONTRATSITA	LAUREANO SARZOSA RAMIREZ
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	60 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONCLUSIÓN PISO PARQUET U.E. SIGLO XX AMERICA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	49,899,59 Bs
CONTRATSITA	GROVER COPA CALA
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	16 D/C

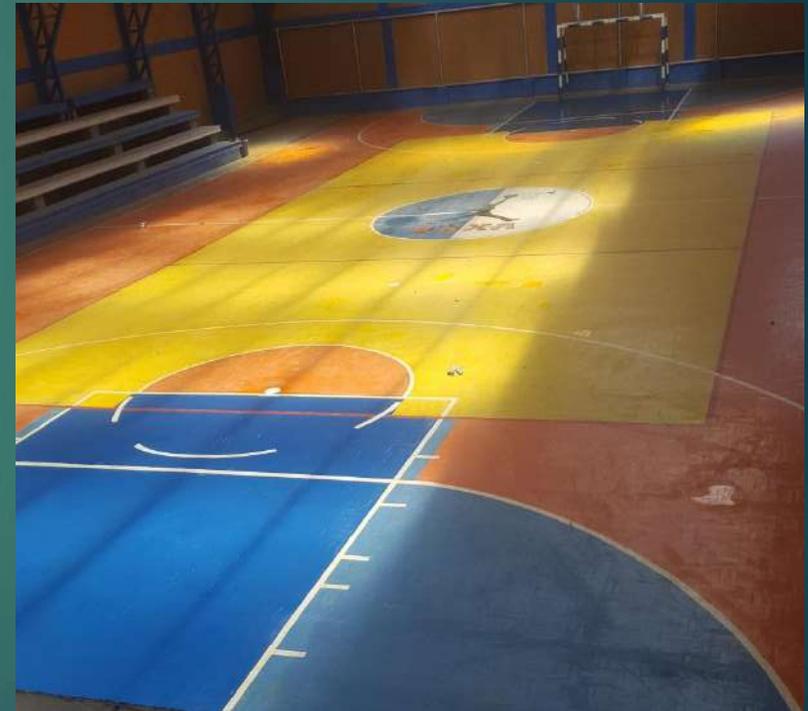


IMAGEN ACTUAL

FECHA INICIO DE OBRA	29/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	12/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	08/09/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	49,899,59 Bs

Observaciones.- PROYECTO CONCLUIDO Y CERRADO



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

REFACCIÓN PLAZUELA CAMPAMENTO 6"B" SIGLO XX



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	25/08/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	03/10/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	02/11/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	79.501,17Bs

Observaciones.-FALTA REALIZAR LA DEVOLUCION DE GARANTIAS.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	79.501,17Bs
CONTRATSITA	VIGEL-TEC
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

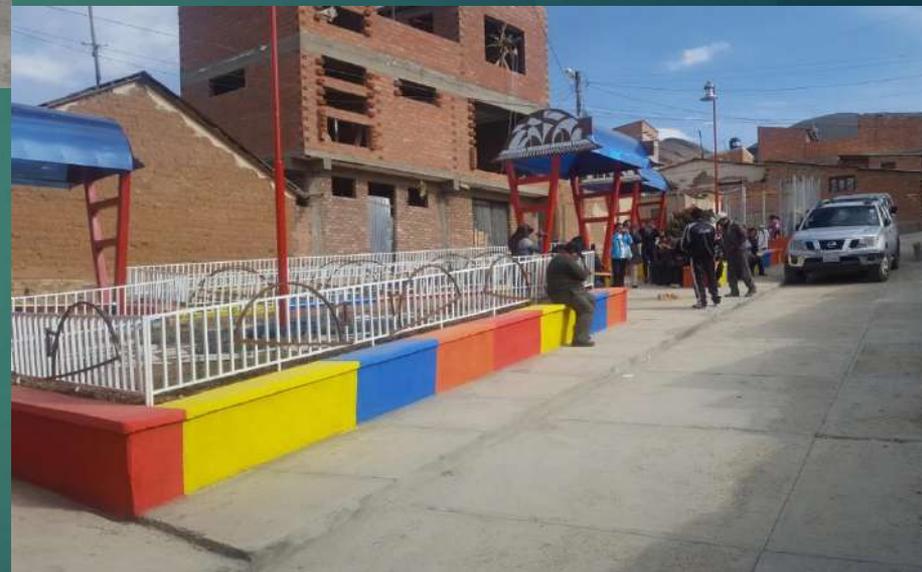


IMAGEN ACTUAL



REFACCIÓN FACHADA PRIMER BLOQUE U.E. SIGLO XX AMERICA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	31/07/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	20/09/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	19/10/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	49.921,68 Bs.

Observaciones.- PROYECTO CONCLUIDO Y CERRADO.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	49.921,68 Bs.
CONTRATSITA	Const. Luciano Mitma Choque
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	52 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION MERCADO DE SIGLO XX OBRA FINA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	14/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	49,62 %
MONTO CANCELADO	490.894,37 Bs

Observaciones.- PROYECTO EN EJECUCION CON BUEN AVANCE DE OBRA.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DEL PROYECTO	989.320,63 Bs.
CONTRATSITA	VIGEL-TEC
SUPERVISOR	Ing. Marco Antonio Cosso M.
TIEMPO DE EJECUCION	87 D/C



IMAGEN ACTUAL



REFACCIÓN ARBITRIOS MUNICIPALES CONSTRUCCION MURO DE REFUERZO DISTRITO CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

FECHA INICIO DE OBRA	10/03/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	03/04/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	02/05/2017
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	49.907,58 Bs

Observaciones.- PROYECTO CONCLUIDO Y CERRADO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	49.907,58 Bs
COSTO PROYECTO	49.907,58 Bs
CONTRATISTA	LUCIO LUQUE
SUPERVISOR	Arq. Aracely Quiroz L.
TIEMPO DE EJECUCION	25 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

REFACCIÓN BATERIA DE BAÑOS KINDER GERMAN BUSCH CATAVI

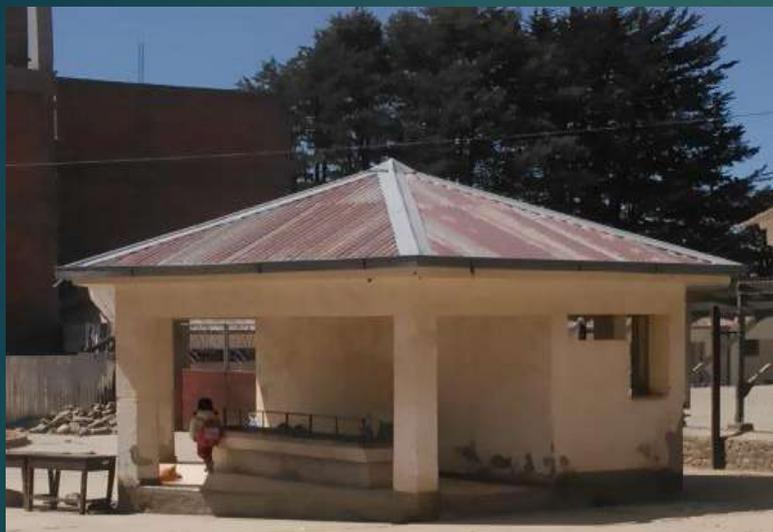


IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	110.263,79 Bs
COSTO PROYECTO	110.263,79 Bs
CONTRATISTA	SEIPRON S.R.L.
SUPERVISOR	Arq. Aracely Quiroz L.
TIEMPO DE EJECUCION	44 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	19/01/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	09/03/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	07/04/2017
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	110.263,79 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

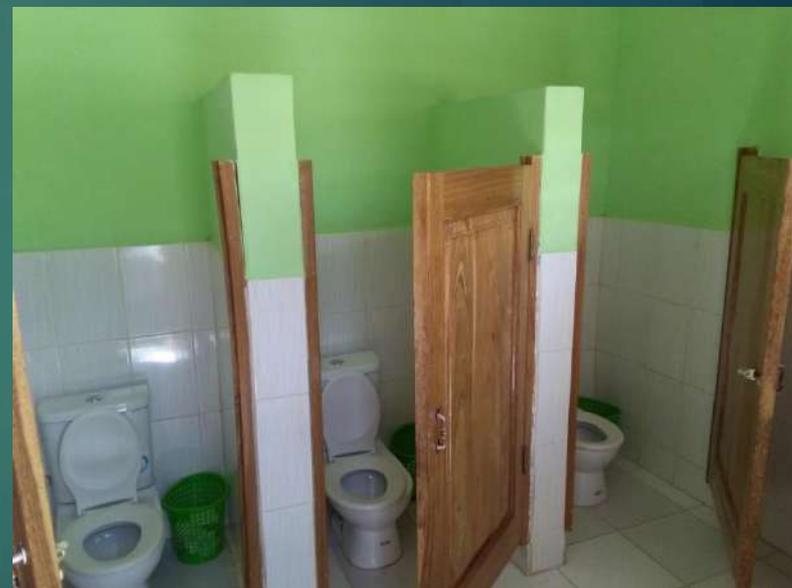


IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

SISTEMA DE ADUCCION DE AGUA FRIA BALNEARIOS CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

FECHA INICIO DE OBRA	14/12/2016
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	10/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	06/10/2017
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	646.689,10 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	646.689,10 Bs
COSTO PROYECTO	646.689,10 Bs
CONTRATISTA	CAD S.R.L..
SUPERVISOR	Arq. Roly Fernández
TIEMPO DE EJECUCION	201 D/C



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL SAN CRISTOBAL DISTRITO CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	199030.82 Bs
COSTO PROYECTO	199030.82 Bs
CONTRATISTA	ROLANDO CHAMBI
SUPERVISOR	Arq. Roly Fernández
TIEMPO DE EJECUCION	77 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	23/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	08/09/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	06/11/2017
AVANCE FISICO	100.00 %
MONTO CANCELADO	199030.82 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

REFACCIÓN CUBIERTA POLIGIMNACIO CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

FECHA INICIO DE OBRA	06/07/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	21/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	19/08/2017
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	49.925,77 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	49.925,77 Bs
COSTO PROYECTO	49.925,77 Bs
CONTRATISTA	SAN MIGUEL LEIVA
SUPERVISOR	Ing. Alberto Arroyo
TIEMPO DE EJECUCION	21 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

REFACCIÓN MURO PISCINA 1RO DE MAYO CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

FECHA INICIO DE OBRA	08/09/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	14/10/17
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	47934.52 Bs
COSTO PROYECTO	47934.52 Bs
CONTRATISTA	SAN MIGUEL LEIVA
SUPERVISOR	Arq. Roly Fernández
TIEMPO DE EJECUCION	36 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 16 DE NOVIEMBRE DISTRITO CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

FECHA INICIO DE OBRA	03/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	16/11/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	16/11/2017
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	19925.46 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	19925.46 Bs
COSTO PROYECTO	19925.46 Bs
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA YATO
SUPERVISOR	Arq. Roly Fernández
TIEMPO DE EJECUCION	14 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCIÓN DE DOS AMBIENTES CENTRO DE SALUD CATAVI



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	76065.46 Bs
COSTO PROYECTO	76065.46 Bs
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA YATO
SUPERVISOR	Arq. Roly Fernández
TIEMPO DE EJECUCION	59 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	29/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	30,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE VIVEROS LLALLAGUA Y MARCACUNCA



IMAGEN ANTES DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO BID. GEF; MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.	444.098,37 Bs
COSTO PROYECTO	444.098,37 Bs
CONTRATISTA	NORTICO FTA S.R.L.
SUPERVISOR	Ing. Jesús Paraguayo
TIEMPO DE EJECUCION	90 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	23/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	23/10/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	07/11/2017
AVANCE FISICO	100,00 %
MONTO CANCELADO	444.098,37 Bs

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO SAUTA (LLALLAGUA)



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	831,645.85 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
FPS Potosí	85 %
G.A.M. Llallagua	15 %
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ACHI
SUPERVISOR	Ing. Mario Lupe Copatiti
TIEMPO DE EJECUCION	180 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	06/03/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	02/09/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	23/10/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y CERRADO.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION OBRA DE TOMA DE AGUA SEGURA JANKO CALANI AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	24/10/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	23/11/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	07/12/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

DATOS DEL PROYECTO

COSTO PROYECTO	22.000,00 Bs
CONTRATISTA	Julián Yapura Charqui
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE WICHOCOLLO, CHIUTA, KUCHURI CABILDO CIRCUYO AYLLU CHULLPA



IMAGEN DURANTE TRABAJO DE CAMPO

FECHA INICIO DE CONSULTORIA	22/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	20/06/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	20/07/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA CONSULTORIA FUE CONCLUIDA Y CERRADA, EL PROYECTO FUE REMITIDO AL MMAYA PARA SU FINANCIAMIENTO.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DE CONSULTORIA	30.000,00 Bs
CONSULTORA	PERDAF SRL
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN “SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOJLLUMA AYLLU CHULLPA”



IMAGEN DURANTE TRABAJO DE CAMPO

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DE CONSULTORIA	37.500,00 Bs
CONSULTORA	PERDAF SRL
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

FECHA INICIO DE CONSULTORIA	01/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	15/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA CONSULTORIA FUE CONCLUIDA Y CERRADA, EL PROYECTO FUE REMITIDO AL MMAYA PARA SU FINANCIAMIENTO.



SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSIÓN “SISTEMA DE AGUA POTABLE JISKQNKI AYLLU CHULLPA”



DATOS DEL PROYECTO	
COSTO DE CONSULTORIA	37.500,00 Bs
CONSULTORA	SINCHIKALLPA
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

COMUNIDAD DE ESTUDIO

FECHA INICIO DE CONSULTORIA	29/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	60 %

Observaciones.- LA CONSULTORIA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN



ESQUEMA DEL ESTUDIO DE PROYECTO



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE HUAYLLOMA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	36,499.64 Bs
CONTRATISTA	Julián Ticona Mitma
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	05/12/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	40 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUINUAMAYU AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	29/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	08/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN TIEMPO PERENTORIO.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	37,459.31 Bs
CONTRATISTA	Hilarión Pacara Jorge
SUPERVISOR	Ing. Gadiel Sotomayor Ordoñez
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN DURANTE SU EJECUCION



CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	36,499.64 Bs
CONTRATISTA	Fabio Colquechuima Jachacollo
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	30/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	11/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y EN TIEMPO PERENTORIO.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCIÓN DE RIEGOS FAMILIARES JACHOJO, WAQUILMAYU, CHAPICOLLO Y ÑEQUEUTA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	793.162,93 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
MMAyA	70 %
G.A.M. Llallagua	30 %
CONTRATISTA	CAD SRL
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	127 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	30/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	31/03/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	28/06/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, SOLO FALTA PAGAR LA PLANILLA DE CIERRE.



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE MICRORIEGO JACHOJO, LLAPALLAPA, SAUCIÑA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	15/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	15/06/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	14/07/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA, TODA LA ADMINISTRACION DE LA OBRA FUE ELABORADO POR EL PROYECTO EVAs, EL APOORTE DEL GAM LLALLAGUA FUE CON MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRANSPORTE DE MATERIALES.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	298.382,17 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
MMAyA	249.922,72 Bs.
G.A.M. Llallagua	48.459,45 Bs.
CONSTRUCTORA	PERDAF SRL
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	31 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE MICRORIEGO SAUTA, VILUYO AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	26/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	23/06/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	21/07/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA, TODA LA ADMINISTRACION DE LA OBRA FUE ELABORADO POR EL PROYECTO EVAs, EL APOORTE DEL GAM LLALLAGUA FUE CON MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRANSPORTE DE MATERIALES.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	194.024,47 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
MMAyA	159.085,31 Bs.
G.A.M. Llallagua	34,939.16 Bs.
CONSTRUCTORA	MISS-VAR
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017
IMAGEN ACTUAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE MICRORIEGO WALQUERI AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	25/05/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	14/06/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	03/07/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA, TODA LA ADMINISTRACION DE LA OBRA FUE ELABORADO POR EL PROYECTO EVAs, EL APOORTE DEL GAM LLALLAGUA FUE CON MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRANSPORTE DE MATERIALES.

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	137.182,64 Bs
ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO	
MMAyA	113.365,38 Bs.
G.A.M. Llallagua	23,817.26 Bs.
CONSTRUCTORA	PERDAF SRL
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	20 D/C



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

AMPLIACION RIEGO FAMILIAR AKOPATA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	29/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	11/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	37,261.47 Bs
CONTRATISTA	Oscar Villca Muruchi
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	28 D/C



Observaciones.- La obra se encuentra concluida y en tiempo perentorio.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

IMAGEN ACTUAL

CONCLUSION CASA COMUNAL VICTATA FASE II AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	29/11/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	12/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	100 %

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	37,431.19 Bs
CONTRATISTA	Mario Lupe Copatiti
SUPERVISOR	Ing. Gadiel Sotomayor Ordoñez
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y EN TIEMPO PERENTORIO.



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION DE DOS AULAS U.E. SAUTA AYLLU CHULI PA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	14/02/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	05/05/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	03/08/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	178,645.57 Bs
CONTRATISTA	Juan carlos Yapura Toco
SUPERVISOR	Ing. David Perez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	80 D/C



IMAGEN ACTUAL



CONSTRUCCION COCINA COMEDOR HOSPEDAJE U.E. JISKANKY AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	78,027.27 Bs
CONTRATISTA	Julián Yapura Charqui
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	67 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	14/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	18/08/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	23/10/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCION BAÑOS HIGIENICOS U.E. BARTOLINA SISA AYLLU CHULLPA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	64,024.03 Bs
CONTRATISTA	Felipe Ticona Castro
SUPERVISOR	Ing. Gadiel Sotomayor Ordoñez
TIEMPO DE EJECUCION	57 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	26/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	21/08/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	23/10/2017
AVANCE FISICO	100 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA, EN ESTA OBRA SE HA DISMINUIDO DEL MONTO TOTAL Y SE TIEN UN SALDO DE 18,102,29 BS., LA CUAL SE REFORMULARA PARA MEJORAR EL PROYECTO YA QUE FALTA UN COMPONENTE PARA LA OBRA.



IMAGEN ACTUAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL MADRE OBRERA



DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	613,524.28 Bs
CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA CONSULTORA EMCODVI
SUPERVISOR	Ing. David Pérez Mamani
TIEMPO DE EJECUCION	132 D/C



FECHA INICIO DE OBRA	05/09/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FISICO	70 %

Observaciones.- LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CERRADA

IMAGEN EN EJECUCION



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

CONSTRUCCIÓN AULA UNIDAD EDUCATIVA UYUNI AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	22.560,49 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA CONTRATISTA "YAPURA"
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	28 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	15/02/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	20/03/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	20/03/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	22.560,49 Bs
MONTO POR PAGAR	0 Bs



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- proyecto concluido y cerrado



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

CONSTRUCCIÓN AULA UNIDAD EDUCATIVA JERICOPO AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	30/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	01/09/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	27/09/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	85.157,98 Bs
MONTO POR PAGAR	0 Bs

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	85.157,98 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL "YACIK"
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	68 D/C



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE PUESTO DE SALUD CAPUNITA AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	23.989,31 Bs
CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "LOPABA"
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	13/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	13/07/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	11/08/2017
AVANCE FISICO	100 %
MONTO CANCELADO	23.989,31 Bs
MONTO POR PAGAR	0 Bs

Observaciones.- Proyecto Concluido y Cerrado



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD UYUNI AYLLU SIKUYA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
COSTO PROYECTO	237,500,05Bs
CONTRATISTA	ROLANDO CHAMBI QUISPE
SUPERVISOR	Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCION	88 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	28/07/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	26/10/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	
AVANCE FÍSICO	100 %
MONTO CANCELADO	237,500,05Bs
MONTO POR PAGAR	0 Bs

Observaciones.- Falta Planilla de Devolución de garantía



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Semestral 2017

CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CAMAL MUNICIPAL DISTRITO 22 DE DICEMBRE



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	120,000 - 97,931,99 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	97,674,22BS.
CONTRATSITA	EMPRESA CONSTRUCTORA G.V.P.
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	37 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	16/06/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	26/06/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	01/08/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	POR DEFINIR
AVANCE FISICO	35 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs

Observaciones.- EL AVANCE FISICO NO SE LOGRO EN SU 50% POR QUE SE REALIZARA UN CONTRATO MODIFICATORIO POR EL INCREMENTO DE UN ITEM NUEVO Y VOLUMENES QUE SE INCREMENTARA.



IMAGEN ACTUAL

REFACCION CAMAL MUNICIPAL LLALLAGUA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	06/07/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	POR DEFINIR
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	POR DEFINIR
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	POR DEFINIR
AVANCE FISICO	0,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
MONTO CANCELADO	0,00 Bs

Observaciones.- EL,PERCANCE DE QUE NO SE TENGA PREVISTO EL ORDEN A PROCEDER ES POR QUE LOS MATARIFES SIGUEN DEJANDO ENTRAR ANIMALES AL CAMAL, Y CON EL INICIO SE PREVEE QUE SE TRASLADEN Y SE PUEDA TRABAJAR EN UN PAR DE DIAS.

DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	114,468,00 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	108,542,46 BS.
CONTRATSITA	EMPRESA CONSTRUCTORA G.V.P.
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	49 D/C



IMAGEN ACTUAL

CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA ZONA 6



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

FECHA INICIO DE OBRA	11/09/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	11/09/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	08/11/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	-----
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %
MONTO CANCELADO	100 Bs

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	150,000 - 135,795,66 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	0,00BS.
CONTRATSITA	delmit
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	60 D/C



IMAGEN ACTUAL

Observaciones.- para el segundo semestre se pudo apreciar que se culminaron con los trabajos de acabados y se procedió al cierre del proyecto

CONSTRUCCION AULA TIC U. E. MONSEÑOR CLETO LOAYZA



DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	120,172,20 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	119,548 BS.
CONTRATSITA	yapura
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	60 D/C



Observaciones.- en la actualidad el aula se encuentra culminado y listo para que se haga uso de ella en la gestión 2018

IMAGEN ACTUAL

CONCLUSION CONSTRUCCION SUB ALCALDIA 22 DE DICIEMBRE



DATOS DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	400,000 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	0,00 BS.
CONTRATSITA	SOLCAM
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	85 D/C



Observaciones.- PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE LA SUB ALCALDIA ESTA LISTA PARA SER ENTREGADA PROVISIONALMENTE Y PARA EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO 22 DE DICIEMBRE

IMAGEN ACTUAL

REFACCION CANCHA POLIFUNCIONAL ZONA 8 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	50,000 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	49,930,45 BS.
CONTRATSITA	ILARION PACARA GORGE
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	21 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	24/10/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	24/10/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	07/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	-----
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %
MONTO CANCELADO	100 Bs

Observaciones.- ESTE PROYECTO QUE SE ELABORO ANTERIORMENTE SE ENCUENTRA YA ENTREGADO DEFINITIVAMENTE Y LAS PERSONAS ESTAN CONTENTAS POR QUE PRESERVARAN LOS TERRENOS DEL CAMPO FERIAL



IMAGEN ACTUAL

CONSTRUCCION BATERIA DE BAÑOS U.E. MARTIN CARDENAS



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

DATOS DEL PROYECTO	
FINANCIAMIENTO G.A.M.LL.	50,000 Bs.
COSTO DEL PROYECTO	49,958,54 BS.
CONTRATSITA	YATO
SUPERVISOR	Arq. Jose Luis Siles Verduguez
TIEMPO DE EJECUCION	30 D/C

FECHA INICIO DE OBRA	26/10/2017
FECHA ORDEN A PROCEDER	26/10/2017
FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL	09/12/2017
FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA	-----
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %
MONTO CANCELADO	100 Bs

Observaciones.- ESTE PROYECTO FUE CON WORD VISION Y LA PARTE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA FUE SOLAMENTE LA PARTE GURESA DEL PROSYECTO, LA MISMA QUE YA FUE CONCLUIDA.



IMAGEN ACTUAL

LIMPIEZA DE CUNETAS PLUVIALES DE CAMINOS



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

Observaciones.- Limpieza de cunetas pluviales de caminos vecinales dentro del radio urbano, caminos a Catavi, Siglo XX, Av. Buenos Aires, Tupac Katari, Av. Norte Potosi y Av. 31 de Octubre, para evitar el deterioro del asfalto tanto como el pavimento rígido.

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRE
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	DOS MESES



IMAGEN ACTUAL

REFACCION HOSP. GRAL. MADRE OBRERA (SALA DE PREPARTO)



Observaciones.- Refacción total interior en la Sala de prepartos Hospital Madre Obrera, trabajo consistente en retiro de azulejos en deterioro y cambio con cerámica nueva.

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	22 DIAS HABILES



IMAGEN ACTUAL



G.A.M. LLALLAGUA

Informe Anual 2017

REFACCION MERCADO CAMPESINO



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

Observaciones.- Refacción del Mercado Campesino, trabajos consistentes en Ampliación de enlosetado, repintado de los puestos de venta refacción parcial de los muros de ladrillo de puestos de venta, construcción de cámaras como sumideros para aguas pluviales y otros.

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	ADMINISTRACION DIRECTA RECURSOS DE LA ZONA MATERIAL
SUPERVISOR	Sr. GERMAN QUISPE POMA
TIEMPO DE EJECUCION	TRES MESES



PROYECTOS DE GESTION



TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

CONST. ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS



POTOSI - BOLIVIA

Costo del Proyecto: 29.674.611,48 Bs

Tiempo de Ejecución 580 días

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

CONST. BLOQUE DE AULAS U.E. JUNIN CATAVI



Costo del Proyecto: 2.971.287,53 Bs
Tiempo de Ejecución 250 días

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

CONST. U.E. AYACUCHO CATAVI



Costo del Proyecto: 7.000.000 Bs

Tiempo de Ejecución 320 días

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

CONST. U.E. GOLF LLALLAGUA



Costo del Proyecto: 7.000.000 Bs

Tiempo de Ejecución 320 días

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

CONST. DE INVERNADEROS FAMILIARES PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN AYLLU CHULLPA

Costo del Proyecto: 3.151.346,52 Bs

POTOSI - BOLIVIA



MEJORAR LA PRODUCCION FRUTICOLA CON LA INTRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES AYLLU SIKUYA

Costo del Proyecto: 2.033.857,60 Bs

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

GRACIAS POR SU ATENCION

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO DE LLALLAGUA
