POTOSI - BOLIVIA

RENDICION PUBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2021

Adalid Jorge Aguilar

ALCALDE MUNICIPAL



El Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua institución pública con estructura fundamental de una sociedad es responsable y encargada de conocer la realidad de los sistemas de vida presentes en su territorio, donde desarrolla todas sus actividades delegadas por ley. Mejorando su economía, accediendo a servicios de calidad y comprometidos con el cuidado del medio ambiente, los cuales son resultados de la implementación de las Políticas de Desarrollo Municipal.

Planificación del G.A..M.LL. esta articulado con las metas, resultados y acciones del Plan de Desarrollo Economía Social – PDES-PTDI-PEI-POA







ESTRUCTURA ORGÁNICA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 2022 CONCEJO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL TRANSPARENCIA Y SECRETARIA LUCHA CONTRA LA GENERAL CORRUPCION DIRECCIÓN DE **AUDITORIA** DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL INTERNA FISCALIZACION DE PLANIFICACIÓN **OBRAS Y SERVICIOS** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA **HUMANO** ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN FINANCIERA UNIDAD DE NIDAD DE ELAB, EJEC UNIDAD DE UNIDAD DE CULTURA, ÚNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE ORD. SUPERVISIÓN DE MEDIO OBRAS BIBLIOTECA Y EDUCACION DEPORTES TERRITORIAL PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS CANAL MUNICIPA CATASTRO LINIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE JNIDAD DE UNIDAD DE INIDAD DE LINIDAD DE CONTRATACIO PRESUPUESTO RECAUDACIO SISTEMAS E GACETA RECURSOS ALMACENES NES VEHÍCILIOS V Y TESORERIA NES HUMANOS MENORES EQUIPO TONOMO MUNICIPAL **LLAGUA** SUB ALCALDÍA **SUB ALCALDÍA SUB ALCALDÍA** SUB ALCALDÍA SUB ALCALDÍA 22 **SUB ALCALDÍA SUB ALCALDÍA** CATAVI AYLLU CHULLPA **AYLLU SIKUYA** DE DICIEMBRE LLALLAGUA



LEY N° 974

LEY DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Conforme con esta nueva visión, el 4 de septiembre de 2017, se promulgó la Ley N° 974 con el fin de que la prevención y la lucha contra la corrupción se encuentren presentes hasta en el último rincón de institucionalidad de todos los niveles del Estado,

En las entidades donde el Estado tenga participación accionaria, y de esta manera fortalecer el rol de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

El Art. 37.- de la Ley de Participación y Control Social establece: (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS)

Presentar en la rendición pública de cuentas de la entidad La U.T.L.C.C. coordinará que todas las unidades del Gobierno Autónomo Municipal para que proporcionen la información de carácter económico-financiero, técnico y administrativo y los resultados de gestión, necesarios para la elaboración del La informe y realización de la rendición pública de cuentas.

De acuerdo a la Ley N° 482 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero del 2014 donde los Gobierno Autónomos Municipales están constituidos por:

Artículo 24. (Estructura organizativa) según la ley 482 el órgano ejecutivo estará conformado por:

La alcaldesa o el alcalde municipal.

Las Secretarías Municipales.

Sub Alcaldías.

Artículo 26. Parágrafo 20, Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto.



TRANSFORMAR LLALLAGUA:



Llallagua se está transformando y consolidado en una ciudad intermedia, de oportunidades con infraestructura urbana y rural de vanguardia, con mayores niveles de acceso a:

- a servicios básicos
 - **b** Mejorar la Educación





Mejorar la Salud



(d) Con avances cualitativos de desarrollo humano.

DE LLALLAGUA

Impulsar el desarrollo Integral, sustentable de transformación del municipio de Llallagua trabajando en la mejora de la educación, salud, servicios básicos, infraestructura, seguridad ciudadana y otros, tanto en el área urbana y el área rural del municipio.

ESTRATEGICOS:

- a
- Ejecutar El Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo
- b
- Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y Rural
- C

Priorizar la Transparencia como paradigma

POTOSI - BOLIVIA

RECURSOS PROGRAMADOS EN EL POA 2021



E

1.- ASIGNADOS 2021 M.E.F.P. Y REGALIAS

				Coddio N I
Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Coparticipación Tributaria	27.690.494	29.432.011	1.741.517
2	Recursos IDH	11.523.775	9.953.254	-1.570.521
3	Recursos Regalías Mineras	730.975	1.015.478	284.503
4	Por Subsidios Subvenciones Personas con discapacidad	43.853	43.853	0
	TOTAL	39.989.097	40.444.596	455.499

2.- RECURSOS PROPIOS 2021

Cuadro Nº 2

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Recursos Propios	8.000.000	7.545.730	-454.270
	TOTAL	8.000.000	7.545.730	-454.270

Fuente: Dirección Financiera





RECUPRS

POTOSI ~ BOLIVIA

3.- SALDOS 2020

Cuadro Nº 3

N o	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Saldos Caja Bancos 2020	23.033.560	23.033.560	0
	TOTAL 3	23.033.560	23.033.560	0

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro Nº 4

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Otras fuentes -UPRE- Ministerio de Medio Ambiente- FDI- FNDR	31.119.674	28.360.680	-2.758.994
	TOTAL 4	31.119.674	28.360.680	-2.758.994

Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION 2021

Cuadro Nº 5

Ν°	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO
1	Por Subsidios Subvenciones Personas con discapacidad	43.853	43.853
2	Coparticipación Tributaria	27.690.494	29.432.011
3	Recursos IDH	11.523.775	9.953.254
4	Recursos Regalías Mineras	730.975	1.015.478
5	Recursos Propios Municipales	8.000.000	7.545.730
6	Saldos Caja Bancos 2020	23.033.560	23.033.560
7	Otras fuentes -UPRE-Ministerio de Medio Ambiente- FDI- FNDR	31.119.674	28.360.680
8	Por Subsidios Subvenciones Personas con discapacidad	43.853	43.853
	TOTAL DE RECURSOS	102.142.331	99.384.566

TOTAL DE RECURSOS POA 2021

102.142.331,00 Bs.

Fuente: Dirección Financiera

PAL

CUADRO DE COMPARACION

Por Subsidios

SuvencionesPerson



PROGRAMADO



Saldos Caja Bancos 2020 23%

as con
discapacidad
0%
Coparticipación
Tributaria
27%

Recursos Regalias Mineras 1%

Recursos IDH 11%

Recursos Propios Municipales 8%



GASTO POR PARTIDA



a) Programas e Inversión

Cuadro Nº 6

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
1	PROM. Y FOMENTO A LA PROD AGROPECUARIA	4.276.534	3.226.285	1.050.249	75
2	SANEAMIENTO BASICO	1.166.994	805.091	361.903	69
3	CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS	290.000	290.000	-	100
4	DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	531.883	531.883	H	100
5	ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.024.468	1.024.468	_	100
6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	427.278	236.102	191.176	55
7	INFRAESTUCTURA URBANA Y RURAL	6.892.199	2.808.385	4.083.814	41
8	GESTION DE CAMINOS VECINALES	3.121.874	3.074.873	47.001	98
9	SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL	945.790	945.790	-	100
10	GESTION DE SALUD (2)	19.033.441	15.088.450	3.944.991	79

GOBII Fuente: Dirección Financiera CIPAL

DE LLALLAGUA



POTOSI ~ BOLIVIA

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO		SALDO	%
11	GESTION DE EDUCACION	27.516.243	26.169.297	1.346.946	95
12	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	12.780.773	9.611.714	3.169.059	75
13	PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO	224.556	224.556	-	100
14	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	90.150	90.150	-	100
15	PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	5.045.247	3.782.974	1.262.273	75
16	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)	419.446	419.446	-	100
17	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	328.411	328.411	-	100
18	GESTION DE RIESGOS	125.000	120.988	4.012	97
18	RECURSOS HIDRICOS	154.906	40.000	114.906	26
19	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	517.288	411.263	106.025	80
20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.406.489	4.048.375	1.358.114	75
21	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2.566.279	192.119	2.374.160	7
	TOTAL	92.885.249	73.470.619	19.414.629	79

Fuente: Dirección Financiera



POTOSI - BOLIVIA

b) gasto de funcionamiento del Concejo Municipal

Cuadro Nº 7

Nº	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	994.802	994.802	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	70.228	70.228	-
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.748	93.748	-
	SUB TOTAL	1.158.778	1.158.778	-





POTOSI - BOLIVIA

c) Gasto de funcionamiento del Ejecutivo Municipal

Cuadro Nº 8

Nº	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	6.898.446	6.898.446	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	300.883	300.883	-
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	776.237	776.237	-
4	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	2.394	2.394	-
5	OTROS GASTOS	120.342	120.342	-
	SUB TOTAL	8.098.303	8.098.302	-





AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA

Fuente: Dirección Financiero

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO



Cuadro Nº 9

NI.	DETAILE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	%
No	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO		% % 79 100
а	GASTOS DE INVERSION	92.885.249	73.470.619	19.414.629	79
b	GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.158.778	1.158.778	-	100
С	GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	8.098.303	8.098.302	-	100
	TOTAL	102.142.331	82.727.699	19.414.629	81



81%

BIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

DELLALLAGUA

uente: Dirección Financiera



POTOSI - BOLIVIA

EJECUCION FISICA (Procesos de contratación Nuevos)

Ν°	MODALIDAD	CUANTIA	TIPO DE CONTRATACION	CANTID.
			OBRAS	20
,	CONTRATACION	De Bs20.000 hasta Bs 50.000	ADQUISICIONES	26
•	MENOR	(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS	CONSULTORIAS	11
			SERVICIOS GENER.	
		Mayor a Bs 50.000(00/100	OBRAS	7
	APOYO NACIONAL	BOLIVIANOS) HASTA	ADQUISICIONES	51
2	A LA PRODUCCION Bs 1 000 000 UN MILLON	CONSULTORIAS	2	
Y EMPLEO (ANPE)	Y EMPLEO (ANPE)	00/100 BOLIVIANOS	SERVICIOS GENER.	3
		LICITACION PUBLICA (LP) Mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON UN 00/100	OBRAS	2
2	3		ADQUISICIONES	1
ა			CONSULTORIAS	
		BOLIVIANOS ADELANTE)	SERVICIOS GENER.	
			OBRAS	
4	CONTRATACION	CONTRATACION SIN LIMITE DE MONTO		4
4	POR EXCEPCION			
			SERVICIOS GENER.	1
			OBRAS	9
CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION SIN LIMITE DE MONTO	ADQUISICIONES	16	
	DIRECTA	SIIN LIMITE DE MONTO	CONSULTORIAS	
			SERVICIOS GENER.	
		TOTAL PROCESOS DE CONTRATA	CION	153


Fuente: SICOES - PAC 2021





POTOSI - BOLIVIA

EJECUCION FISICA VS FINANCIERA

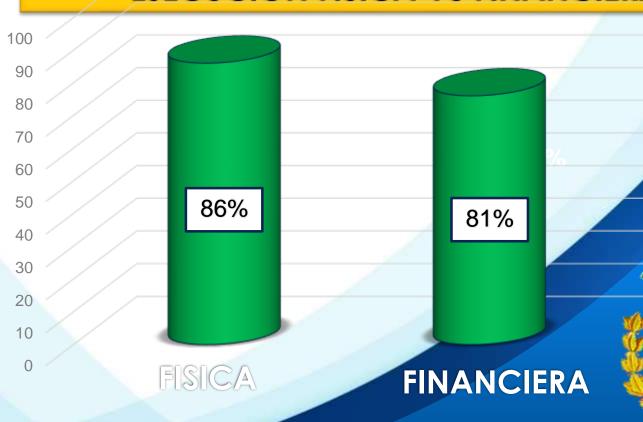

Desarrollo de proyectos, programas y actividades Gestión 2021



POTOSI - BOLIVIA

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA







Sense of the sense

Potosí - Bolivia

CONVENIO SENASAG



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
30.000,00	29.280,00	720	100%

Avance Financiero: 100%

•Observaciones: El presupuesto esta destinado al pago de sueldos y salarios, adquisición de equipos y otros.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Coordinación con el Encargado de SENASAG-Potosí para la capacitación en Sanidad Animal a los promotores de los Ayllus Chullpa y Sikuya.
- Registro de Ferias Ganaderas que se desarrollan en el municipio de Llallagua.
- Coordinación con el SENASAG Departamental Potosí, cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en cuanto a Registro y Certificación Zoosanitaria.
- Coordinación con el SENASAG
 Departamental Potosí, en el control e
 inspección de productos y subproductos
 pecuarios en los puestos de ventas
 establecidas en el Municipio de Llallagua
 que no cuenten con el debido registro
 sanitario.

Reportes epidemiológicos del municipio de Llallagua (gastroenteritis, parásitos externos, otitis, conjuntivitis, oestrus ovis, traumatismo y otros).



ALL SALE

Potosí - Bolivia

CONVENIO SEGURO AGRARIO UNIVERSAL





		With a second	14(8)
PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
206.765,00	206.765,00	0,00	100%

•Avance Financiero: 100%

•Observaciones: política destinadas a la protección de cultivos frente a desastres o eventos adversos..





ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE TIPO TUNEL PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO DE LLALLAGUA)





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
913.748,00 Bs	851.220,20 Bs	62.528,03 Bs	95%

•Empresa Contratista: PABLO TICONA JORGE.

Avance Físico: 100%Avance Financiero: 95%

Observaciones: CONCLUIDO FALTA CIERRE







MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA CON LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA"

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.760.000,00 Bs	900.443,62 Bs	859.556,38 Bs	40%

•Empresa Contratista: KADEMCORP BOLIVIA Y ASOCIADOS.

> •Avance Físico: 40% •Avance Financiero: 40% •Observaciones: EN EJECUCION





MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA CON LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA (SUPERVISION TECNICA)²²

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





	IMAGEN ACTUAL			L
PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%	
88.000,00	48.523,20	39,476,80	51%	

•Empresa Contratista: JESUS PARAGUAYO CH...

Avance Físico: 51%

Avance Financiero: 48%

•Fecha de Entrega Definitiva: SE RESCINDIO EL CONTRATO

AL





FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%

260.332,40 Bs. 256.729,00 Bs. 3.603,60 Bs 98%

•Empresa Contratista: COBOAGRO.

Avance Físico: 100%Avance Financiero: 98%

Observaciones: CONCLUIDO FALTA CIERRE





POTOSI - BOLIVIA

SAREAMIERTO BASICO








CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO ZONA 6 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)

MAGEN ANTES DE SU EJECUCION

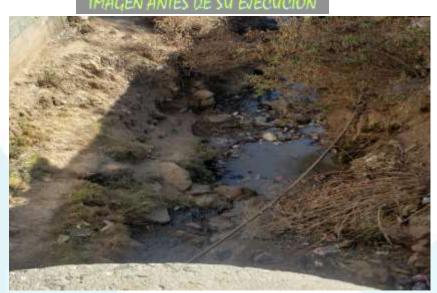



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
47.864,00 Bs	33.258,50 Bs	14.605,50 Bs.	69%

•Empresa Contratista: DIRECTA (SUB ALCALDIA

VILLA 22 DE DIC).

Avance Físico: 100% •Avance Financiero: 0%

Observaciones: EN EJECUCIÓN







MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PIACALA AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





			0.17
PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%

29.957,81 Bs. 29.957,81 Bs 0 Bs 100%

•Empresa Contratista: DELMIT.

•Avance Físico: 100%•Avance Financiero: 100%

•Observaciones: CONCLUIDO Y CERRADO







ADQUISICION DE TUBERIAS HDPE + ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE JACHOJO

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
32.353,00 Bs.	32.353,00 Bs.	O Bs	100%

•Empresa Contratista: PLASTIFORTE S.R.L.

•Avance Físico: 100%•Avance Financiero: 100%

•Observaciones: CONCLUIDO Y CERRADO

ANDIEDNO AUTONOMO A





MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE KATIRI AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
26.927,14 Bs	26.927,14 Bs	O Bs	100%

•Empresa Contratista: PLASTIFORTE S.R.L.

•Avance Físico: 100%

•Avance Financiero: 100%

Observaciones: CONCLUIDO Y CERRADO







CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHILLIGUANI AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
35.998,36 Bs.	35.998,36 Bs.	O Bs	100%

•Empresa Contratista: CONSTRUCTORA CASTELO.

•Avance Físico: 100%

•Avance Financiero: 100%

Observaciones: CONCLUIDO Y CERRADO





POTOSI - BOLIVIA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS









AMPLIACIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO EN EL CABILDO QOLLANA AYLLU SIKUYA (CONVENIO FPS)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.708.768,38 Bs	0	1.708.768,38 Bs	0%

•Empresa Contratista: ATRALID.

•Avance Físico: 76%•Avance Financiero: 0%

Observaciones: En Ejecución







AMPLIACIÓN SISTEMA DE RIEGO PURCILAMAYU AYLLU SIKUYA (CONVENIO FPS)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2.058.517,38 Bs	0	2.058.517,38 Bs	0%

•Empresa Contratista: SERVIC S.R.L..

•Avance Físico: 94%•Avance Financiero: 0%•Observaciones: En Ejecución





E.T.D.P. "MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MEDIA DEL RIO VERDE"

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
167.000,00 Bs	0	167.000,00 Bs	0%

•Empresa Contratista: CONSTRUMAG S.R.L.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 0%
•Observaciones: CONCLUIDO





MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA ESCALERANI AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
5.669.840,2 Bs.	O Bs	O Bs	0%

•Observaciones: EN PROCESO DE EJECUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE









MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
531.883,00 Bs.	531.883,00 Bs.	O Bs	100%

Observaciones: Se realiza trabajos de mantenimiento de los parques, con la finalidad de mantener atractivo los jardines, de los diferentes distritos.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESIDUOS SOLIDOS









FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.024.468,00 Bs.	1.024.468,00 Bs.	O Bs	100%

Observaciones: Se realiza trabajos de limpieza, recolección, transporte y aprovechamiento de los desechos solidos que se recolectan en el municipio.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO







ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DISTRITO CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





	IMAGEN ACI	UAL	-A-
	SVA		100000
O A	LDO		0/

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
103.200,00 Bs.	95.976,00 Bs.	7.224,00	93%

•Empresa Contratista: CONST. CASTELO

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 93%

Observaciones: CONCLUIDO FALTA CIERRE







ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA BARRIO LINDO DISTRITO CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





	SAME.	
	M. SEEL MAIN	
HIAROCKI	AZITI I A I	
IMAGEN	ACIVAL	
	AND RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	ı
3000		ı

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
16.830,00 Bs.	0,00	16.830,00 Bs.	0%

•Empresa Contratista: CONST. CASTELO

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 0%

•Observaciones: EN EJECUCIÓN (INSTALACIÓN)

VP135





ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DISTRITO SAKAMARCA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

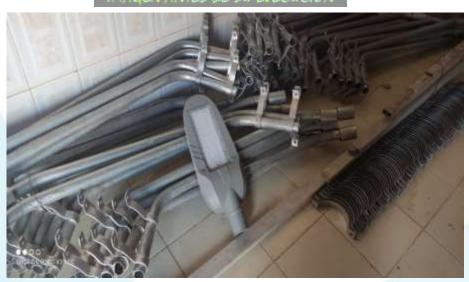




IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
50.000,00 Bs.	O Bs.	50.000,00 Bs.	100%

•Empresa Contratista: DANNY ALBA LOZADA.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 0%

•Observaciones: CONCLUIDO, FALTA EL PAGO AL

PROVEEDOR







ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA 8 DIST. V. 22 DE DICIEMBRE.

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION







PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
6.150,00 Bs.	6.140,00 Bs.	10,00 Bs.	100%

•Empresa Contratista: MARCO A. BALDIVIEZO.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 0%
•Observaciones: CONCLUIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

INFRAESTRUCTU URBANA Y RURA









CONSTRUCCIÓN DE COCINAS SEDE SOCIAL ZONA 12 DE FEBRERO Y ZONA TIPO CHALET DISTRITO CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
51.612,98 Bs.	48.000,07 Bs.	3.612,91	93%

•Empresa Contratista: MARCO A. BALDIVIEZO T.

•Avance Físico: 100%•Avance Financiero: 93%

Observaciones: CONCLUIDO FALTA CIERRE

1011=





CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO AVENIDA DAVID CHOQUE ZONAS 4 Y 6

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
216.200,00 Bs.	0,00 Bs	216.200,00 Bs.	0%

•Empresa Contratista: CONSTRUCTORA PUCA.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 0%

Observaciones: CONCLUIDO FALTA CIERRE







CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO FINAL OMISTE ZONA 1

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

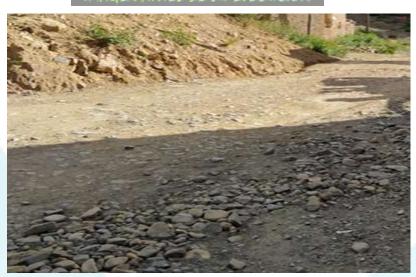




IMAGEN ACTUA

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00 Bs	250.000,00 Bs	0 Bs	100%

•Empresa Contratista: DANNY ALBA LOZADA

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





CONSTRUCCIÓN MINI MERCADO ZONA 2

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
639.949,00 Bs	130.434,48	509.514,52	75%

•Empresa Contratista: TRAVEJ S.R.L.

•Avance Físico: 75%•Avance Financiero: 25%

•Observaciones: EJECUCIÓN





CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA SAUTA SAKAMARCA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00 Bs.	19,640,00 Bs.	370,00	100%

•Empresa Contratista: CONSTRUCTORA CASTELO.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO







ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA SAKAMARCA







PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00 Bs.	19,905,00 Bs.	95,00	100%

•Empresa Contratista: CONSTRUCTORA CASTELO.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO







CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA ZONA 4 WALQUERI SAKAMARCA







PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00 Bs.	19.898,13 Bs.	101,87	100%

•Empresa Contratista: CONSTRUCTORA MAJUNA.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO

10:3=





CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO PROLONGACIÓN CALLE 9 DE ABRIL ZONA 4

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

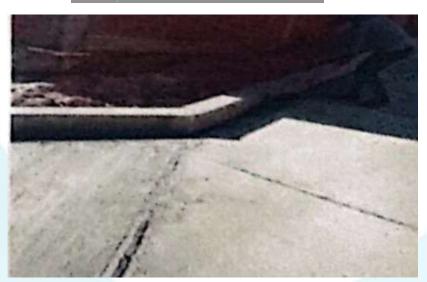




IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
200.320,19 Bs	0 Bs	200.320,19 Bs	0%

•Empresa Contratista: CONSTR. CADUCH

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 0%
•Observaciones: CONCLUIDO





CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL ZONA 7

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
245.543,05 Bs.	245.543,05 Bs.	0,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: CONSTR. PyC

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO FINAL CALLE OBLITAS ZONA 9

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
99. 895,20 Bs	99.895,20 Bs	00,000 Bs	100%

•Empresa Contratista: CONST. NEW ONE S.R.L.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARQUE INFANTIL CALLE TOPATER ZONA 9

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
149.805,31 Bs	149.805,31 Bs	0,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: JHONNY PACO CRUZ.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO CALLE Nº 5 ZONA RESIDENCIAL CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
198.953,58 Bs.	198.953,58 Bs.	0,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: JHONNY PACO CRUZ.

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO







CONSTRUCCIÓN TINGLADO PISCINA 1ro. DE MAYO

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





1	M	AG	EA	IA	CT	UA	E	
			- 0			_		

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.259.997,84 Bs	1.259.997,84 Bs	0,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: CONSTR. COPCOCI

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SELECTIVE PROPERTY SAND

POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES









CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RIO VENTILLA AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





				_					
P	\Box	\frown		\Box	Λ	10	\mathbf{A}		
12	ĸ	L)	(5	ĸ	Δ	MAL			
	$\mathbf{L} \mathbf{A}$	U	U			\mathbf{L}		$lue{}$	

EJECUTADO

SALDO

%

1.780.137,35 Bs.-

1.780.137,35 Bs.-

0,00 Bs.-

100%

•Empresa Contratista: CONSTR. RAM-CI

•Avance Físico: 100%

•Avance Financiero: 100%

•Observaciones: CONCLUIDO








ADQUISICIÓN DE LOSETAS PLAZA SAUTA AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

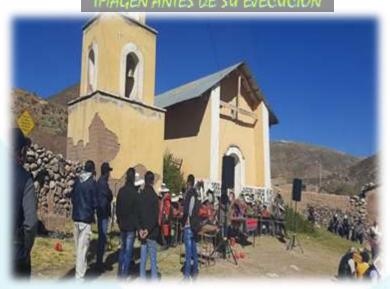



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
117,838.00 Bs.	117,838.00 Bs.	0,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: FABIO COLQUECHUIMA

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





MANTENIMIENTO DE CALLES DISTRITO SAKAMARCA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION







PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
54,768.00 Bs.	39,745.99 Bs.	15.022,01 Bs	100%

•Empresa Contratista: DIRECTA (OBRAS PÚBLICAS)

•Avance Físico: 100%•Avance Financiero: 100%•Observaciones: CONCLUIDO







ADQUISICIÓN DE LOSETAS PARA EL ENLOSETADO DE CALLES DISTRITO SAKAMARCA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
130.000,00 Bs.	126.824,00 Bs.	3.170,60 Bs	100%

•Empresa Contratista: CONSTR. DELMIT

•Avance Físico: 100%•Avance Financiero: 100%

•Observaciones: CONCLUIDO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE SALUD









APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD







IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
5.729.154,41 Bs.	5.729.154,41 Bs.	0,00 Bs	100%

•Avance Financiero: 100%

•Presupuesto destinado a: Pago de Sueldos y Salarios Personal de Salud 1er y 2do nivel, adquisición de medicamentos y adquisición de repuestos para vehículos médicos.







APOYO AL FUNCIONAMIENTO UNI







IMAGEN DE SU EJECUCION

 PROGRAMADO
 EJECUTADO
 SALDO
 %

 103.250,00 Bs.
 91.560,00 Bs.
 11.690,00 Bs. 100%

 Avance Financiero: 100%
 Presupuesto destinado a: Pago de Sueldos y Salarios Personal Unidad de Nutrición, adquisición de equipamiento para la unidad.







GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE HABILITACION Y REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD







IPIAGEN DE SU EVECUCION

 PROGRAMADO
 EJECUTADO
 SALDO
 %

 148.691,00 Bs.
 110.768,90 Bs.
 37.922,10 Bs. 75%

•Avance Financiero: 75%

•Presupuesto destinado a: Pago de Sueldos y Salarios Personal Médico, adquisición de equipamiento para la unidad.







ADQUISICIÓN DE NUTRIBEBES





IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
913.117,00 Bs.	913.116,60 Bs.	0,40 Bs	100%

•Avance Financiero: 100%

•Presupuesto destinado a: Adquisición de alimento complementario para niños y niñas menores a 2 años.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO A PROGRAMAS DE SALUD







IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
306.006,00 Bs.	304.787,51 Bs.	1.218,49 Bs	99%

•Avance Financiero: 99%

•Presupuesto destinado a: la promoción, difusión, concientización de programas de salud que informen y beneficien a la población del municipio





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS







IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
78.936,00 Bs.	60.422,99 Bs.	18.513,01 Bs	77%

Avance Financiero: 77%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, adquisición de insumos y medicamentos destinados a la atención de mascotas, ferias y campañas de esterilización y vacunación.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO









IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.471.339,00 Bs.	2.350.967,60 Bs.	2.120.371,40 Bs	53%

•Avance Financiero: 53%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, adquisición de insumos y medicamentos, adquisición de complementos nutricionales (Carmelo y chispitas).





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19







IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
6.354.460,00 Bs.	5.434.827,70 Bs	919.631,89 Bs	86%

•Avance Financiero: 86%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal medico, adquisición de insumos, reactivos, equipos y medicamentos, campañas de vacunación y otras actividades.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE EDUCACIÓN







GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

SAME

Potosí - Bolivia

rovisión alimentación complementaria escolar Área concentrada Gestión 2021





ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley Nº 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 12.033,00 alumnos (nivel inicial, primaria y secundaria).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
6.147.042,00 Bs	5.594.375,24 Bs	552.662,76 Bs	95%

Avance Financiero: 95%

•Presupuesto destinado a: la adquisición de alimentación complementaria para 12,033 estudiantes de los centros educativos establecidos en el área urbana.

Gobierno Autónomo Municipal

De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

300

Potosí - Bolivia

Provisión alimentación complementaria escolar Área concentrada Gestión 2021











GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

300

Potosí - Bolivia

Provisión alimentación complementaria escolar Área dispersa Gestión 2021





ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley Nº 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 1.117,00 alumnos (nivel inicial, primaria y secundaria).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
331.736,00 Bs	276.112,03 Bs	55.623,97 Bs	86%

•Avance Financiero: 86%

•Presupuesto destinado a: la adquisición de alimentación complementaria para 18 centros educativos establecidos en el área dispersa.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

SOOK SOOK

Potosí - Bolivia

Provisión alimentación complementaria escolar Área dispersa Gestión 2021





Gobierno Autónomo Municipal

De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA





IMAGEN DE SU EJECUCION

 PROGRAMADO
 EJECUTADO
 SALDO
 %

 544.485,70 Bs. 544.485,70 Bs. 0,00. 100%

•Avance Financiero: 86%

•Empresa Ejecutora: Pablo Ticona Jorge.

•Tiempo de Ejecución: 158 días escolares

Observaciones: Concluido





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU SIKUYA





IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
300.000,00 Bs	297.945,45	2.054,55	100%

Avance Financiero: 100%

•Empresa Ejecutora: Marco Gaspar Cuyo.

•Tiempo de Ejecución: 165 días escolares

Observaciones: Concluido







CONSTRUCCIÓN BAÑOS ECOLÓGICOS UNIDAD EDUCATIVA UYUNI NIVEL SECUNDARIO AYLLU SIKUYA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION







PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
44.102,00 Bs	43.978,00 Bs	124,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: CONSTR. VILLMUR

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO

Abids.





CONSTRUCCIÓN BAÑO UNIDAD EDUCATIVA CAPUNITA NIVEL SECUNDARIO AYLLU SIKUYA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
49.954,46 Bs	49.954,46 Bs	0,00 Bs	100%

•Empresa Contratista: REYMUNDO COLQUE CHACA

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MEDINACELI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





 PROGRAMADO
 EJECUTADO
 SALDO
 %

 7'186.863,29 Bs. 6'224.040,60 Bs. 962.822,69 Bs. 91%

•Empresa Contratista: CONSTR. SOLCAM

•Avance Físico: 91%

•Avance Financiero: 88%

Observaciones: EN EJECUCIÓN







CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA LIBERTAD DISTRITO SAKAMARCA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2'837.356,79 Bs	2'837.356,79 Bs	0.00 Bs	100%

•Empresa Contratista: ASOC. ACC. SAENCO

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS CONSTRUCCIÓN LINEA DE MEDIA TENSIÓN U.E. FRANZ TAMAYO

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
36.019,09 Bs	36.019,09 Bs	0.00 Bs	100%

•Empresa Contratista: MULTIDISCIPLINARIA HITACHI


•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS CONSTRUCCIÓN LINEA DE MEDIA TENSIÓN U.E. CARLOS MEDINACEL

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

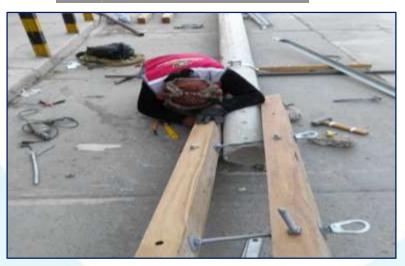



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
28.555,62 Bs	36.019,09 Bs	0.00 Bs	100%

•Empresa Contratista: MULTIDISCIPLINARIA HITACHI

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO





MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS CONSTRUCCIÓN LINEA DE MEDIA TENSIÓN U.E. LIBERTAD

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
38.500,00 Bs	38.500,00 Bs	0.00 Bs	100%

•Empresa Contratista: MULTIDISCIPLINARIA HITACHI

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO






ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR UNIDADES EDUCATIVAS (FRANZ TAMAYO)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



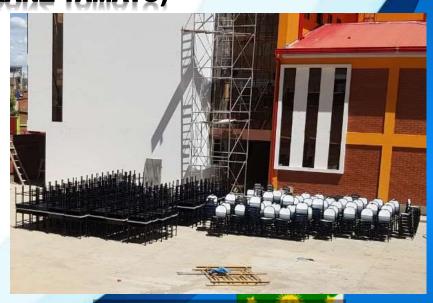

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
274.408,00 Bs	274.408,00 Bs	0.00 Bs	100%

•Empresa Contratista: MANUFACTURAS VOLCAN

•Avance Físico: 100%•Avance Financiero: 100%

•Observaciones: CONCLUIDO








ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCOLAR UNIDADES EDUCATIVAS (LIBERTAD, SIMON BOLIVAR, CLETO LOAYZA Y JUNIN)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



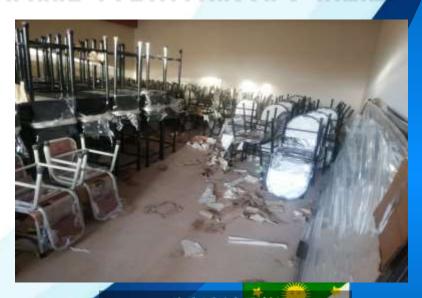

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
299.995,00 Bs	299.995,00 Bs	0.00 Bs	100%

•Empresa Contratista: MUEBLES ZAMBRANA

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 100%
•Observaciones: CONCLUIDO

Abids.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL









GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO AL DEPORTE



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
800.000,00 Bs	788.000,00	12.000,00	98%

- Gastos realizados en :
- Pintado de Campos Deportivos
- Mantenimiento de Campos deportivos en los 7 Distritos del Municipio de Llallagua.
- Incentivo deportivo a las Ligas Deportivas y Asociaciones Municipales de Llallagua, en los Niveles, Formativo, Recreativo y Competitivo y otros Gastos





CONSTRUCCIÓN ESTADIUM IRINEO PIMENTEL ROJAS MUNICIPIO DE LLALLAGUA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7'048.953,59 Bs	3'950.590,49 Bs	3'098.363,10 Bs	56%

•Empresa Contratista: CONSTR. ATRALID

•Avance Físico: 84%

•Avance Financiero: 56%•Observaciones: EJECUCIÓN







CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO TINGLADO U.E. JUNI DE CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





N/A	AN ISO
SALDO	%

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDU	70
34.062,44 Bs	31.678,06 Bs	2.384,37 Bs	93%

•Empresa Contratista: CONSTR. HOOSANA

•Avance Físico: 100%
•Avance Financiero: 93%
•Observaciones: EJECUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO







GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

Potosí - Bolivia



APOYO A LA CULTURA



Por una gestion transparente

(02)5822728 - (02)5820158
DIRECCION: Av. 10 de noviembre S/N
www.gamllallagua.gob.bo



 PROGRAMADO
 EJECUTADO
 SALDO
 %

 100.000,00
 100,000,00
 0,00
 100%

•Avance Financiero: 100%

•Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, promoción y difusión de actividades culturales en los 7 distritos.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO







GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

Seal Seal

Potosí - Bolivia









PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
90.150,00	90.150,00	0,00	100%

•Avance Financiero: 100%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, promoción, fortalecimiento y difusión de sitios turísticos en los 7 distritos.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

SE ON

Potosí - Bolivia

FUNCIONAMIENTO SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL







PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
258.469,34 Bs	237.532,10	20,937,24	91%

Avance Financiero: 100%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, promoción, fortalecimiento y difusión de políticas contra la violencia en los 7 distritos.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

SOOF OF THE PERSON OF THE PERS

Potosí - Bolivia

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
24.429,00 Bs	13.356,90	11,072,10	54,68%

•Avance Financiero: 100%

•Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, atención de casos de violencia en los que se involucre a personas adultas mayores.







CASOS ATENDIDOS EN OFICINAS DEL SLIM

				D	ETALL	E DE	ATENCI	ON DE CASOS	DE VIOI	ENCIA	GESTION	2021					
		1º TRII	MESTF	RE 2021	2º T	RIMES [®] 2021	TRE		3er	TRIME	STRE		4º TR	IMESTRE	≣ 2021		
TIPOLOGÍA				TOTAL				TOTAL			Щ	TOTAL		ш		TOTAL	TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	1º TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	OINO	2º TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3º TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4º TRIMESTR E	GESTIÓN 2021
		ш								٩	SEI		0	Š	亩		
Violencia en la Familia	3	3	5	11	7	5	3	15	3	3	4	10	4	1	1	6	42
Violencia Física							1	1				0		3	1	4	5
Violencia Psicológica	2	2		4						2	1	3	1	1	2	4	11
Violencia Patrimonial y Económica	18	29	17	64	8	14	10	32	13	12	15	40	13	7	7	27	163
Violencia contra la Dignidad ,el Honra y el Nombre	13	17	2	32	1	2	2	5	1	4	4	9	2	2		4	50
Violencia contra los Derechos y La Libertad Sexual.															1		0
Violencia Sexual														1	1	2	2
Violencia Institucional																	0
Violencia contra los Derechos Reproductivos.																	0
violencia Laboral																	0
Violencia en el ejerció político y liderazgo						1		1									1
Otro Tipo de Violencia (Abandono Familiar)						1	1	2	2	1	1	4					6
TOTAL	36	51	24	111	16	23	17	56	19	22	25	66	20	15	13	47	280
				CASOS				CASOS				CASOS				CASOS	casos



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

A COLUMN TO THE STATE OF THE ST

Llallagua - Potosí - Bolivia

FUNCIONAMIENTO UMADIS GAM LLALLAGUA



 PROGRAMADO
 EJECUTADO
 SALDO
 %

 40.000,00
 40.000,00
 0,00
 100%

Avance Financiero: 100%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, material de escritorio, atención de casos de personas con discapacidad, talleres y otros.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD



Llallagua - Potosí - Bolivia

CASOS ATENDIDOS DEN LAS OFICINAS DE UMADIS GAM LLALLAGUA

VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS.	15
CONSULTAS SOBRE RENOVACIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD	35
CONSULTAS SOBRE LA NUEVA AFILIACIÓN PARA OBTENER CARNET DE	25
DISCAPACIDAD	
CONSULTAS REFERENTE AL BONO DE DISCAPACIDAD	16
CONSULTAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	14
CONSULTAS SOBRE REPOSICIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD	4
CONSULTAS SOBRE LA LLEGADA DEL EQUIPO DE CALIFICACIÓN	9
DIFERENTES CONSULTAS ATENDIDOS	30
DENUNCIAS RELEVANTES ATENDIDOS	5
CARNETS DE DISCAPACIDAD ENTREGADOS EN LA OFICINA DE UMADIS	12
	CONSULTAS SOBRE RENOVACIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD CONSULTAS SOBRE LA NUEVA AFILIACIÓN PARA OBTENER CARNET DE DISCAPACIDAD CONSULTAS REFERENTE AL BONO DE DISCAPACIDAD CONSULTAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSULTAS SOBRE REPOSICIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD CONSULTAS SOBRE LA LLEGADA DEL EQUIPO DE CALIFICACIÓN DIFERENTES CONSULTAS ATENDIDOS DENUNCIAS RELEVANTES ATENDIDOS



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

OF REPROPERSIES SAND

POTOSI - BOLIVIA

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

TALL SALE

Potosí - Bolivia

DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
419.446,00 Bs	419.446,00 Bs	0,00 Bs	100%

•Avance Financiero: 100%

 Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, atención de casos de en los que se involucre a niños, niñas y adolecentes



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

OF REPROPERSIES SAND

POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE RIESGOS





300

Potosí - Bolivia

Gestión de Riesgos



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
125.000,00	120.988,11	4.011,89	75%

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de Equipos, Materiales y suministros

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de reportes sobre eventos climáticos.
- Levantamiento de información sobre la afectación de eventos climáticos en distintos sembradíos.
- Levantamiento de información sobre la familias criaderos de ganado camélidos
- Elaboración de perfiles de proyecto para adquisición de semillas, herramientas, materiales, etc.
- Socialización del Proyecto "mejoramiento de la producción frutícola con la introducción de especies frutales mejoradas".
- Seguimiento en la entrega de plantines a los distintos distritos.
- Seguimiento a la reforestación con plantines

DE LLALLAGUA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA







ALL SEP

Potosí - Bolivia

Gastos de Funcionamiento Seguridad Ciudadana





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
349.369,00 Bs	283.676,58 Bs	65.692,42 Bs	85%

•Avance Financiero: 85%

•Presupuesto destinado a: mantenimiento de equipos y vehículos policiales. Material de escritorio, aseo y limpieza.

Combustibles y lubricantes para las unidades moviles





TO VOICE OF THE PARTY OF THE PA

Potosí - Bolivia

Equipamiento y Mantenimiento de Equipos Policiales





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
127.586,00 Bs	127.586,00 Bs	0,00 Bs	100%

•Avance Financiero: 100%

 Presupuesto destinado a: adquisición de material de escritorio, combustibles, equipamientos, pago de servicios básicos, seguros para los motorizados de la Policia.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

MAGEN ZONA DE INTERVENCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

ALL SALE

Potosí - Bolivia

Funcionamiento Balnearios Catavi





PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
490.000,00	485.979,89	4,020,11	99%

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO

CALL WALL

Potosí - Bolivia

Funcionamiento Terminal de Buses Llallagua



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
675.020,00	675.020,00	0,00	100%

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales





SOOE STATE

Potosí - Bolivia

Fortalecimiento a la Promoción y Desarrollo Económica Local



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
108.626.00	108.626.00	0.00	100%

- Sueldo Asistente U.P.E.P. y Planificación.
- Promoción de actividades productivas.
- Ferias productivas en el municipio.



UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

AVANCE DE TRABAJO



NOMBRE DEL SUPERVISOR

Lic. Felicia Pérez Choque

FECHA DE INICIO

FECHA DE CONCLUCION

04/01/2021

31/07/2021

DETALLE DEL PATRIMONIO DE G.A.M.LL. EN EL SISTEMA VSIAF

Valor neto: 47 '847.383,54

NOMBRE	CANTIDAD	VIDA UTIL	COSTO HISTORICO	COSTO ACTUALIZADO INCIAL	DEPRESIACION GESTION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
EDIFICACIONES	7	40	39187830,74	39618464,93	990461,62	1802186,37	37816278,56
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	10363	10	5611267,29	5930624,34	504409,39	2047688,58	3882935,76
MAQUINARIA EN GENERAL	371	8	1506376,14	1617708,48	165173,01	782004,05	835704,43
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO DE COMUNICACIONES	645 174	8	5029709,77 489473,26	5223304,18 548573,80	311151,37 65094,49	1375391,95 378470,21	3847912,23 170103,59
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1501	8	912120,18	967933,11	115106,88	475599,58	492333,53
VEHICULOS AUTOMOTORES	138	5	23324728,87	27127125,72	292329,61	26474282,41	652843,31
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION	11	5	24050,00	25208,44	5041,65	18796,41	6412,03
MAQUINARIA AGRICOLA	5	4	188883,00	219963,12	0,00	219958,12	5,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	498	4	2023138,22	2189788,03	208584,73	1877891,87	311896,16
OTROS ACTIVOS FIJOS	2	0	5540,00	5540,00	0,00	0,00	5540,00

GRACIAS...

