

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA**

***RENDICION PUBLICA DE
CUENTAS FINAL
GESTION 2022***



Adalid Jorge Aguilar

ALCALDE MUNICIPAL



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA**

Z
O
N
A
D
E
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O
S

La Presente Rendición Pública de Cuentas Contiene toda la información sobre las políticas de desarrollo que el gobierno municipal ejecuto durante la gestión 2022, además de un resumen de los proyectos, programas y actividades realizadas durante la gestión 2022, concerniente a la Administración del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. En función de una planificación estratégica que nos permitió:

1

Formular el Plan Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 , con su respectiva programación presupuestaria.

2


Determinar los Recursos Municipales en función de Objetivos Institucionales y Objetivos de Gestión, con la finalidad de lograr el desarrollo de nuestro Municipio.



ESTRUCTURA ORGÁNICA


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 2022

ESTRUCTURA



ESTRUCTURA ORGÁNICA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 2022

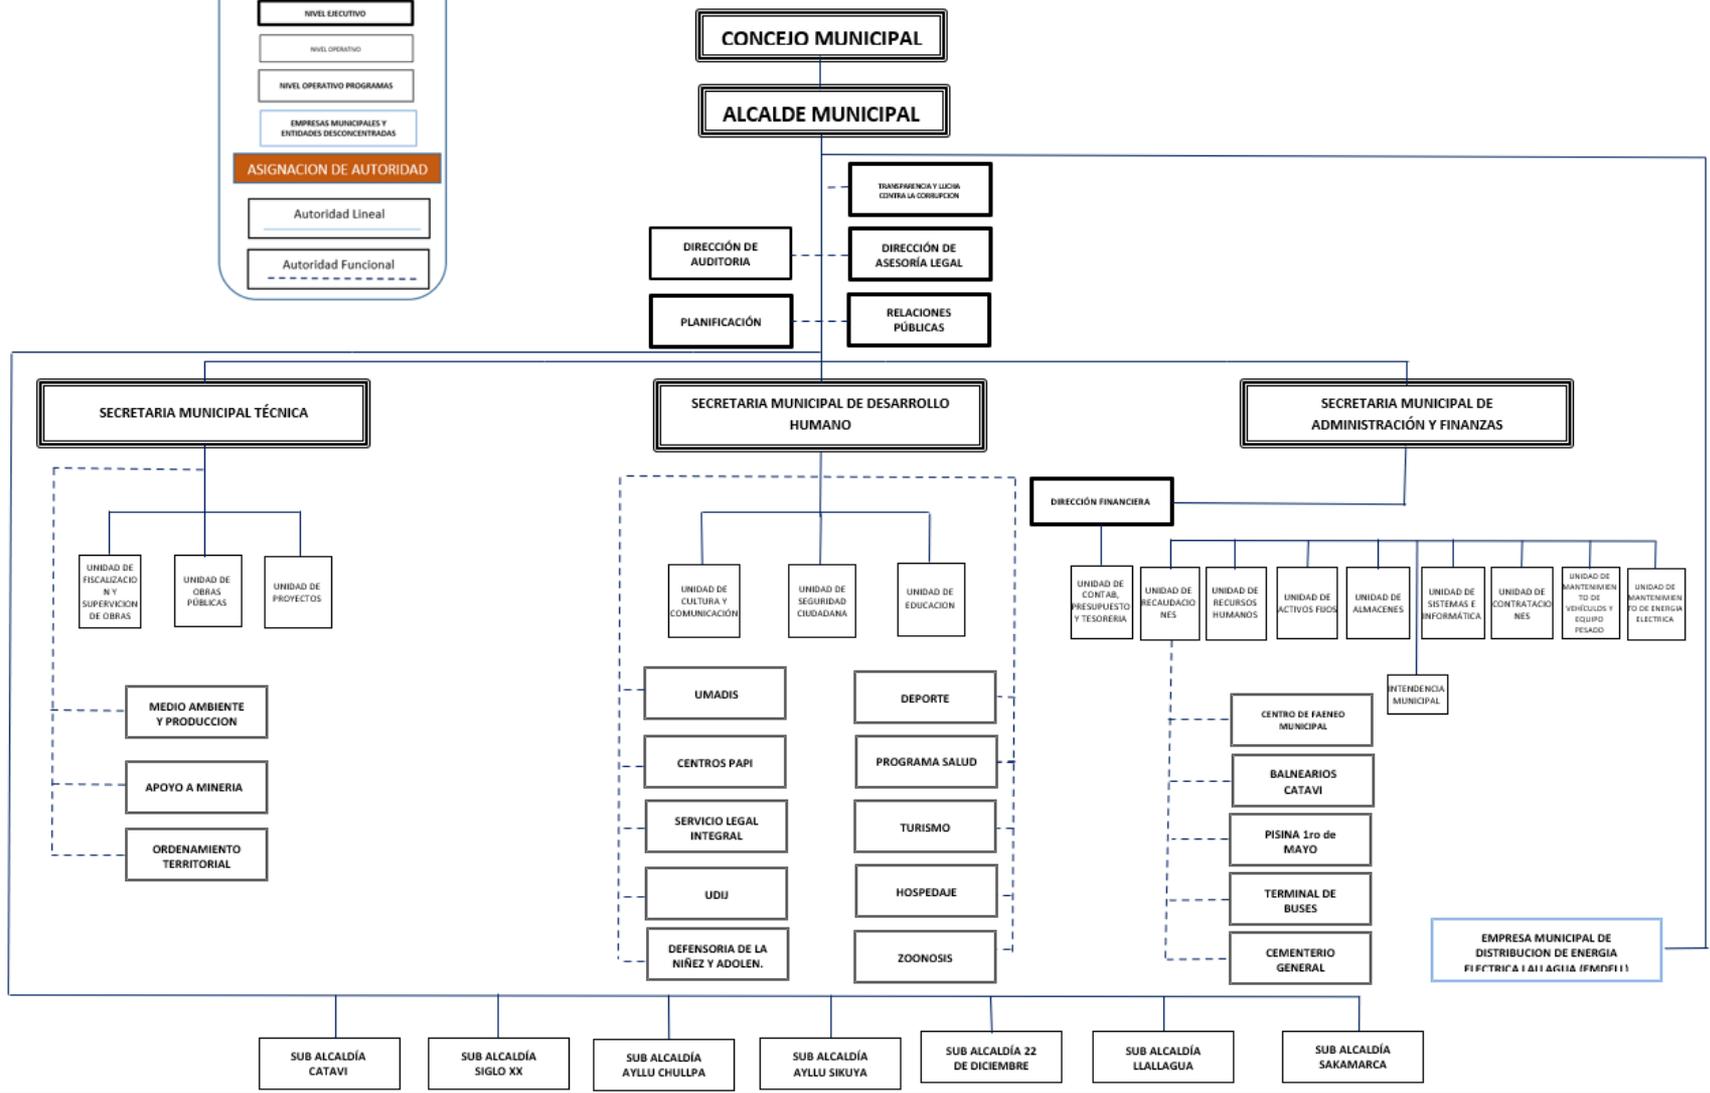

M

CPE

A

R

C

D


L

E

G

A

L



Artículo 235. (OBLIGACIONES)

Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

Numeral 4.

Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública.

Artículo 297 (COMPETENCIAS)

Parágrafo II.

Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.

LEY 031



Artículo 72. (CLÁUSULA RESIDUAL)

Las competencias no incluidas en el texto constitucional de acuerdo al Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado serán atribuidas al nivel central del Estado y éste definirá mediante Ley su asignación de acuerdo al Parágrafo I del mismo Artículo.

LEY 341



Artículo 37. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN).

Parágrafo I.

Los Órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades públicas del Estado Plurinacional, realizarán rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, ante la sociedad en general y ante los actores que ejercen Control Social en particular.



M
A
R
C
O

L
E
G
A
L

LEY 482

LEY 482 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

Artículo 6. (PRESUPUESTO MUNICIPAL).

I. El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo Municipal.

Artículo 24. (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA).

El Órgano Ejecutivo estará conformado por:

- a) La Alcaldesa o el Alcalde Municipal.
- b) Las Secretarías Municipales. (Sub Alcaldías y Empresas Publicas)

Artículo 26. (ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O EL ALCALDE MUNICIPAL)

Numeral 20.

Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos (2) veces al año.

LEY 004



Artículo 3.(FINALIDAD).

La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.

LEY 974



ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

La presente Ley tiene como ámbito de aplicación todas las entidades y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga participación accionaria.

V
I
S
I
O
N

Llallagua un modelo de Municipio con capacidad de gestión y condiciones para lograr el desarrollo SOCIAL, ECONOMICO, MEDIOAMBIENTAL e INSTITUCIONAL, como referente en el Norte de Potosí, y de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, con equidad de genero, con autonomía para definir el rumbo de su propio destino.



M
I
S
I
O
N

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en el área urbana y rural, con el objetivo conservar, fomentar y difundir los valores culturales y turísticos, en la búsqueda de un entorno saludable productivo y tecnológico a través del estímulo de la inversión y gestión de recursos y de esta manera proyectar a Llallagua como una ciudad de desarrollo y progresista dentro la región del Norte Potosí.



GENERAL:

Impulsar el desarrollo integral, sustentable de transformación del Municipio de Llalagua Trabajando en la mejora de la **EDUCACIÓN, SALUD, SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD CIUDADANA Y OTROS**, tanto en el área urbana y el área rural del Municipio.

ESTRATEGICOS:

a

Ejecutar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo.

b

Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura Urbana y Rural.

c

Priorizar la Transparencia como paradigma.



RECURSOS POA

2022



1.- ASIGNADOS 2022 M.E.F.P. Y REGALIAS

Cuadro N° 1

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Por subvenciones Personas con Discapacidad	44.373	44.373	0
2	Coparticipación Tributaria	32.060.365	33.450.057	1.389.692
3	Recursos IDH	11.101.843	13.109.430	2.007.587
4	Recursos Regalías Mineras	603.032	1.097.088	494.056
	TOTAL	43.809.613	47.700.948	3.891.335

2.- RECURSOS PROPIOS

Cuadro N° 2

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
5	Recursos Propios Municipales	8.000.000	8.313.419	313.419
	TOTAL	8.000.000	8.313.419	313.419



Fuente: Dirección Financiera

R
E
F
E
R
E
N
C
I
A
S

3.- SALDOS CAJA BANCOS 2021

Cuadro N° 3

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Saldos Caja/Bancos 2021	17.698.146	17.698.146	0
	TOTAL 2	17.698.146	17.698.146	0

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro N° 4

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Otras fuentes – UPRE – Ministerio de Medio Ambiente – FDI – FNDR – MMAyA	14.594.448	10.398.152	-4.196.296
	TOTAL 2	14.594.448	10.398.152	-4.196.296



Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION 2022

Cuadro N° 5

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO
1	Recursos Asignados 2022	43.809.613	47.700.948
3	Recursos propios	8.000.000	8.313.419
3	Saldos Caja Bancos 2021	17.698.146	17.698.146
4	Recursos de Contra Parte (Transferidos)	14.594.448	10.398.152
	TOTAL DE RECURSOS	84.102.207	84.110.664

TOTAL PROGRAMADO POA 2022

84.110.664,00 Bs

Fuente: Dirección Financiera

PROGRAMA ZONIFICACION

- 1 GASTOS RECURRENTE OBLIGATORIOS POR LEY
- 2 GASTOS RECURRENTE POR COMPETENCIAS MUNICIPAL
- 3 GASTOS PARA CONVENIOS
- 4 GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO
- 5 GASTOS PARA INVERSION (Disponible para Formular)



DESGLOSE DE GASTO POR PARTIDA

Cuadro N° 6

a) Programas e Inversión

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
1	PROM. Y FOMENTO A LA PROD. AGROPECUARIA	3.918.118	3.860.249	57.869	99
2	SANEAMIENTO BASICO	300.329	264.073	36.256	88
3	CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS	333.357	302.680	30.677	91
4	DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	750.000	672.809	77.191	90
5	ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.146.830	1.146.830	0.000	100
6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	162.675	101.820	60.855	63
7	INFRAESTUCTURA URBANA Y RURAL	5.785.464	3.696.508	2.088.956	64
8	GESTION DE CAMINOS VECINALES	1.347.556	1.290.556	57.000	96
9	SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL	714.732	714.732	0.00	100
10	GESTION DE SALUD (2)	18.714.229	13.207.261	5.506.968	71
11	GESTION DE EDUCACION	13.221.770	7.114.541	6.107.229	54

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

E
J
F
C
C
O
Z

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
12	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	6.562.923	6.353.232	209.691	97
13	PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO	196.667	196.667	-	100
14	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	100.000	68.475	31.525	68
15	PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	5.683.638	4.844.706	838.932	85
16	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)	415.843	415.843	-	100
17	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	327.673	327.673	-	100
18	GESTION DE RIESGOS	396.572	337.654	58.918	85
18	RECURSOS HIDRICOS	3.125.317	2.310.603	814.714	74
19	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	393.905	169.899	224.006	43
20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5.105.775	3.889.062	1.216.713	76
21	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4.957.758	1.574.521	3.383.237	32
TOTAL		73.661.131	52.860.395	20.800.735	72



72 %




Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua

Fuente: Dirección Financiera

B) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MPAL.

Cuadro N° 7

Nº	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	1.125.576	1.125.576	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	91.723	91.723	-
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.575	86.575	-
	SUB TOTAL	1.303.874	1.303.874	-



100%

Fuente: Dirección Financiera

ZONCEUCCJFE

C) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuadro N° 8

Nº	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	7.463.777	7.463.777	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES	405.480	303.961	101.518
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	743.739	694.775	48.964
4	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	1.608	1.608	-
5	OTROS GASTOS	522.598	522.598	-
	SUB TOTAL	9.137.202	8.986.719	150.482



98%

Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO

Cuadro N° 9

No	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	%
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
a	GASTOS DE INVERSION	73.661.131	52.860.395	20.800.735	72
b	GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.303.874	1.303.874	-	100
c	GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	9.137.202	8.986.719	150.482	98
	TOTAL	84.045.598	63.150.988	20.951.217	75



75%

EJECUCION FISICA (PROCESOS DE CONTRATACIÓN)


Nº	MODALIDAD	CUANTIA	CONTRATACION	CANTID PROGRAMADA.	CANTID EJECUTADA.
1	CONTRATACION MENOR	De Bs20.000 hasta Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	0	0
			ADQUISICIONES	19	16
			CONSULTORIAS	20	20
			SERVICIOS GENER.	1	1
2	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)	Mayor a Bs 50.000.- (00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs.1.000,000 UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	7	4
			ADQUISICIONES	40	36
			CONSULTORIAS	0	0
			SERVICIOS GENER.	4	4
3	LICITACION PUBLICA (LP)	Mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON UN 00/100 BOLIVIANOS ADELANTE)	OBRAS	1	0
			ADQUISICIONES	1	1
			CONSULTORIAS	0	0
			SERVICIOS GENER.	1	0
4	CONTRATACION POR EXCEPCION	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	0	0
			ADQUISICIONES	13	13
			CONSULTORIAS	0	0
			SERVICIOS GENER.	1	1
5	CONTRATACION DIRECTA	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	62	42
			ADQUISICIONES	3	3
			CONSULTORIAS	0	0
			SERVICIOS GENER.	1	1
TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION				174	142

EJECUCION FISICA VS FINANCIERA



ZONAS

CUADRO DE COMPARACION

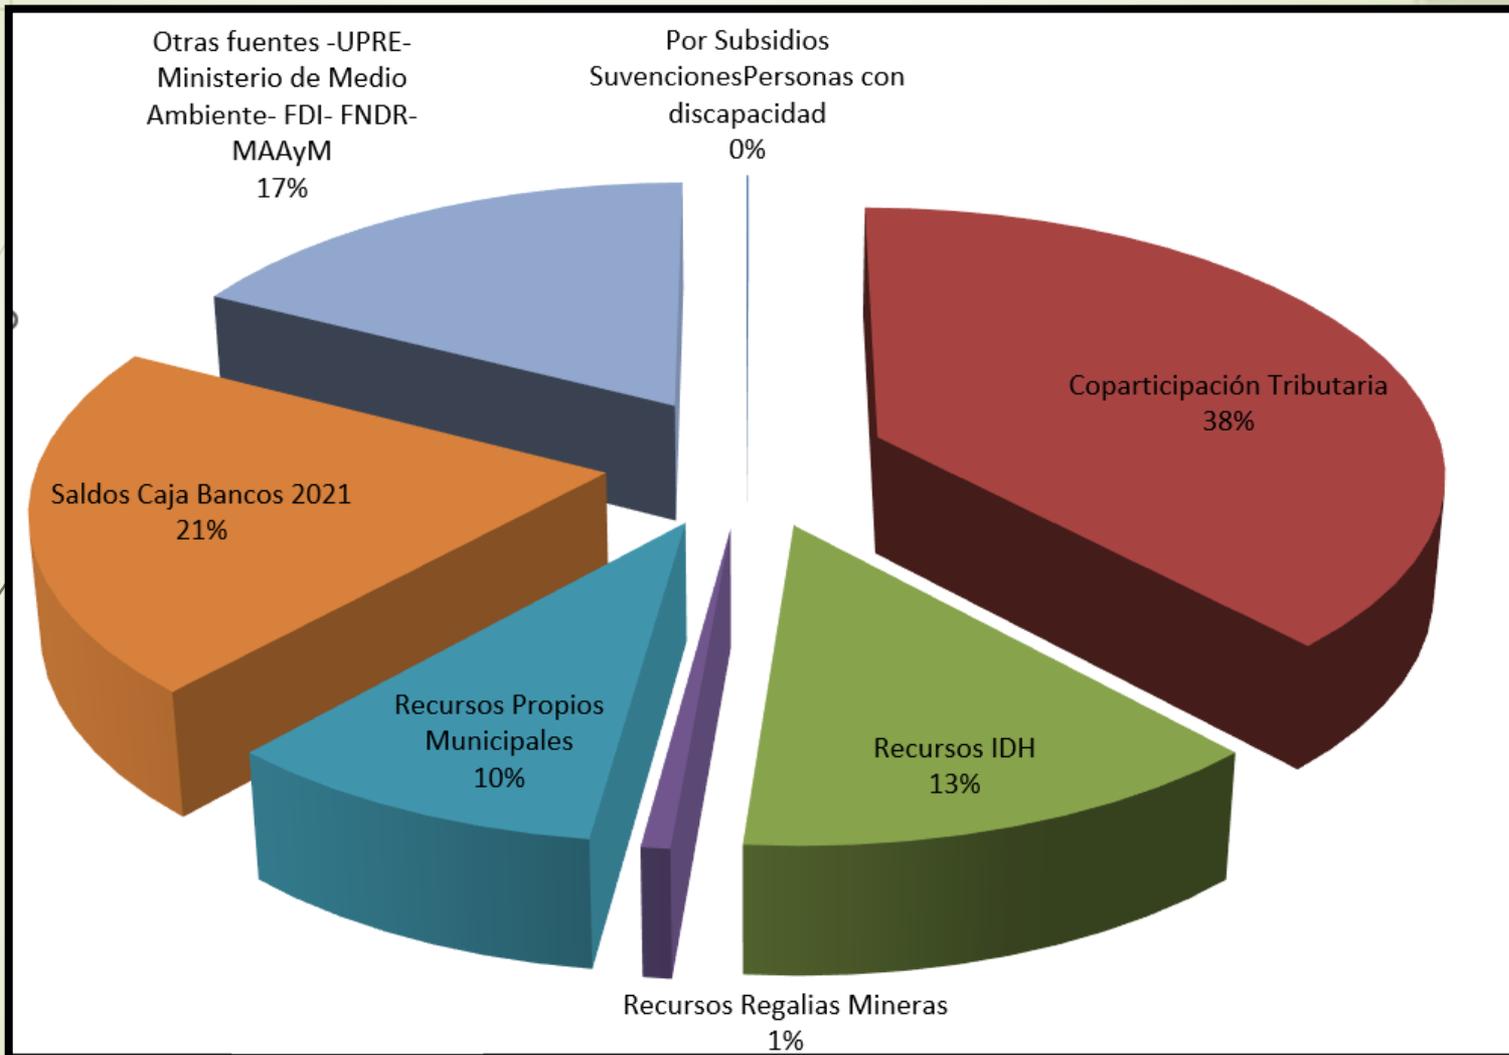

RECURSOS



Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua

***PROGRAMAS,
PROYECTOS Y
ACTIVIDADES GESTIÓN
2022***



PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA





CONVENIO SENASAG



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
30.000,00	29.280,00	720	100%

- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** El presupuesto esta destinado al pago de sueldos y salarios, adquisición de equipos y otros.





CONVENIO SEGURO AGRARIO UNIVERSAL (INSA)



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

206.000,00

194.862,00

11.138,00

95%

• **Avance Financiero:** 95%

• **Observaciones:** política destinadas a la protección de cultivos frente a desastres o eventos adversos..



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA CON LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA”

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2.089.801,05 Bs.-	2.089.801,05 Bs.-	00,00Bs.-	100%

•**Empresa Contratista:** KADEMCORP BOLIVIA Y ASOCIADOS.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** con cierre físico y financiero ante FDI NACIONAL

omo Municipal
llagua



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA**



**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA CON LA
INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS
EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA (SUPERVISION TECNICA)”**

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
88.000,00	88.000,00	00,00	100%

- Empresa Contratista: ALEJANDRO PEREZ JORGE..
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 100%
- Fecha de Entrega Definitiva: 27 de abril 2022



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN INVERNADEROS DE TIPO TÚNEL PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL DISTRITO AYLLU SIKUYA MUNICIPIO DE LLALLAGUA



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
851.229,65 Bs.-	0,00 Bs.-	851.229,65 Bs.-	0%

- **ENTIDAD FINANCIERA:** FONADIN (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL)
 - **Avance Físico:** 0%
 - **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** CON CONVENIO PARA EJECUCIÓN



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



(SUPERVISIÓN TÉCNICA)

PROYECTO: CONSTRUCCION DE INVERNADEROS DE TIPO TUNEL PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN EL DISTRITO AYLLU CHULLPA MUNICIPIO DE LLALLAGUA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

31.264,02 Bs

31.264,02 Bs

0,00 Bs

100,00%

- **Empresa:** PERDAF
- **Avance Físico:** 100,00%
- **Avance Financiero:** 100,00 %
- **Observaciones:** CONCLUIDO





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA



EQUIP. DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA MUNICIPIO DE LLALLAGUA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.635.600,00 Bs	0 Bs	1.635.600,00 Bs	0%

- **Empresa:** EN PROCESO DE CONTRATACION
- **Avance Físico:** 0,00%
- **Avance Financiero:** 0,00%
- **Observaciones:** EN PROCESO





SANEAMIENTO BASICO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



**CONSTRUCCION ALCANTARILLADO 14 DE SEPTIEMBRE
 Y LA REVUELTA CAMPAMENTO CANCAÑIRI SIGLO XX**

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

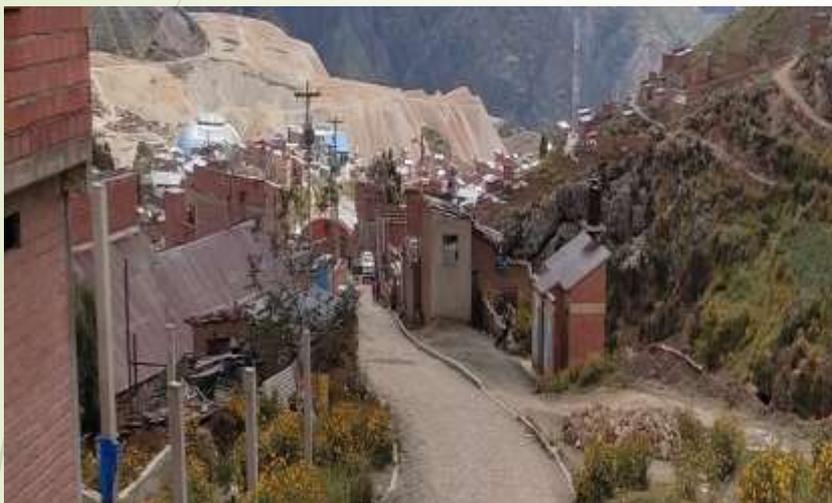


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
44.443,00 Bs	44.276,05 Bs	166,95 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTUCTORA CONSULTORA F.C.J.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** EJECUTADO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA



AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 14 DE SEPTIEMBRE CAMPAMENTO CANCAÑIRI SIGLO XX

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
10.000,00 Bs.	9.959,05 Bs	40,95 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTUCTORA CONSULTORA F.C.J.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** EJECUTADO

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



**“MANTENIMIENTO DE RED DE ADUCCION PURCILAMAYU
 DISTRITO AYLLU SIKUYA”**

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
13.678,00 Bs.	13.643,50 Bs.	34,50 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** MARIO MAMANI TICONA.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
 De Llalagua





MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA ESCALERANI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
5.281.712,94 Bs	1.359.965,56 Bs	3.921.747,38 Bs	25,75%

- **Empresa:** CONDOR NASA & ASOCIADOS
- **Avance Físico:** 33,27%
- **Avance Financiero:** 25,75%
- **Observaciones:** EN EJECUCION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



SUPERVISION TECNICA (MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA ESCALERANI)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
288.397,26 Bs	0,00 Bs	0,00 Bs	0,00%

- Empresa: COPCOCI
- Avance Físico: 29,75%
- Avance Financiero: 0,00 %
- Observaciones: EN EJECUCION





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ELABORACIÓN ESTUDIO DISEÑO TECNICO DE PRE-INVERSION E.D.T.P. "MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MEDIA DEL RIO VERDE"

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
150.000,00	83.700,00	66.300,00	100%

Empresa Contratista: CONST. Y CONS CONSTRUMAG.

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 53,89%

Observaciones: CONCLUIDO

omo Municipal

De Llalagua





DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE





MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREA VERDES AREA URBANA”



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	(%)
750.000,00	561.589,94	184.436,66	75

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de equipos, insumos, materiales y suministros.
- Adquisición de combustible.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES ÁREA URBANA (REFACCIÓN PLAZA 6 DE AGOSTO)



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	(%)
46.596,72	43.334,95	3.261,77	93

- Empresa Unipersonal: CAMIRCONS.
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 93%





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MECANIZACION AGRICOLA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



Observaciones: Se realiza trabajos de roturado, nivelado de terreno para los comunarios de los ayllus Chullpa y Sikuya.

- Recaudación por concepto de flete de tractor agrícola monto total **42.715,00 BS. RECAUDADO**



De Lallagua

Municipal



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA



FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN



Observaciones: Se realizó la campaña de forestación en coordinación con la UNSXX mediante la dirección de extensión.



Gobierno Autónomo Municipal
De Llaclagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONTROL Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO



Observaciones: Inspecciones a las diferentes Cooperativas de nuestro municipio en coordinación el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Minería, Secretaria de Madre Tierra y Juzgado Agroambiental.

omo Municipal
agua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



"MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES AREA URBANA" (REFACCION PLAZA 6 DE AGOSTO ZONA CENTRAL DISTRITO CATAVI)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
14.492,91 Bs.	13.478,41 Bs.	1.014,50	93%

• **Empresa Contratista:** EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA F.C.J.

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 93%

• **Observaciones:** COBRO DE GARANTIA EN PROCESO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES “ÁREA URBANA” (REFACCIÓN TANQUE ELEVADO, RED DE AGUA PARA RIEGO DE JARDINERÍA, PARQUE CAMPESINO)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

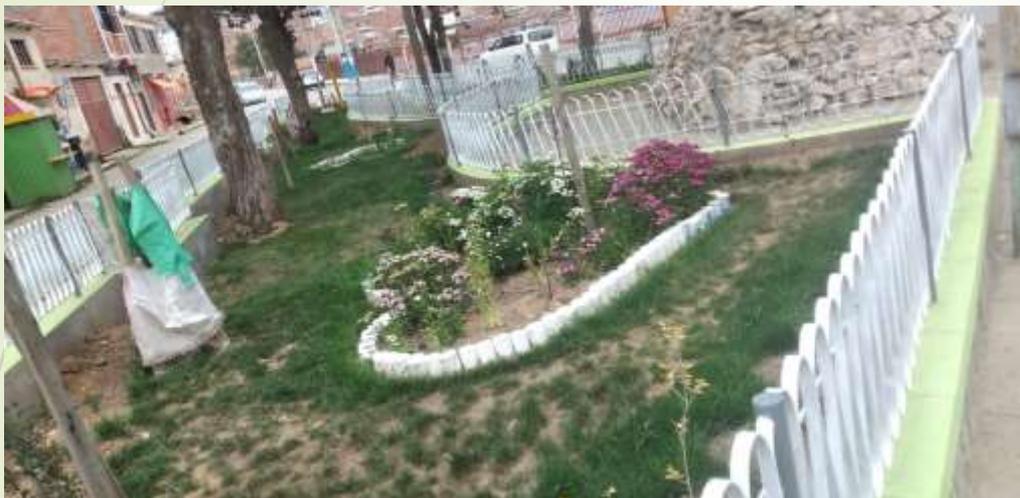


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.995,67 Bs.	4.962,10 Bs.	33,57 Bs.	1 %

• **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA Y CONSULTORA “ARCECAFI” S.R.L..

• **Avance Físico:** 1%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** EN EJECUCION

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS






GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA
UNIDAD DE ASEO



SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS

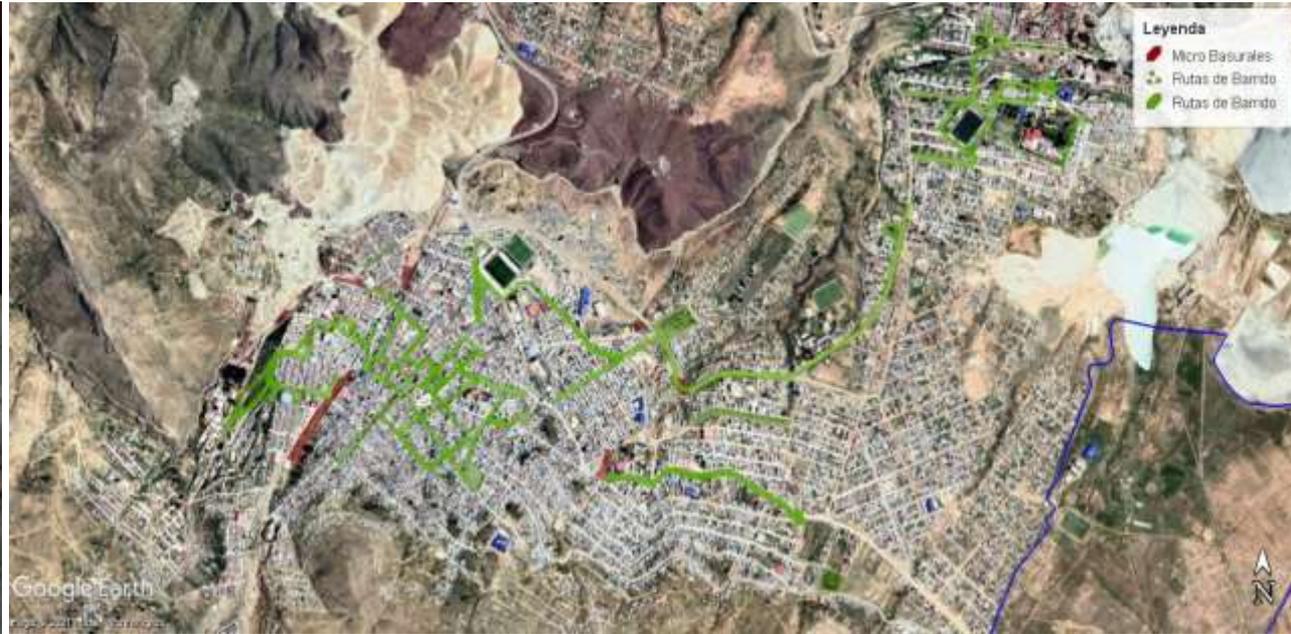

COBERTURA: 25% urbana y área periférica

PERSONAL: 7

LIMPIEZA: Método manual por rutas

HORAS TRABAJO: Mañana 3:30-7:30 Tarde 14:00-18:00 pm

HERRAMIENTAS: Escoba de paja, levanta basura, carretilla

RUTA DE TRABAJO: Según Imagen

Gobierno Autónomo Municipal
De Llaallagua




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA

UNIDAD DE ASEO



SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

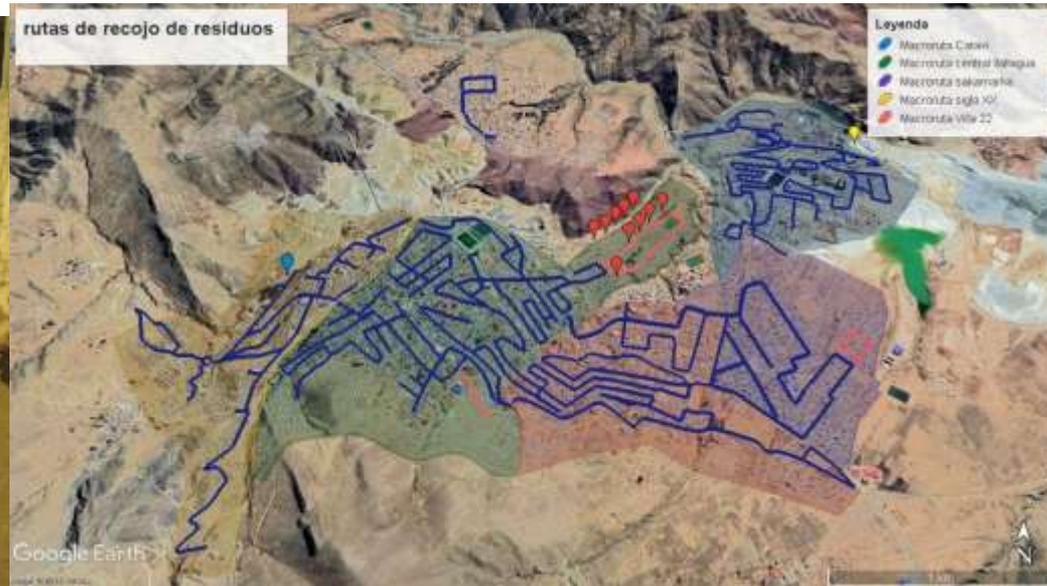

rutas de recojo de residuos

- Leyenda
- Macrozona Central
 - Macrozona Lince/Alfaro
 - Macrozona Sakamarka
 - Macrozona Villa XI
 - Macrozona Villa 22

IMAGEN ACTUAL

La recolección de residuos domiciliarios es de acuerdo a ruteo establecidos.

RECOJO: **Método por esquina y puerta a puerta**

DESTINO: **Botadero Municipal Controlado**

COBERTURA: **72 % AREA URBANA**

COMBUSTIBLE: **300 lt./semana y 15642,86 lt/año/2 car.**

PERSONAL: **2 Chofer; 4 Ayudantes de carro**

VEHICULOS: **DOS**

HORAS TRABAJO: **Continua 5:00-12:30**

AMPLIACIÓN DE RUTAS: **distritos central y sakamarka .**

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA
UNIDAD DE ASEO



APROVECHAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE



IMAGEN ACTUAL

AVECHAMIENTO: Plásticos, vidrios, papel, aluminio, cobre, nylon, botellas pett y cobre.

CANTIDAD: 4 camiones/dia = 20 tn/dia promedio

PERSONAL: 4



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA


SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA

UNIDAD DE ASEO



GENERACION DE INGRESOS

material	cantidad en kg	arrobas	precio	sub total (Bs)
alum. duro	380,00		5,0	1900
alum. Taquiñ	4368,00		4,0	17472
plasticos	13794,50		1,3	17932,85
nylon	3394,00		1,5	5091
papel	3326,50		1,0	3326,5
botella pet	33402,00		0,4	13360,8
hierro	515,50		0,4	206,2
V. Café	0,00	0,00	2,0	0,0
V. Verde	0,00	0,00	1,0	0,0
cobre	50,50		25,0	1262,5
total kg	59231,00	TOTAL (Bs)		60551,85

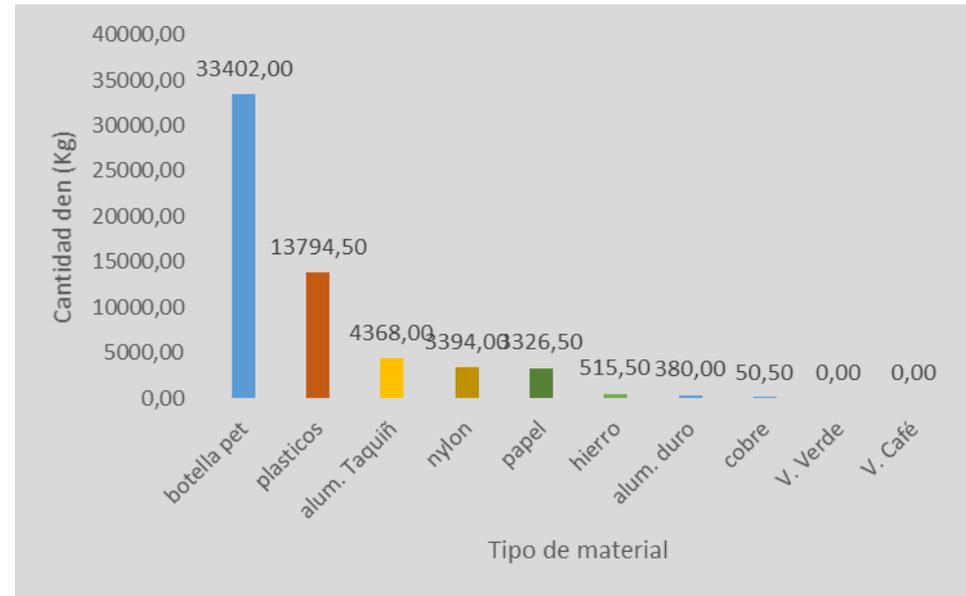

Ingresos generados a partir de venta de material reciclado, GESTION 2022, incremento de un 0,3 %. En relación a la gestión 2021.



INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN MINI MERCADO ZONA 2

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
655,706,17 Bs	655,706,17	0,00	100%

- **Empresa Contratista:** TRAVEJ S.R.L.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** Concluido y cerrado



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN MINI MERCADO ZONA 2
(OBRA PINTURA E ILUMINACION)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
299,242,21 Bs.	299,242,19 Bs.	0,02 Bs	99,99%

•**Empresa Contratista:** TRABEK S.RL.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 99,9%

•**Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADA

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



"REFACCION ARBITRIOS MUNICIPALES"
(REFACCION DE BALNEARIOS CATAVI)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
69.058,09 Bs.	64.224,02 Bs.	4.834,07 Bs	93%

•**Empresa Contratista:** EMPRESA UNIPERSONAL "NESTOR OROPEZA CHIARA"

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 93%

•**Observaciones:** COBRO DE GARANTIA EN PROCESO

obierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“CONSTRUCCIÓN BATERÍA DE BAÑOS CENTRO DE SALUD CATAVI”
(CONVENIO VISIÓN MUNDIAL)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
39.828,56 Bs.	37.040,56 Bs.	2.788,00 Bs	93%

•**Empresa Contratista:** EMPRESA UNIPERSONAL “NESTOR OROPEZA CHIARA”

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 93%

•**Observaciones:** COBRO DE GARANTIA EN PROCESO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL CATAVI”
(CONVENIO VISIÓN MUNDIAL)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
72.786,29 Bs.	67.691,25 Bs.	5.095,04 Bs	93%

•**Empresa Contratista:** EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA “LJMAR”

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 93%

•**Observaciones:** COBRO DE GARANTIA EN PROCESO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“REFACCION ARBITRIOS MUNICIPALES (REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO AMBIENTES COMANDO DE POLICÍA REGIONAL LLALLAGUA)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

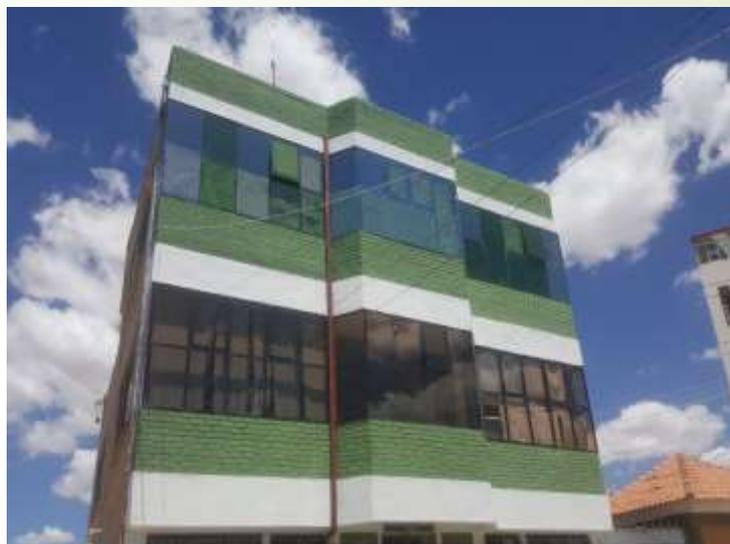


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
34.991,24 Bs.	34.991,24 Bs.	00,00 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** EMPRESA ENOSUR
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** EN TRAMITE
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“REFACCION ARBITRIOS MUNICIPALES”(REFACCION CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
98.854,01 Bs.	98.854,01 Bs.	0,00 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YAPURA

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCION AMBIENTES SEDE AYLLU CHULLPA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
40.000,00 Bs	39.756,25 Bs	243,75 Bs	99,39%

- **Empresa:** EN PROCESO DE CONTRATACION
- **Avance Físico:** 99,39%
- **Avance Financiero:** 99,39%
- **Observaciones:** COCLUIDO

bierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCION ARBITRIOS MUNICIPALES
(MANTENIMIENTO DE AMBIENTES EDIFICIO MUNICIPAL DE LLALLAGUA)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
10.702.72 Bs	10.702.72 Bs	0 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** YATO.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL ZONA 2”
(CONVENIO VISIÓN MUNDIAL)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
44.108.60 Bs	44.106,96 Bs	1,64 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** ARQUITOPMIN.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCIÓN PARQUE MONUMENTO AL CAMPESINO ZONA 6 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
70.000,00 Bs.	69999,92 Bs.-	0,08 Bs.	100%

• **Empresa Contratista:** "CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ROEDAJ S. R. L."

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MEJORAMIENTO CON PISO CARPETA CALLE MARISCAL SUCRE ZONA 10 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
140.727,00 Bs	140.378,87 Bs.	348,13 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** Constructora consultora "CONDURALTD"
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL CORTE Y NIVELADO DEL PROYECTO CAMPO FERIAL NORTE POTOSÍ

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
395,530.06 Bs.	394.585,60 Bs.	944,46	100%

- **Empresa Contratista:** Constructora y Consultora SAENCO.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



CONSTRUCCIÓN CAMPO FERIAL NORTE POTOSÍ

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.000.000,00 Bs.	420.000,00 Bs.	580.000,00 Bs.	25%

• **Empresa Contratista:** Asociación accidental Potosí.

• **Avance Físico:** 25%

• **Avance Financiero:** 42% (De programado)

• **Observaciones:** Primera transferencia 20% de la contraparte Municipal 2.100.000,00 BS



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN PISO CARPETA CALLE MARTÍN CÁRDENAS ENTRE VANGUARDIA Y CALLE 26 DE OCTUBRE ZONA 8 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

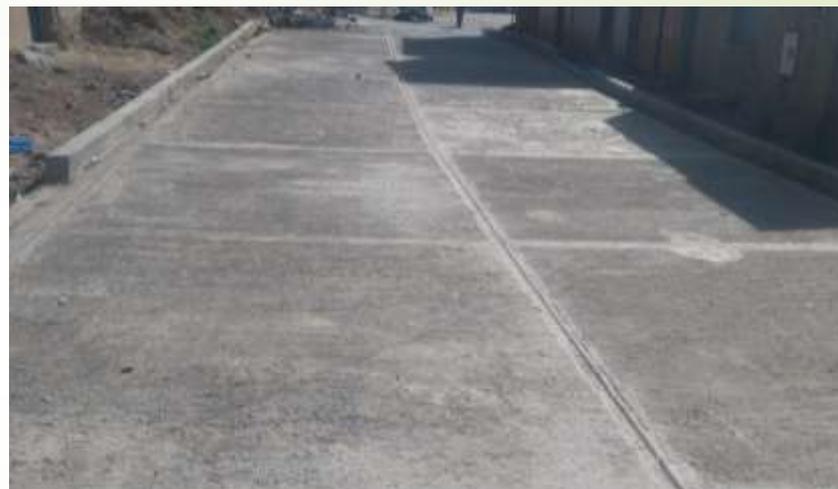


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7,431,00 Bs.	4.292,39 Bs.	3.138,61 Bs.	100%

• **Empresa Contratista:** Asociación accidental Potosí.

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 100%

• **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCION CASA COMUNAL CAMPAMENTO SALVADORA SIGLO XX

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
44.443,00 Bs.	44.300,57 Bs.-	142,43 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** EMCOEDEN
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO Y CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN TINGLADO PARQUE INFANTIL CALLE TOPATER
ZONA 9



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
184.195,00 Bs.	184.195,00 Bs.	00,00 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** UNIPERSONAL HILARION PARACARA JORGE.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO MINI PLAZA
ZONA 9

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
65.605,00 Bs.	0,00 Bs.	65.604,64 Bs	0%

- **Empresa Contratista:** CONST. Y CONSULTORA PLAZA YOCAMI
- **Avance Físico:** 80%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** EN EJECUCION



GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS

DATOS DEL PROYECTO	
PARTIDA	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES
ENCARGADO DE OO.PP.	ZENON AGUILAR
TECNICO DE OO.PP.	ORLANDO TICONA JACHACOLLO
ACTIVIDAD	RIPIADO Y PERFILADO DE CAMINOS
MES DE TRABAJO	12 meses del año
DISTRITOS	LOS 7 DISTRITOS



IMAGEN ACTUAL



Gobierno Autónomo Municipal
De Llaallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



"MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS" CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL

IMAGEN DEL PERSONAL EVENTUAL



DATOS DEL PROYECTO

PARTIDA	MANTENIMIENTOS DE VIAS URBANAS
TECNICO DE OO.PP.	ORLANDO TICONA JACHACOLLO
TIEMPO DE CONTRATO	85 D/C
ACTIVIDAD	BACHEOS, VASEADO DE CUNETAS Y CORDONES
PERSONAL	56
FECHA DE CULMINACION DE CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
136.453,03 Bs.-	136.453,03 Bs.-	0,00 Bs.-	100%





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA 10 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE”
(ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA
CORDONES DE ACERA ZONA 10)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
5.000,00 Bs.	4.999,20 Bs.	0,80 Bs.	100%

•**Empresa Contratista:** EMPRESA CONSTRUCTORA HILARIÓN PACARA JORGE.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 0%

•**Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS”
(MANTENIMIENTO Y REFACCION PAVIMENTO FLEXIBLE AV. MARIA BARZOLA, BUENOS AIRES, CALLE 31 DE OCTUBRE Y CALLE UNCIA)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
40.000,00 Bs.-	39.990,00 Bs.-	10,00 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** YATO
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS”
MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS (ADQUISICIÓN DE LOSETAS CALLE
SALIDA TERMINAL DE BUSES)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
100.807,18 Bs.-	100.807,18 Bs.-	0,00 Bs.-	100%

•**Empresa Contratista:**“CONSTRUCTORA GUAMAN L.R.H.C. S.R.L.”

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS” (CONSTRUCCION CORDONES Y ENLOSETADO CALLE SALIDA TERMINAL DE BUSES)

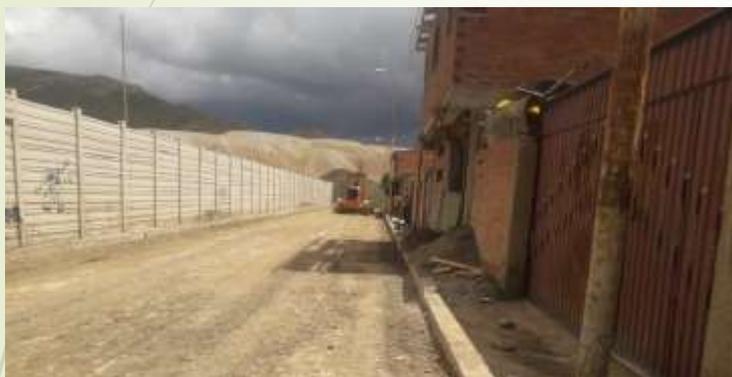


IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
30.502,39 Bs.-	30.502,39 Bs.-	0,00 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** YATO
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS”
(AMPLIACION CORDONES PARA ACERA AV. MONTES Y CALLE ALIANZA
DISTRITO SAKAMARKA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
99.537,75 Bs.	99.537,75 Bs.	0,00 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA YAPURA.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS”
(AMPLIACION CORDONES PARA ACERA CALLE LUIS MORALES
DISTRITO SAKAMARKA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
19.998,63 Bs.	19.992,00 Bs.	6,63 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA YAPURA.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCION ENLOSETADO LOTE 1: CONST. ENLOSETADO AVENIDA CANCAÑIRI (LLALLAGUA)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
864.821,05 Bs.-	864.817,13 Bs.-	3,92 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** EMPRESA CONSTRUCTORA UNIPERSONAL "MATCONY"
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA**



**“CONSTRUCCION ENLOSETADO LOTE 2”
CONST. ENLOSETADO AV. MONTES (LLALLAGUA) CONVENIO FPS**

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
913.401,39 Bs.	913.401,39 Bs.	0,00 Bs	100%

Empresa Contratista: ASOCOACION ACCIDENTAL CRUZ

- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 90%
- **Observaciones:** FALTA ENTREGA DEFINITIVA

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“CONSTRUCCION ENLOSETADO LOTE 3”
CONST. ENLOSETADO CALLE ALIANZA (LLALLAGUA) CONVENIO FPS

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
715.529,10 Bs.	715.529,10 Bs.	0,00 Bs	100%

Empresa Contratista: CONST. MATCONY

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 90%

• **Observaciones:** FALTA ENTREGA DEFINITIVA

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCION GRADERIAS ZONA 5

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00 Bs.	0,00 Bs.	20.000,00 Bs	0%

- **Empresa Contratista:** UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YASIK.
- **Avance Físico:** 20%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** EN EJECUCION



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA 5 (REFACCION Y MANTENIMIENTO DE CALLES FRIAS, TUPIZA Y BUSCH)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

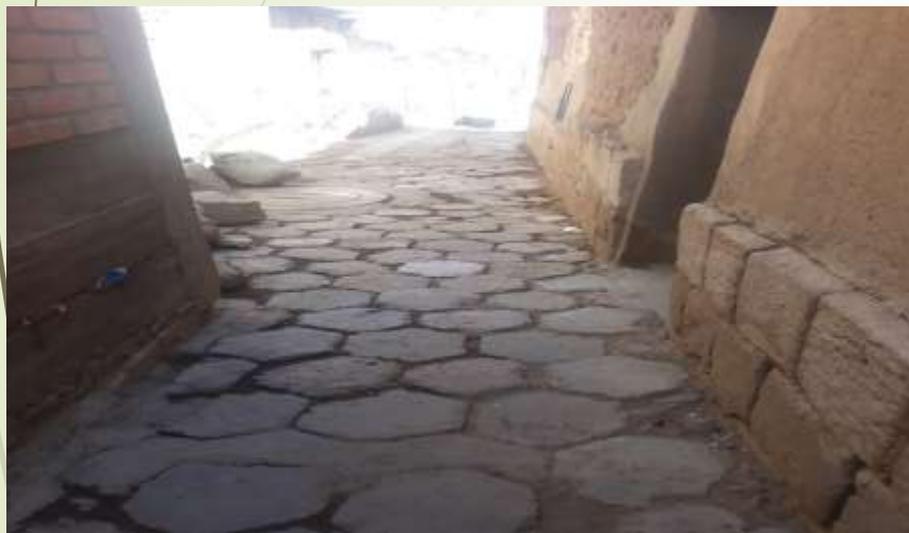


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
87.892,03 Bs.	00,00 Bs.	87.892,03 Bs	0%

• **Empresa Contratista:** UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YASIK.

• **Avance Físico:** 40%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** EN EJECUCION DE OBRAS

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA 3 ” (INSTALACIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO CALLE CAMPERO)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
19.775,00 Bs.	18.390,75 Bs.	1.384,25 Bs.	93%

•**Empresa Contratista:** YAPURA

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 93%

•**Observaciones:** CONCLUIDO FALTA RETENCION

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA 3” (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA LA REFACCION Y MANTENIMIENTO CALLE CAMPERO)



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
133.128,00 Bs.	133.128,00 Bs.	0,00 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** SOBOCE S.A.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** EN TRAMITE
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA 3” (ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA LA REFACCION Y MANTENIMIENTO PLAZA DE ARMAS)



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
74.992,00 Bs.	74.992,00 Bs.	00,00 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** SOBOCE S.A.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE CALLES ZONA 3” (REFACCION Y MANTENIMIENTO PLAZA DE ARMAS)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
83.388,60 Bs.	66.711,03 Bs.	16.677,56 Bs.	80%

- **Empresa Contratista:** YAPURA
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 80%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE CALLES ZONA 3” (REFACCION Y MANTENIMIENTO CALLE CAMPERO)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
149.764,26 Bs.	112.047,99 Bs.	37.716,26 Bs.	75%

- **Empresa Contratista:** YAPURA
- **Avance Físico:** 90%
- **Avance Financiero:** 75%
- **Observaciones:** EN EJECUCION

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS “MANTENIMIENTO Y REFACCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE TOPATER ZONA 9

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
15.000,00 Bs	14.995,75 Bs.	5,25 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA “ ROLANDO CHAMBI QUISPE ”

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CALLE 24 DE JUNIO ZONA 1

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
100.000,00 Bs.-	99.958,35 Bs.-	42,65 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA " ROLANDO CHAMBI QUISPE "
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCION CALLE 1RO DE MAYO ENTRE AV. BUENOS AIRES Y CALLE OMISTE ZONA 1

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
152,237,00 Bs.	152,237,00 Bs.	0,00 Bs.-	100%

• **Empresa Contratista:** "EMPRESA UNIPERSONAL IGOR ABEL HURTADO ARIAS"

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 100%

• **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCIÓN CALLE GENERAL SÁENZ ZONA 7

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
274.449,35 Bs.-	274,449,35 Bs.-	00,000 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** CONST. COPA DE PIEDRAS.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MEJORAMIENTO DE VIA CON MURO DE CONTENCIÓN LA REVUELTA DISTRITO SIGLO XX

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
99.027,64 Bs.	99.019,64 Bs.	8,00	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA CONSULTORA PERDAF S.R.L.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



AMPLIACION DE VIA LIMITE ZONA 3 CENTRAL Y CAMPAMENTO N° 1 SIGLO XX

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
50.000,00 Bs.	49.911,32 Bs.	88,68 Bs.-	100%

- Empresa Contratista: LEYMACONS
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 93%
- Observaciones: EJECUTADO

omo Municipal
lagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS”(CONFORMACION DE CAPA BASE EN LA CALLE ALIANZA Y AV. MONTES DISTRITO SAKAMARKA)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
49.977,10 Bs.	00,00 Bs.	49.977,10 Bs	0%

- **Empresa Contratista:** UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YAPURA.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS”(AMPLIACION CORDONES PARA ACERA CALLE LUIS MORALES DISTRITO SAKAMARKA)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
99.537,75. Bs.	99.537,75. Bs.	0,00 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YAPURA

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA 5

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00	19.999,84	0,16	100%

- **Empresa Contratista:** ELECTRO POL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Fecha de Entrega Definitiva:** CONCLUIDO Y CERRADO A FALTA DE CANCELACION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00	19.993,96	6,14	100%

- **Empresa Contratista:** ELECTRO POL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Fecha de Entrega Definitiva:** CONCLUIDO Y CERRADO A FALTA DE CANCELACION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA 7

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
20.000,00	19.999,84	0,16	100%

- Empresa Contratista: ELECTRO POL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
- Avance Físico: 100%
- Avance Financiero: 0%
- Fecha de Entrega Definitiva: CONCLUIDO Y CERRADO A FALTA DE CANCELACION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA BARRIO LINDO DISTRITO CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
16.830,00 Bs.	16.830,00 Bs.	0,00 Bs.	100%

• **Empresa Contratista:** "ELECTRO POOL CONSTRUCTORA & CONSULTORA"

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 100%

• **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Municipal
de Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



AMPLIACIÓN LÍNEA TRIFÁSICA ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
239.597,48 Bs	156.810.40 Bs	82.787,08 Bs	65.46%

- **Empresa Contratista:** ELECTRO POOL CONSTRUCTORA & CONSULTORA.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 65.46%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



CATASTRO URBANO LLALLAGUA, VILLA 22 DE DICIEMBRE, CATAVI Y SIGLO XX





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ABG. REBECA MAMANI CONDORI (SE PRESENTO LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS Y LEYES)

- PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE PLANOS
- REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA TERRENOS TRANSFERIDOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

AVASALLAMIENTOS				
En contra de	Ubicación	Inf. Notificadora	Inf. Técnico	Inf. Legal y remisión D.A.L.
Alex Coria	Distrito siglo XX, camp 5	X	X	X
Jhonatan vege	Distrito siglo XX, Camp. 6 tipo H	X	X	X
Jorge Mamani	Distrito siglo XX, Camp. 6 tipo H	X	X	X
Roger Jiménez	Distrito siglo XX, Camp. 6 tipo H	X	X	X
Florencia Jiménez Coria	Distrito siglo XX, Camp. 6 tipo H	X	X	X
Benito Caracará Wenceslao Herrera	Distrito Catavi Zona San Cristobal	X	X	X
Susana chamera	Distrito Catavi Zona Central	X	X	X
Toni Rodríguez	Distrito Catavi Zona Central	X	X	X
Estanislao Calizaya	Distrito Catavi Zona Central	X	X	X
Epifanio Caracara	Distrito Catavi Zona Chaelt	X	X	X
Miguel huanca	Distrito villa 22 de dic. Zona 10	X	Para técnico informe	
Lidia Ordoñez	Distrito villa 22 de dic. Zona 10	X	Para técnico informe	
Nelson Diaz	Distrito villa 22 de dic. Zona 10	X	Para técnico informe	
Tania Alejandro Jhonny Llanca	Distrito Siglo XX Camp. 6 tipo H	X	Para técnico informe	

ACTUALIZACION DEL PLANO CATASTRAL DEL MUNICIPIO. (TOPOGRAFOS)



SERVICIO DE CATASTRO URBANO

NOTIFICADORA (ASHLEY BRANDY MAMANI CALLE)

DIST.	PRESENTACION DOCUMENTOS	CONSTRUCCION CLANDESTINA	AVASALLAMIENTO	RETIRO DE AGREGADOS	BIENES NO MINERO O TGN
LLALLAGUA	12	1	-	18	1
SIGLO XX	9	5	-	47	-
VILLA 22 DE DICIEMBRE	-	-	-	-	-
CATAVI	1	1	1	-	7
SAKAMARCA	2	1	-	4	-
TOTAL	24	8	1	69	8
TOTAL GENERAL				110 NOTIFICACIONES	

NOTIFICADORA (ESPERANZA ROSARIO HUANCA MENDOZA)

Districtos	Proceso Adm.	Avasallamiento	Presentación documento	Área verde/equi.	Retiro de agregado	Prorroga
Llalagua	2	1	20	1	12	8
Siglo XX	9	10	5	-	5	5
Villa 22 Diciembre	8	7	17	6	7	14
Catavi	10	12	3	-	7	3
Sakamarca	-	1	1	-	-	1
TOTAL	29	31	46	57	31	31
TOTAL GENERAL					225 NOTIFICACIONES	

TRABAJOS RELACIONADOS A TOPOGRAFÍA Y ACTUALIZACIÓN SIG.

Nº	DISTRITO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ACTUALIZACION EN SIG
1	LLALLAGUA	21	10	8
2	SIGLO XX	6	21	1
3	CATAVI	7	6	1
4	VILLA 22 DE DICIEMBRE	16	6	6
5	SAKAMARCA	6	2	15
6	AYLLU CHULLPA	10	X	X
7	AYLLU SIKUYA	6	X	X
TOTAL TRABAJOS		72	45	31



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA



SERVICIO DE CATASTRO URBANO

Nº	OPERACIONES	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% EJEC.
1	APROBACIÓN DE 817 TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE PROPIEDADES, ORIENTADOS A TRANSFERENCIAS, PROREVI, REGULARIZACIONES, USUCAPION, FRACCIONAMIENTO, CONSTRUCCION, ACTUALIZACION, DECLARATORIA DE HEREDEROS, APERTURA DE FARMACIAS, FUSION DE PROPIEDADES, SESION DE ACCIONES Y DERECHO Y DIVISION Y PARTICION, DENTRO DEL RADIO URBANO DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA.	825	783	84.49%
2	EMISION DE INFORMES DE NO AFECTACION A PROPIEDADES MUNICIPALES	100	96	96.00%
3	MINUTACION DE 250 CARPETAS DE ADJUDICACION A BENEFICIARIOS SEGÚN LEY 4154	250	192	76.80%
4	CONCLUIR 14 PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR CONSTRUCCIÓN CLANDESTINA CON PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA EVITAR CONSTRUCCIONES ILEGALES	14	4	28.57%
5	REALIZAR 30 REGISTROS DE ÁREAS VERDES CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO PARA LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA SEGÚN LA LEY 269/2021	20	8	40.00%
6	REALIZAR 40 ACTUALIZACIONES Y CORRECCIÓN DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTO, CON EL PROCESO CORRESPONDIENTE, PARA EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA SEGÚN LA LEY 269/2021	40	32	80.00%
7	REALIZAR 30 INSPECCIONES DE ÁREAS DE EQUIPAMIENTO CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO PARA LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA	30	22	73.33%
8	TRANSFERENCIAS DE 20 ÁREAS/ZONAS/CAMPAMENTOS IDENTIFICADOS SEGÚN LEY 4154	8	6	75.00%
9	APROBAR 19 PLANES REGULADORES DE LOS DISTRITOS CATAVI Y SIGLO XX CON LOS ESTUDIOS REQUERIDOS PARA MEJORAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.*	19	0	0.00%

MINUTACIONES

Nº	URBANIZACION	CANT.
1	BARRIO MARIA BARZOLA	25 (1º GRUPO) 3 (2º GRUPO)
2	BARRIO MUNICIPAL	5 (1º GRUPO)
3	URB. VILLA NUEVA ESPERANZA	19 (1º GRUPO) 29 (2º GRUPO) 34 (3º GRUPO)
4	BARRIO SALVADORA A	14 (1º GRUPO)
5	URB. 1º DE JULIO	15 (1º GRUPO)
6	BARRIO 1º DE MAYO	10 (1º GRUPO)
7	BARRIO 5 CASAS	38 (1º GRUPO)
TOTAL MINUTAS		192 MINUTAS ENVIADAS

TRANSFERENCIAS 4154

Nº	ZONA/URB./CAMP.	DISTRITO
1	ZONA CABAÑA	CATAVI
2	ZONA CENTRAL	CATAVI
3	ZONA SAN CRISTOBAL	CATAVI
4	ZONA 16 DE NOVIEMBRE	CATAVI
5	ZONA 9 PARTE BAJA	SAKAMARCA
6	SIGLO XX PARTE ALTA	SIGLO XX

* Si bien no se tiene aun las planimetrías aprobadas, durante la gestión se fue socializando los productos finales de las planimetrías elaboradas, las mismas se encuentran en la ultima etapa de corrección para su aprobación



Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GESTIÓN DE SALUD



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SALUD



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7.000.000,00 Bs.	4,881.763.08 Bs.	2,118.236.92 Bs.-	69.74%

• **Avance Financiero:** 69.74%

• **Presupuesto destinado a:** Pago de Sueldos y Salarios Personal de Salud 1er y 2do nivel, adquisición de medicamentos y adquisición de repuestos para vehículos médicos.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO AL FUNCIONAMIENTO UNI



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
111.689,00 Bs.	88,715,00 Bs.	22,973,93 Bs.-	79.43%

•Avance Financiero: 79.43%
•Presupuesto destinado a: Pago de Sueldos y Salarios Personal Unidad de Nutrición, adquisición de equipamiento para la unidad.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO DE HABILITACION Y REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
217,927,00 Bs.	48,951.14 Bs.	168,975.86	22.46%

- **Avance Financiero:** 22.46%
- **Presupuesto destinado a:** Pago de Sueldos y Salarios Personal Médico, adquisición de equipamiento para la unidad.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



ADQUISICIÓN DE NUTRIBEBES



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
500,000,00 Bs.	499,777,74 Bs.	222,26 Bs.-	99.96%

- **Avance Financiero:** 99.96%
- **Presupuesto destinado a:** Adquisición de alimento complementario para niños y niñas menores a 2 años.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO A PROGRAMAS DE SALUD



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
251,218,00 Bs.	9,053,66 Bs.	242.164.34 Bs.-	3.60%

• **Avance Financiero:** 3.60%

• **Presupuesto destinado a:** la promoción, difusión, concientización de programas de salud que informen y beneficien a la población del municipio





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ZONOSIS



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
118,513.00 Bs.	49.778.80 Bs.	68,734.20 Bs.-	42.00%

•**Avance Financiero:** 42%

•**Presupuesto destinado a:** pago de sueldos y salarios del personal, adquisición de insumos y medicamentos destinados a la atención de mascotas, ferias y campañas de esterilización y vacunación.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO



IMAGEN DE SU EJECUCION



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.298.147,00 Bs.	2.693.166,08 Bs.	1,604,980.92 Bs.-	62.66%

• **Avance Financiero:** 62.66%

• **Presupuesto destinado a:** pago de sueldos y salarios del personal, adquisición de insumos y medicamentos, adquisición de complementos nutricionales (Carmelo y chispitas).





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19



IMAGEN DE SU EJECUCION



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2,419,632,00 Bs.	852.155.86 Bs.-	1,567,476.14 Bs.-	32.22%

• **Avance Financiero:** 86%

• **Presupuesto destinado a:** pago de sueldos y salarios del personal medico, adquisición de insumos, reactivos, equipos y medicamentos, campañas de vacunación y otras actividades.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN BAÑO HIGIÉNICO HOSPITAL MADRE OBRERA (CONVENIO VISIÓN MUNDIAL)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
80.689,64 Bs.	80.412,55 Bs.	277,09 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** Empresa Unipersonal "LEYMACONS"
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GESTIÓN DE EDUCACIÓN





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
 Potosí - Bolivia



PROVISIÓN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR
ÁREA CONCENTRADA GESTIÓN 2022



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley N° 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 12.215,00 alumnos (Nivel inicial, primaria y secundaria).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.682.740,00 Bs.-	1.471.494,23 Bs.-	3.211.245,77	31.42%

•**Empresa Contratista:** "NATIVIDAD"

•**Avance Físico:** 70 %

•**Avance Financiero:** 31.42%

•**destinado a:** la adquisición de alimentación complementaria para 23 Unidades Educativas

Gobierno Autónomo Municipal
 De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
Potosí - Bolivia



PROVISIÓN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR
ÁREA CONCENTRADA GESTIÓN 2022





PROVISIÓN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR ÁREA CONCENTRADA GESTIÓN 2022



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley N° 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 1.047 alumnos (nivel inicial, primaria y secundaria).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
406.600,80 Bs.-	354.177,60 Bs.-	52.422,40 Bs.-	87.11%

- **Empresa Contratista: "PROALBO"**
- **Avance Físico: 85 %**
- **Avance Financiero: 87.11%**
- **destinado a:** la adquisición de alimentación complementaria fue para 18 centros educativos.



PROVISIÓN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR **ÁREA CONCENTRADA GESTIÓN 2022**





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PERMANENCIA ESCOLAR ÁREA CONCENTRADA, GESTIÓN 2022 MUNICIPIO DE LLALLAGUA



PROGRAMADO

471,050,95 Bs.-

EJECUTADO

471,050,95 Bs.-

SALDO

0,05 Bs.

%

100%

•**Empresa Contratista:** Empresa “Comercial Villa Fuerte”

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PERMANENCIA ESCOLAR ÁREA DISPERSA, GESTIÓN 2022 MUNICIPIO DE LLALLAGUA



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
43.800,00 Bs.-	40.257,15 Bs.-	3.542,85	92%

• **Empresa Contratista:** Empresa "Comercial Villa Fuerte"

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 92%

• **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PAPI GESTIÓN 2022



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
368.000,00 Bs.-	342.142,14 Bs.-	25.857,86	93%

- **Avance Financiero:** 93%
- **Avance Físico:** 98%

• **Presupuesto destinado al:** funcionamiento de 21 centros infantiles PAPI, los cuales Brindan el servicio de Atención Integral en educación inicial, salud, nutrición y protección a Niños y Niñas menores de Cuatro Años.



HOSPEDAJE ESTUDIANTIL EN FAMILIA



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
368.000,00 Bs.-	342.142,14 Bs.-	25.857,86	93%

- **Avance Financiero:** 93%
- **Presupuesto destinado al:** funcionamiento de 21 centros infantiles PAPI, los cuales Brindan el servicio de Atención Integral en educación inicial, salud, nutrición y protección a Niños y Niñas menores de Cuatro Años.



HOSPEDAJE ESTUDIANTIL EN FAMILIA

OBJETIVO

Brindar una atención integral a los estudiantes becados, así evitar la deserción escolar y lograr la permanencia escolar que provienen de lugares alejados y son de escasos recursos económicos

RESULTADO



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
500.000,00 Bs.-	419.573,56 Bs.-	8.426,44	84%

- Avance Físico: 70 %
- Avance Financiero:84%
- destinado a: hospedaje estudiantil para los estudiantes que viven lejos de la unidad educativa



HOSPEDAJE ESTUDIANTIL EN FAMILIA

OBJETIVO

RESULTADO



- Se garantizó la atención de los estudiantes, a través del servicio de alimentación – hospedaje y apoyo pedagógico.
- 1. Uyuni (Ayllu Sikuya)
- 2. Capunita (Ayllu Sikuya)
- 3. Jiskanki (Ayllu Chullpa)
- Se contó con 90 estudiantes becarios que concluyeron el año escolar, SIN DESERCIÓN ALGUNA.
- Se cuenta con 20 nuevos bachilleres

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
500.000,00 Bs.-	419.573,56 Bs.-	8.426,44	84%

- Avance Físico: 70 %
- Avance Financiero:84%

•Destinado a: hospedaje estudiantil para los estudiantes que viven lejos de la unidad educativa





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



**MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS
 (REFACCIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO
 INDIGENA AYLLU CHULLPA)”**



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
45.923,46 Bs	45.923,46 Bs	0,00 Bs	100%

- **Empresa:** EMP.CONST. Y CONSULT. F.C.J.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** COCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA



IMAGEN DE SU EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
551.212,00 Bs.-	464.801,00 Bs.-	86.411,00.-	84,32%

- **Avance Financiero:** 72,33%
- **Empresa Ejecutora:** SIXTO TICONA COLQUE.
- **Tiempo de Ejecución:** 148 días escolares
- **Observaciones:** Concluido





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU CHULLPA



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
388.862,80 Bs.-	270.320,00 Bs.-	118.542,80.-	70%

•Avance Financiero: 70%

•Avance Físico: 85%

•Empresa Ejecutora: Sixto Ticona Colque

•Tiempo de Ejecución: 148 días escolares

•Observaciones: Concluido

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO**



TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU SIKUYA- 2022

OBJETIVO

RESULTADO



- Transporte escolar (Tramos 1, 3 y 6 por 168 días calendario escolares)
- Transporte escolar “Tramos 4 (Por 168 días calendario escolares y el tramo 5 (Por 164 días calendario escolares)”
- Transporte escolar (Tramo Capunita)

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
332.055,00Bs.-	178.308,40	143.746,60.-	54%

•Avance Financiero: 54%

•Avance Fisico: 60%

•Empresa Ejecutora: Benito Gaspar Cuyo

.Tiempo de Ejecución: 168 días escolares

•Observaciones: Concluido





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



"TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU SIKUYA GESTION 2022

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
299.708,00 Bs	203.626,08 Bs	96.081,92 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** BENITO GASPAR CUYO
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 60%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU SIKUYA GESTION 2022”

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
299,708,00 Bs.	56.970,00 Bs.	242.738,00 Bs	100%

Empresa Contratista: CIRILO CHOQUE GASPAR

- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 60%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“TRANSPORTE ESCOLAR AYLLU” (NUCLEO CAPUNITA GESTION 2022)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
80.902,25 Bs.	80.860,40 Bs.	41,85 Bs	100%

Empresa Contratista: HUGO VARGAS MUELA

- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 80%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA 1RO DE MAYO "C"



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
45.006,00 Bs.-	26.180,00 Bs.-	18.826,00 Bs.-	58.17%

•Avance Financiero: 58.17%

•Avance Físico: 65%%

•Empresa Ejecutora: Cirilo Choque Gaspar

•Tiempo de Ejecución: 165 días escolares

•Observaciones: Concluido

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA "SAN BENITO MENNI"



PROGRAMADO

60.000,00 Bs.-

EJECUTADO

43.092,00 Bs.-

SALDO

16.908,00 Bs.-

%

71.82%

• **Avance Financiero:** 71.82%

• **Avance Físico:** 85%

• **Empresa Ejecutora:** Empresas unipersonales

• **Tiempo de Ejecución:** 159 días escolares

• **Observaciones:** Concluido

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



Programa de Post-Alfabetización Gestión 2022



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
30.000,00 Bs.-	Bs.-		%

•Avance Financiero:%

•Presupuesto destinado al: Erradicar el analfabetismo y brindar una educación a todas las personas mayores de 15 años que no tuvieron acceso a la escolaridad.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO AL FUNCIONAMIENTO CENTRO INTEGRAL MULTISECTORIAL "SAN BENITO 2022

OBJETIVO



RESULTADO

- Contratación de una psicopedagoga.
- Contratación de una trabajadora social.
- Contratación de manipuladores de alimentos
- Adquisición de carnes y derivados
- Adquisición de verduras y frutas

PROGRAMADO

138.000,00

EJECUTADO

57.283,60 Bs.-

SALDO

80.716,40 Bs.-

%

41.50%

- **Empresa Contratista:**
- **Avance Físico:** 70 %
- **Avance Financiero:** 84%

• **Destinado a:** Apoyo a las personas con capacidades diferentes



Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



MANTENIMIENTO Y REFACCION CENTRO INTEGRAL MULTISECTORIAL "SAN BENITO 2022



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
109.547,00	98.802,98 Bs.-	10,744,02 Bs.-	90.19%

•Avance Físico: 98%

•Avance Financiero:90.19%

•destinado a: Refacción al centro integral multisectorial "San Benito" para los estudiantes beneficiarios



Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN U.E. CARLOS MEDINACELI)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7'186.863,29 Bs.-	7'186.863,29 Bs.-	0,00 Bs.-	100%

•**Empresa Contratista:** EMPRESA CONSTRUCTORA SOLCAM

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“HOSPEDAJE ESTUDIAJNTIL EN FAMILIA U. E. CAPUNITA AYLLU SIKUYA” (REFACCION MURO PERIMETRAL HOSPEDAJE ESTUDIANTIL EN FAMILIA U. E. CAPUNITA AYLLU SIKUYA)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
17.300,00 Bs.	17.271,50 Bs.	28,50 Bs	100%

Empresa Contratista: EMP. CONST. “YATO”

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 100%

• **Observaciones:** FALTA ENTREGA DEFINITIVA

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA**



ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LAS SIGUIENTES UNIDADES EDUCATIVAS:



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
80,000 Bs.-	72.755,00 Bs.-	7,245	91%

- **Empresa Contratista:** Setel Chuquisaca
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 91%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA**



ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LAS SIGUIENTES UNIDADES EDUCATIVAS:



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
80,000 Bs.-	72.755,00 Bs.-	7,245	91%

- **Empresa Contratista:** Setel Chuquisaca
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 91%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESPECIALIDADES:

ESPECIALIDADES

MECANICA AUTOMOTRIZ

CARPINTERIA DE MADERA Y METAL

SISTEMAS INFORMÁTICOS

ELECTRICIDAD

MECÁNICA INDUSTRIAL

GASTRONOMIA

PROGRAMADO	EJECUTADO	IMAGEN ACTUAL SALDO	%
93,000 Bs.-	91.162 Bs.-	1,838	98%

•**Empresa Contratista:** Empresa Unipersonal de Virgilio Sánchez Cáceres

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 98%

•**Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR

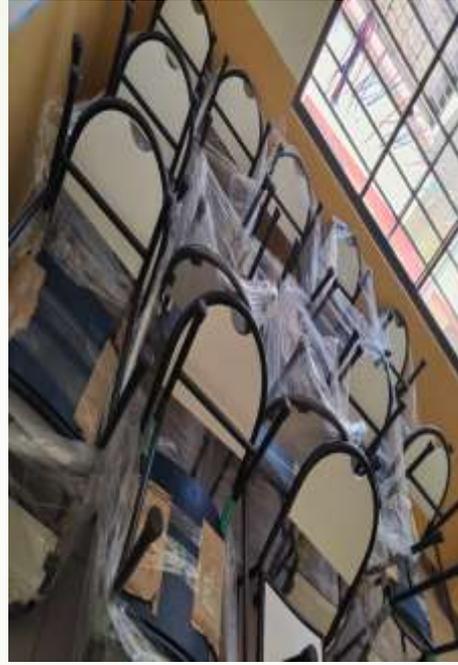

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
275.200,00 Bs.	275.200,00 Bs.	0,00 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** MUEBLES CLÍNICOS ZAMBRANA.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



EQUIPAMIENTO CEAS CATAVI



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
100,000 Bs.-	33.614,00,- Bs.-	66.386,00 Bs.-	34%

• **Empresa Contratista:** Empresa Unipersonal: **Virgilio Sánchez Cáceres**

• **Avance Físico:** 45%

• **Avance Financiero:** 34%

• **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



OLIMPIADAS CINÉTICAS ESTUDIANTILES

OBJETIVO



RESULTADO

- Olimpiadas Científicas Estudiantiles “Juegos florales”.
- 11° Olimpiada científica estudiantil plurinacional (Primera fase).
- Olimpiadas Científicas Estudiantiles-estudiantes que clasificaron a la segunda fase de las Olimpiadas Científicas.
- Olimpiadas Científicas Estudiantes-representación del distrito en el departamento de Potosí (Área robótica)

PROGRAMADO

110.000,00

EJECUTADO

42.640,00

SALDO

67.366,00.-

%

34%

•Avance Físico: 40 %

•Avance Financiero:34%

•destinado a: las olimpiadas científicas estudiantiles para los alumnos representantes de cada unidad educativa





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO



APOYO AL FUNCIONAMIENTO DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
40.000,00	27.050,00	12.949,15.-	68%

• **Empresa Contratista:** “ALMACENES HERRERA”

• **Avance Físico:** 75 %

• **Avance Financiero:** 68%

• **Destinado a:** Apoyo al funcionamiento de la Dirección Distrital de Educación

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



**"MANTENIMIENTO Y REFACCION UNIDADES EDUCATIVAS"
 (REFACCION UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO CATAVI)**

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
19.998,59 Bs.	0,00 Bs.	19.998,59 Bs.	0%

•**Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA & CONSULTORA INCODEPRO

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 0%

•**Observaciones:** FALTA COBRO DE PLANILLAS

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



CONSTRUCCIÓN BAÑO HIGIÉNICO U. E. MONSEÑOR CLETO LOAYZA

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
72.593,00 Bs	72,590,86 Bs.	2,14 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** Empresa Unipersonal "YACIK"
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN CENTRO INTEGRAL MULTISECTORIAL "SAN BENITO"

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
109.547,00 Bs	98.802,98 Bs.	10.744,02 Bs.	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ROEDAJ S. R. L.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN CENTRO INTEGRAL MULTISECTORIAL “SAN BENITO” (OBRAS COMPLEMENTARIAS)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
10.632,04 Bs	10.575,08 Bs.	56,96 Bs.	100%

•**Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA Y CONSULTORA “ARCECAFI” S.R.L.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 0%

•**Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS
(MEJORAMIENTO VENTANAS AULAS UNIDAD EDUCATIVA 1° DE MAYO B



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
29.000.00 Bs	28.989.32 Bs	10,68 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** ENOSUR.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS
(MEJORAMIENTO DE ACERA KINDER LITORAL)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7.494.65 Bs	7.494.65 Bs	0 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** YATO.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



**“MANTENIMIENTO Y REFACCION UNIDADES EDUCATIVAS”
 (REFACCION UNIDAD EDUCATIVA LIBERTAD SAKAMARKA)**

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
50.000,00 Bs.	45.233,18 Bs.	4.766,82 Bs.	100%

Empresa Contratista: CONST. YAPURA.

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

Observaciones: CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



REFACCIÓN CANCHA POLI FUNCIONAL ZONA 7

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
28.903,92Bs.-	28.903,65 Bs.-	Bs.-0,27	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA " ROLANDO CHAMBI QUISPE "
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION ENMALLADO
CAMPO DEPORTIVO JISKANQUI AYLLU CHULLPA



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
55.034,00 Bs	49.894,70 Bs	5.139,30 Bs	90,58%

- **Empresa:** PABLO TICONA JORGE
- **Avance Físico:** 90,58%
- **Avance Financiero:** 90,58%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“APOYO AL DEPORTE” (REFACCIÓN PISCINA 1° DE MAYO ZONA BALNEARIOS DISTRITO CATAVI)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
49.739,69 Bs.	46.257,91 Bs.	3.481,78 Bs.	93%

•**Empresa Contratista:** EMPRESA UNIPERSONAL “NESTOR OROPEZA CHIARA”

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 93%

•**Observaciones:** COBRO DE GARANTIA EN PROCESO



**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA**



**CONSTRUCCION ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS
MUNICIPIO DE LLALLAGUA (CONCLUSION)**



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7'048.953,59 Bs.-	7'048.953,59 Bs.-	0,00 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** EMPRESA CONSTRUCTORA ATRALID
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS
MUNICIPIO DE LLALLAGUA (CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2,089,983.38 Bs	1,999,954.38 Bs	90.029,00 Bs	95.7%

•**Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA - CONSULTORA L&S S.R.L.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:**95.7%

•**Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“APOYO AL DEPORTE” (ILUMINACIÓN COLISEO PAULINA MEDRANO DE SIGLO XX)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
59.789.91 Bs	59.789.91 Bs	0 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** ELECTRO POOL CONSTRUCTORA & CONSULTORA.
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO FALTA CIERRE



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



"APOYO AL DEPORTE" (MANTENIMIENTO Y REFACCION COLISEO PAULINA MEDRANO DE SIGLO XX)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

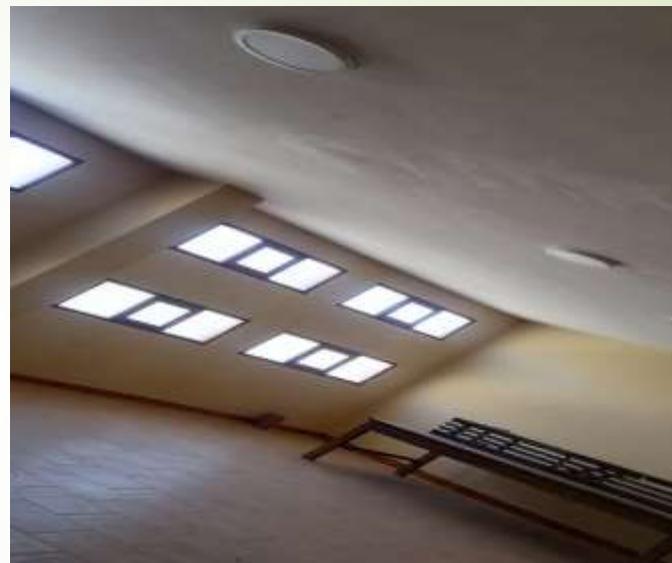


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
99.676,31 Bs.-	99.676,31 Bs.-	0.00 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** ELECTRO POOL
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CANCHA POLI FUNCIONAL ZONA 9

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
14.000,00 Bs.	14.000,00 Bs.	0 Bs	100%

- **Empresa Contratista:** CONSTRUCTORA YATO"
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO





PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO





DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO





PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER



ESFUERZO Y DESARROLLO

MUNICIPAL



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
 Potosí - Bolivia



SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (S.L.I.M.)



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00 Bs	216.415,90	33.523,10 Bs	86.59 %

Avance Financiero: 86.59 %
Presupuesto destinado a: pago de sueldos y salarios del personal, promoción, fortalecimiento y difusión de políticas contra la violencia en los 7 distritos.



Gobierno Autónomo Municipal
 De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



ACTIVIDADES REALIZADAS

- FERIA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LAS FIESTAS DE CARNAVALES.
- FORTALECIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO EN RAZÓN DE GENERO, REIVINDICANDO LOS DERECHOS IGUALITARIOS DE LAS MUJERES, EN HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER – 08 MARZO.
- SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS
- LA IMPORTANCIA DEL ROL MATERNO EN EL NÚCLEO FAMILIAR EN HOMENAJE AL DÍA DE LA MADRE 27 DE MAYO.
- ACCIONES DE PREVENION DE LA VIOLENCIA INTRA FAMILIAR EN FESTIVIDADES CULTURALES DE LA VIRGEN DE ASUNCION
- TALLER DE FORTALECIMIENTO EN LIDERAZGO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA
- ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL 18 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA, LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA 0117/2016
- ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL 11 DE OCTUBRE, DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA

ACTIVIDADES SLIM-LLALLAGUA



Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



ACTIVIDADES SLIM-LLALLAGUA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- PRONUNCIAMIENTO COLECTIVO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO CON ORGANIZACIONES SOCIALES EN HOMENAJE AL 25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LEY 348
- OPERATIVOS DE CONTROL CON APOYO DE LA POLICÍA BOLIVIANA
- TALLERES DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA
- ACTIVIDADES REALIZADAS CON CONVENIO UNFPA





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
Potosí - Bolivia



ATENCIÓN PERSONALIZADA

TIPOLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZ O	ABRIL	MAY O	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCTU.	NOV.	TOTAL
VIOLENCIA FÍSICA	1	4	6	2	4	1	0	4	0	2	2	
VIOLENCIA PSICOLÓGICA	11	12	15	5	10	10	12	1	11	8	17	
VIOLENCIA SEXUAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIOLENCIA ECONÓMICA	20	10	29	15	16	21	18	20	17	12	10	
FEMINICIDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	32	26	51	22	30	32	30	25	28	20	31	327





DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA





FUNCIONAMIENTO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
368.032,00 Bs.-	358.731,00 Bs.-	9.301,00 Bs.-	97%

- **Avance Financiero: 97 %**
- **Presupuesto destinado a:** pago de sueldos y salarios del personal, atención de casos en los que se involucre a niños, niñas y adolescentes



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DNAS GAM-LLALLAGUA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ACTIVIDAD CARNAVALERA CON PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.
- ACTIVIDADES DIA DEL NIÑO
- EJECUCION CAI DE PROTECCION VISION MUNDIAL .
- ACTIVIDADES POR EL DIA DE LA FAMILIA
- OPERATIVOS EN EXCURSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS
- GESTION DE APOYO SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA ENTORNOS SEGUROS CON SAVE THE CHILDREN .
- CAMPAÑA SOLIDARIA DE INVIERNO





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DNAS GAM-LLALLAGUA

- TALLERES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNIDADES EDUCATIVAS .
- CONTROL Y OPERATIVOS SORPRESA EN LOCALES Y CINE VIDEOS , ETC.
- CONTROL DE OPERATIVOS EL DIA DE 2 DE NOVIEMBRE TODOS SANTOS .
- INTERVENCIÓN DE CASOS EN TURNO
- PRESENTACIONE OBRAS DE TEATRO CON TEMATICA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DNAS GAM-LLALLAGUA

- CONTROL Y EMISIO DE PERMISOS DE VIAJE EN LA TERMINALD E BUSES
- SALIDAS DE DEFENSORIA MOVIL
- FERIA DE SOCIALIZACION DIA DE LA PREVENION DE VIOLENCIA SEXUAL .
- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PROGRAMA ENTORNOS SEGUROS
- CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD EN FAVOR DE MENOR ADOLESCENTE
- CONFORMACION DE COMITÉ DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
- TALLERES DE PREVENION DE VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS Y NIÑOS
- EMISIONDE MANILLAS IDENTIFICATIVAS EN FEISTA DE ASUNCION





CASOS ATENDIDOS DNAs- 2022



TIPOLOGIA	DNA CENTRAL	DNA 22 DE DIC.	DNA SAKAMARCA	DNA CATAVI	TOTAL
Asistencia familiar	93	74	35	30	232
Agresión sexual (abuso sexual, violación, estupro)	16	5	6	11	38
Violencia física y/o psicológica, etc.	22	31	17	20	90
Negligencia materna y paterna	28	28	23	40	119
Menores infractores y con problemas de conducta	32	50	40	21	143
Embarazos en adolescentes	10	1	6	7	24
Conflicto de visitas y guardas, tutelas	9	20	8	10	47
Acogimientos circunstanciales , definitivos y reinserciones	8	13	4	4	29
Adolescentes desaparecidos	6	3	15	5	29
Apoyo social	17	10	6	19	52
	241	235	160	167	803



GESTIÓN DE RIESGOS





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICO

Potosí - Bolivia



Gestión de Riesgos



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de reportes sobre diferentes eventos climáticos.
- Levantamiento de información sobre la afectación de eventos climáticos en distintos sembradíos.
- Indemnización a 1906 familias agricultores por el Instituto Nacional del Seguro Agrario de la Campaña Agrícolas 2020- 2021
- Desinfección dos veces a 44 unidades educativas del Municipio de Llallagua para prevenir del contagio Covid- 19
- Indemnización a 1547 familias agricultores por el Instituto Nacional del Seguro Agrario correspondiente a la Campaña Agrícolas 2021- 2022
- Mantenimiento y Limpieza de las boca tormentas



- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de Materiales y suministros



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICO
 Potosí - Bolivia



Gestión de Riesgos



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de perfiles de proyecto para adquisición de politubos, gaviones, herramientas, tanques de agua, etc.
- Elaboración carpeta para la ayuda humanitaria de Defensa Civil
- Entrega de alimentos de primera necesidad de Defensa Civil a 442 familias agricultores afectas por el evento climatológico de inundación en el Municipio de Llallagua
- Llenado del formulario Registro Agrícola comunal del Seguro Agrario en su modalidad "Minka" y seguro del trigo correspondiente a la campaña agrícola 2022- 2023.
- Elaboración informes para elevar a rango de ley de la resolución del COEM .
- Se ha realizado disinfecciones en los lugares de aglomeración de personas



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
150.000,00	90.125,98	63.886,02	58%

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de Materiales y suministros



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICO
 Potosí - Bolivia



**Adquisición de insumos de bioseguridad para todas las unidades educativas del municipio
 (alcohol al 70 % y amonio cuaternario)**

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA PROVEEDOR	WILSON GODOY - FAPROLIMPG
SUPERVISOR	ARMANDO TICONA JORGE
TIEMPO DE EJECUCIÓN	20 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	65 %
FECHA DE ENTREGA	15/03/2022



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00	163.791,00	86.209,00	65%

- Adquisición ejecutada físicamente al 100%**





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICO
 Potosí - Bolivia



Adquisición de insumos de bioseguridad para las unidades educativas del municipio
(alcohol al 70 %)



DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA PROVEEDOR	WILSON GODOY - FAPROLIMPG
SUPERVISOR	ARMANDO TICONA JORGE
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	99 %
FECHA DE ENTREGA	27/09/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00	240.269,72	2.290,28	99%



• Adquisición ejecutada físicamente al 100%





SERVICIO DE FAENADO DE GANADO



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



Funcionamiento Matadero Municipal



PROGRAMADO

250.000,00 Bs.-

EJECUTADO

Bs.-

SALDO

%

%

• **Avance Financiero:** 91,95%

• **Presupuesto destinado a:** Pago de Sueldos y Salarios Personal para la Unidad de camal municipal, material de escritorio, limpieza y aseo, combustible, etc.

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
Potosí - Bolivia



RECAUDACIONES DE CAMAL MUNICIPAL 2022

MATADERO MUNICIPAL 2022				
MES	RECAUDACION EN CAJA BS	RECAUDACION PARTICULAR BS	TOTAL RECAUDACION POR MES BS	CANTIDAD DE CABEZA FAENADO
ENERO	18.175	5.250	23.425	334
FEBRERO	17.304	5.810	23.114	331
MARZO	17.850	5.530	23.380	334
ABRIL	16.170	5.180	21.350	305
MAYO	17.850	4.270	22.120	316
JUNIO	16.769	4.410	21.179	301
JULIO	15.820	5.040	20.860	298
AGOSTO	18.550	3.640	22.190	316
SEPTIEMBRE	17.800	4.480	22.280	316
OCTUBRE	16.950	5.600	22.550	321
NOVIEMBRE	16.450	6.310	22.760	324
DICIEMBRE	17.716	4.576	22.292	318
TOTAL BS	207.404	60.096	267.500	3814



Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



“APOYO A LA MINERÍA”(ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC SDR 41 D=500MM L=6M PARA MITIGACIÓN DE AGUAS ÁCIDAS SECTOR PISCINA 1RO DE MAYO CATAVI

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
43.080,00 Bs.	43.080,00 Bs.	0,00 Bs.	100%

•**Empresa Contratista:** SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DISMAT S.R.L.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA



APOYO A LA MINERÍA(ADQUISICIÓN DE CALLAPOS)

IMAGEN DE EJECUCION



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

299.995,00 Bs.-

299.995,00 Bs.-

0.00 Bs.-

100%

- **Empresa Contratista:** MUEBLES ZAMBRANA
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



APOYO A LA MINERÍA (adquisición de cable trifásico sector cerro azul)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
89.100,00 Bs.-	89,100,00 Bs.-	0,00 Bs.-	100%

- **Empresa Contratista:** EDISON FERNANDO ALIAGA PORTUGAL
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 100%
- **Observaciones:** CONCLUIDO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARÍA MUNICIPAL TÉCNICA



APOYO A LA MINERÍA (ADQUISICIÓN DE CONDUCTOS DE COBRE DE MEDIA TENSIÓN 3X95 MM² 8,7/15 KV

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
198.950,00 Bs.-	198.950,00 Bs.-	0	100%

- **Empresa Contratista:** MERCANTIL LEÓN
- **Avance Físico:** 100%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** PLANILLA DE CANCELACIÓN EN TRAMITE

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



APOYO A LA MINERIA”(MANTENIMIENTO TRAMO CAMINERO SALVADORA - CANCAÑIRI)

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
99.651,95 Bs.	99.651,95 Bs.	0,00 Bs	100%

•**Empresa Contratista:** UNIPERSONAL CONSTRUCTORA YAPURA.

•**Avance Físico:** 100%

•**Avance Financiero:** 100%

•**Observaciones:** CONCLUIDO Y CERRADO

Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua
Secretaría Municipal Administración y Finanzas
 Potosí - Bolivia



Fortalecimiento a la Promoción y Desarrollo Económico Local

OBJETIVOS

Promover la Promoción Económica y Productiva del Municipio de Llallagua a través de políticas de fortalecimiento de la actividad productiva, apoyando a los diferentes emprendimientos a nivel productivo y consolidando a la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa (FERMyPE), contribuyendo de esta forma al crecimiento y desarrollo económico del municipio”.

RESULTADOS

1. Inauguración de la 1º feria productiva municipal y agropecuaria (frutícola y agrícola).
2. Inauguración feria productiva comercial Sakamarca (reactivación económica)
3. Curso taller de capacitación a los micro empresarios sobre las Leyes de aduana (importaciones y exportaciones).
4. Inauguración Feria Mensual, Ganadera, Agrícola y Artesanal en la comunidad Falaucani.
5. VI. Feria Municipal de camélidos en la comunidad Sihucani.
6. VII. Feria Departamental de camélidos Villazón 2022.
7. Taller de capacitación a las asociaciones de micro empresarios con los técnicos de la Secretaría Departamental de Industrialización (manipulación y transformación de alimentos.
8. Taller de capacitación a las asociaciones de micro empresarios con los técnicos de la Secretaría Departamental de industrialización.
9. Ferias Nacional de camélidos Chuquisaca 2022.
10. Taller de capacitación a los artesanos, en tejido a mano y maquina con los técnicos de Secretaría Industrialización.
11. Capacitación a la asociación de Modistas “Juana Azurduy” en la confección de trajes de gala.

PROGRAMADO

100.000,00

EJECUTADO

90,889

SALDO

9.112,12

%

81,78%

- Promoción de actividades productivas.
- Ferias productivas en el Municipio.
- Capacitaciones al sector productivo



Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inauguración de la 1ra Feria Productiva Agropecuaria Municipal.
- Inauguración de la feria comercial en el distrito Sakamarca.
- Curso taller de capacitación a FERMyPE sobre las leyes de aduana
- Inauguración de la Feria Mensual Ganadera ,
- Agrícola y Artesanal en la Comunidad Falaucani
- Inauguración de la Feria Multi - Sectorial Productiva
- Feria municipal de camélidos en la comunidad Sihuencani.
- Participación en la VII. feria departamental de camélidos Villazon 2022.





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD

Llallagua - Potosí - Bolivia



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Taller de capacitación con la Secretaria Departamental de Industrialización
- a los micro empresarios de municipio de Llallagua.
- Participación en la Feria Nacional de Camélidos Chuquisaca 2022
- Taller de Capacitación al rubro de artesanía y tejidos a mano con el apoyo
- de la Stria. Departamental de Industrialización
- Capacitación a la asociación de Modistas en traje de gala



Gobierno Autónomo Municipal
De Llallagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
Potosí - Bolivia



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
576,832,00	551,097,46	25,734,54	95%

- **Salario Personal de Servicio**
- **Material de Escritorio, Limpieza e Higiene**
- **Mantenimiento de Arbitrios Municipales**



RECAUDACIÓN TERMINAL DE BUSES

MESES	RECAUDACIÓN
ENERO	34.000,00
FEBRERO	48.600,00
MARZO	56.600,00
ABRIL	38.500,00
MAYO	77.600,00
JUNIO	58.000,00
JULIO	68.500,00
AGOSTO	58.800,00
SEPTIEMBRE	50.200,00
OCTUBRE	55.900,00
NOVIEMBRE	53.200,00
DICIEMBRE	
TOTAL	59.9900






GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



FUNCIONAMIENTO BALNEARIOS CATAVI

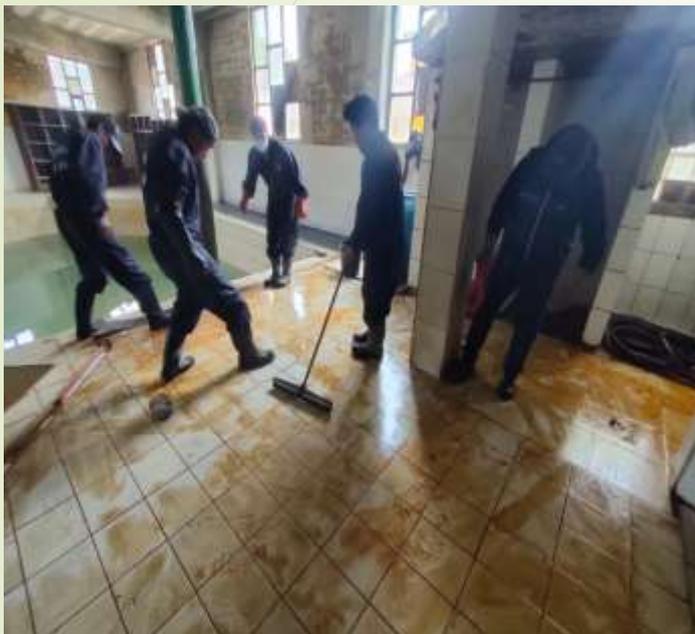

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
650.000,00	641.095,00	8.905,00	89,63

•**Presupuesto destinado:** Pago de sueldos y salarios, adquisición de material de escritorio y limpieza, herramientas y demás insumos para la refacción de los ambientes.

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



Mantenimiento Balnearios Catavi

1



2



3



4



5



6



ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Limpieza bimestral de la red de tuberías de agua caliente.
2. Limpieza y des-taponamiento de cámaras y conductos de desagüe de aguas servidas.
3. Instalación de tanques de almacenamiento de agua tibia destinada a duchas en los ambientes de baño mixto, mujeres declive y los familiares turco-técnico.
4. Limpieza y mantenimiento mensual de los canales conductores de agua caliente destinada a las piscinas de todos los ambientes en general.
5. Refacción y colocado de cerámica en ambientes deteriorados.
6. Cursos de capacitación realizadas al personal sobre relaciones humanas y laborales en coordinación con RECURSOS



AS TERMALES CATAVI G.A.M.LL.

POTOSI - BOLIVIA



RECAUDACIÓN BALNEARIOS CATAVI



RECAUDACION Balnearios catavi (Expresado en Bolivianos)		
N°	<u>MESES</u>	<u>MONTO EN Bs.</u>
1	ENERO	72.807
2	FEBRERO	77.166
3	MARZO	85.157
4	ABRIL	89.004
5	MAYO	88.536
6	JUNIO	94.214
7	JULIO	112.322
8	AGOSTO	92.084
9	SEPTIEMBRE	95.666
10	OCTUBRE	96.400
11	NOVIEMBRE	94.800
12	DICIEMBRE	
TOTAL		1.022.456,00

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua





Equipamiento y fortalecimiento Sub Alcaldía 22 de diciembre



- Adquisición de mezcladora y vibradora
- Adquisición de Material de Escritorio
- Adquisición de Impresora

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
5.659,00	4.694,70	964,30	62%

• **Avance Físico:** 100%

• **Avance Financiero:** 62%

• **Observaciones:** Falta cancelación por la prov. de impresora



GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN AREAS EN AREAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA



shutterstock.com - 1942321573

Y DESARROLLO

IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
18.655.824,00 Bs.-	0,00 Bs.-	18.655.824,00 Bs.-	0%

- **ENTIDAD FINANCIERA:** ministerio de medio ambiente y agua MMAyA
- **Avance Físico:** 0%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** PARA FIRMA DE CONVENIO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAMEDIA RIO VERDE



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
5.500.000,00 Bs.-	0,00 Bs.-	5.500.000,00 Bs.-	0%

- **ENTIDAD FINANCIERA:** ministerio de medio ambiente y agua MMAyA
- **Avance Físico:** 0%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** PARA FIRMA DE CONVENIO

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA**



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCION ENLOSETADO DE CALLES DISTRITO 22 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE LLALLAGUA

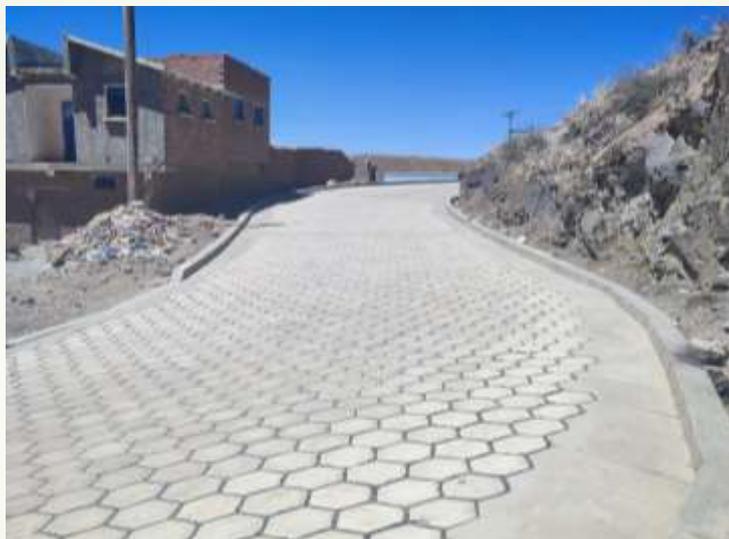


IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2.811.207,57 Bs.-	0,00 Bs.-	2.811.207,57 Bs.-	0%

• **ENTIDAD FINANCIERA:** BOL-34 (PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA PARA LA GENERACION DE EMPLEO)

• **Avance Físico:** 0%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** CON CONVENIO PARA EJECUCIÓN

Gobierno Autónomo Municipal
De Llalagua



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO URB. GOLF.

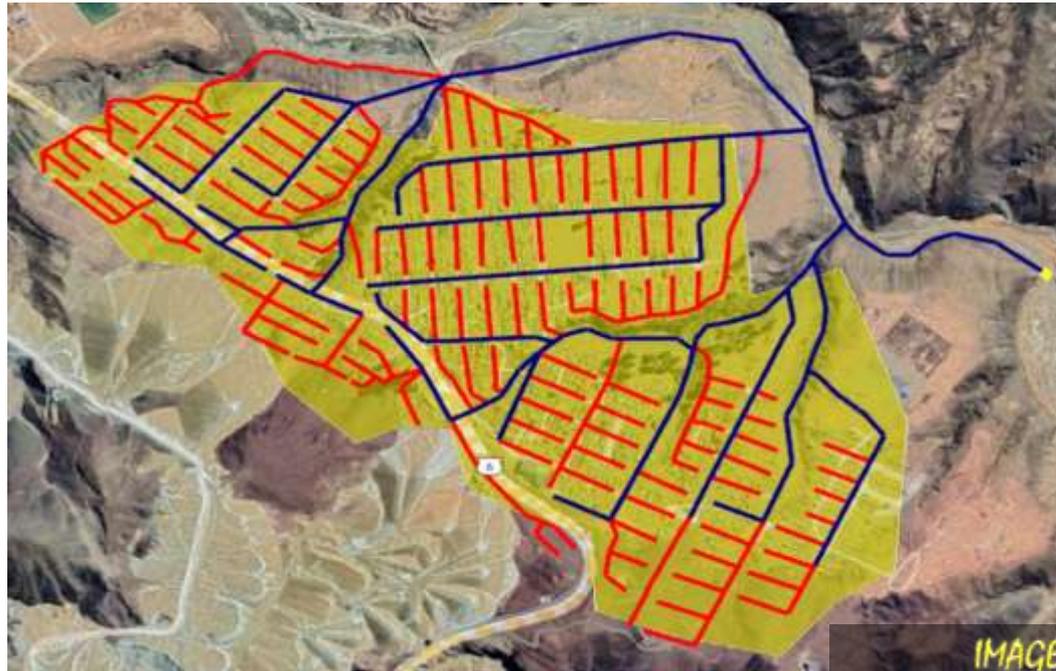


IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.300.000,29 Bs.-	0,00 Bs.-	4.300.000,00 Bs.-	0%

- **ENTIDAD FINANCIERA:** ministerio de medio ambiente y agua MMAyA
- **Avance Físico:** 0%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** PARA FIRMA DE CONVENIO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA JAIME MENDOZA LLALLAGUA



IMAGEN ACTUAL



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
8.642.474,60 Bs.-	0,00 Bs.-	8.642.474,60 Bs.-	0%

• **ENTIDAD FINANCIERA:** unidad de proyectos especiales "UPRE"

• **Avance Físico:** 0%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** CONVENIO FIRMADO PARA INICIO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCION BLOQUE DE AULAS U.E. SIGLO XX AMERICA



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.500.000,00 Bs.-	0,00 Bs.-	4.500.000,00 Bs.-	0%

• **ENTIDAD FINANCIERA:** unidad de proyectos especiales "UPRE"

• **Avance Físico:** 0%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** PARA FIRMA DE CONVENIO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA




GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



VIVIENDA CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE LLALLAGUA - FASE (XII) 2022 - POTOSI

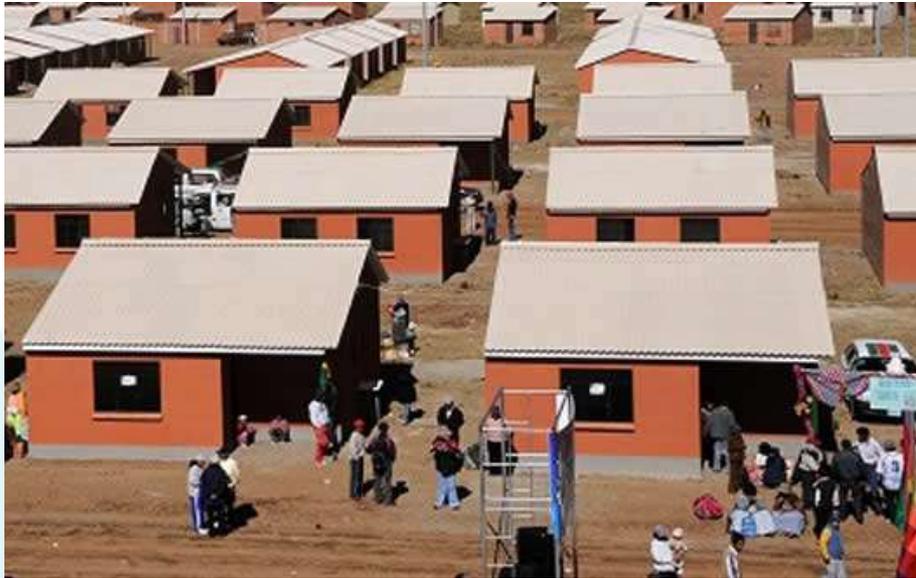

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2.490.405,15 Bs.-	0,00 Bs.-	2.490.405,15 Bs.-	0%

- **ENTIDAD FINANCIERA:** AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA (AEVIVIENDA)
- **Avance Físico:** 0%
- **Avance Financiero:** 0%
- **Observaciones:** CON CONVENIO PARA EJECUCIÓN

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA



CONSTRUCCIÓN BALNEARIO TURÍSTICO AGUAS TERMALES CATAVI MUNICIPIO DE LLALLAGUA



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
3.687.833,47 Bs.-	0,00 Bs.-	3.687.833,47 Bs.-	0%

• **ENTIDAD FINANCIERA:** FOCIP (FONDO CONCURSABLE DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA) – FPS

• **Avance Físico:** 0%

• **Avance Financiero:** 0%

• **Observaciones:** CON CONVENIO PARA EJECUCIÓN

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LLALLAGUA**
