I ca READIGA PÚBUCA DE CUEATAS



2021



Adalid Jorge Aguilar

ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLA LLAGUA


POTOSI - BOLIVIA

La Presente Rendición Pública de Cuentas Contiene toda la información del 1er Semestre de Actividades de la gestión 2021, concerniente a la Administración del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. En función de una planificación estratégica que nos permitió:

Formular la Programación Operaciones Anual (POA) de la gestión 2021 y la programación presupuestaria.

Determinar los Recursos Municipales en función de Objetivos Institucionales, de Objetivos de Gestión, de los objetivos que persigue el desarrollo de nuestro Municipio.



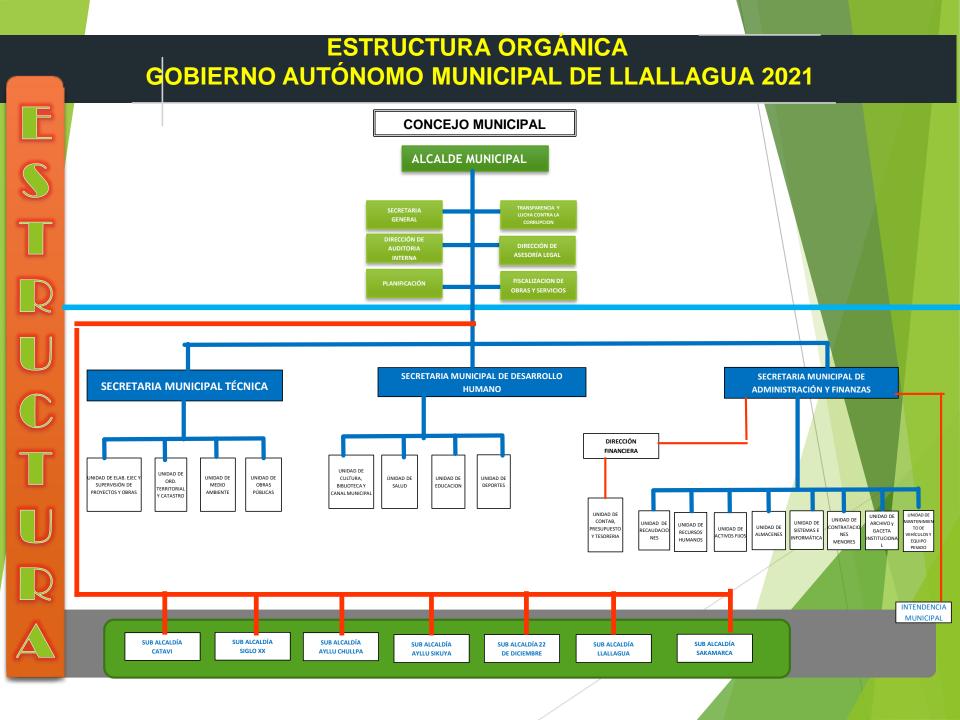

POTOSI - BOLIVIA

De acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ley N° 482 del 9 de enero del 2014 donde los Gobiernos Autónomos Municipales están constituidos por:

a Concejo Municipal,.

b Órgano Ejecutivo.

El presupuesto Municipal se elaborara bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, y está, conformado por el presupuesto del Órgano Ejecutivo y el presupuesto del Concejo Municipal.

A R

C

G

Artículo 24. (Estructura organizativa) según la ley 482 el órgano ejecutivo estará conformado por:

La alcaldesa o el alcalde municipal.

Las Secretarías Municipales.

Sub Alcaldías.

Artículo 26. Parágrafo 20.- Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto.



POTOSI - BOLIVIA

TRANSFORMAR LLALLAGUA:

Se está transformando y consolidado en una ciudad intermedia, de oportunidades con infraestructura urbana y rural de vanguardia, con mayores niveles de acceso a:

- a servicios básicos
 - Mejorar la Educación



Con avances cualitativos de desarrollo humano.



POTOSI - BOLIVIA

GENERAL:

Impulsar el desarrollo Integral, sustentable de Transformación del Municipio de Llallagua Trabajando en la mejora siempre de la Educación, Salud, Servicios Básicos, Infraestructura, Seguridad Ciudadana y otros, tanto en el área urbana y el área rural del Municipio.

ESTRATEGICOS:

- Ejecutar El Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo
- Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura Urbana y Rural
- ^c Priorizar la Transparencia como paradigma

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAG<mark>UA</mark>

PO I OSI - BOLIVIA

RECURSOS POA 2021





POTOSI - BOLIVIA

1.- ASIGNADOS 2021 M.E.F.P. Y REGALIAS

Cuadro Nº 1

| N° | FUENTE | PROGRAMADO | PERCIBIDO | DIFERENCIA |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Coparticipación Tributaria | 24.438.361,00 Bs | 17.870.608,00 Bs | -6.567.753,00 Bs |
| 2 | Recursos IDH | 11.523.775,00 | 5.387.428,00 | -6.136.347,00 |
| 3 | Recursos Regalías Mineras | 550.000,00 | 355.909,00 | -194.091,00 |
| 4 | Por subvenciones Personas con discapacidad | 43.853,00 | 21.927,00 | -21.927,00 |
| | TOTAL | 36.555.989,00 Bs | 23.635.872,00 Bs | -6.352.365,00 Bs |

2.- RECURSOS PROPIOS 2021

Cuadro N° 2

| N° | FUENTE | PROGRAMADO | PERCIBIDO | DIFERENCIA |
|----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | Recursos Propios | 8.000.000,00 Bs | 3.901.038,00 Bs | -4.098.962,00 Bs |
| | TOTAL | 8.000.000,00 Bs | 3.901.038,00 Bs | -4.098.962,00 Bs |





POTOSI - BOLIVIA

3.- SALDOS 2021

Cuadro Nº 3

| N ° | FUENTE | PROGRAMADO | PERCIBIDO | DIFERENCIA |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | Saldos Caja Bancos 2020 | 23.033.560,00 Bs | 23.033.560,00 Bs | 0,00 |
| | TOTAL 2 | 23.033.560,00 Bs | 23.033.560,00 Bs | 0,00 |

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro Nº 4

| Nº | FUENTE | PROGRAMADO | PERCIBIDO | DIFERENCIA |
|----|--|------------------|-----------------|---------------|
| 0 | Otras fuentes UPRE, MIN DE MEDIO AMBIENTE, FDI, FNDR | 16.427.892,00 Bs | 7.254.501,00 Bs | -9.173.391,00 |
| | TOTAL 2 | 16.427.892,00 Bs | 7.254.501,00 Bs | -9.173.391,00 |









POTOSI - BOLIVIA

TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION 2021

Cuadro Nº 5

| N° | FUENTE | PROGRAMADO | PERCIBIDO |
|----|---|------------------|------------------|
| 1 | Recursos Asignados 2021 | 36.555.989,00 Bs | 23.635.872,00 Bs |
| 3 | Recursos propios | 8.000.000,00 Bs | 3.901.038,00 Bs |
| 3 | Saldos Caja Bancos 2021 | 23.033.560,00 Bs | 23.033.560,00 Bs |
| 4 | Recursos de Contra Parte (Transferidos) | 16.427.892,00 Bs | 7.254.501,00 Bs |
| | TOTAL DE RECURSOS | 84.017.441,00 Bs | 57.824.970,00 Bs |



TOTAL PROGRAMADO POA 2021

84.017.441,00 Bs



G R A C

- 1 GASTOS RECURRENTES OBLIGATORIOS POR LEY
- GASTOS RECURRENTES POR COMPETENCIAS MUNICIPAL
- **3** GASTOS PARA CONVENIOS
- 4 GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO
- GASTOS PARA INVERSION (Disponible para Formular)



POTOSI - BOLIVIA

DESGLOSE DE GASTO POR PARTIDA

a) Programas e Inversión

Cuadro Nº 6

| N° | DETALLE PARTIDA DE INVERSION | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | SALDO | % |
|----|--|---------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 1 | PROM. Y FOMENTO A LA PROD. AGROPECUARIA | 2.255.132 | 2.046.274 | 208.858 | 91 |
| 2 | SANEAMIENTO BASICO | 947.319 | 593.863 | 353.456 | 63 |
| 3 | CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS | 290.000 | | 290.000 | 0 |
| 4 | DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | 400.000 | 246.869 | 153.131 | 62 |
| | ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS | 1.020.000 | 537.247 | 482.753 | 53 |
| 6 | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 385.073 | 76.857 | 308.216 | 20 |
| 7 | INFRAESTUCTURA URBANA Y RURAL | 6.595.393 | 1.828.916 | 4.766.477 | 28 |
| 8 | GESTION DE CAMINOS VECINALES | 1.397.850 | 1.290.403 | 107.447 | 92 |
| 9 | SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL | 300.000 | 282.611 | 17.389 | 94 |
| 10 | GESTION DE SALUD (2) | 18.350.048 | 9.235.269 | 9.114.779 | 50 |



POTOSI - BOLIVIA

| N° | DETALLE PARTIDA DE INVERSION | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | SALDO | % |
|----|---|---------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 11 | GESTION DE EDUCACION | 17.280.382 | 11.335.752 | 5.944.630 | 66 |
| 12 | DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE | 12.076.404 | 3.657.598 | 8.418.806 | 30 |
| | PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO | 150.000 | 74.830 | 75.170 | 50 |
| 14 | DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO | 100.000 | 26.200 | 73.800 | 26 |
| | PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER | 5.045.247 | 1.788.477 | 3.256.770 | 35 |
| | DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3) | 320.378 | 207.216 | 113.162 | 65 |
| 17 | SERVICIO DE FAENADO DE GANADO | 250.000 | 166.902 | 83.098 | 67 |
| 18 | GESTION DE RIESGOS | 125.000 | 92.366 | 32.634 | 74 |
| 18 | RECURSOS HIDRICOS | 382.049 | · | 382.049 | 0 |
| 19 | SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | 517.288 | 218.439 | 298.849 | 42 |
| 20 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5.874.884 | 1.930.675 | 3.944.209 | 33 |
| | | | | | |

TOTAL 84.017.442 41.280.312 42.737.127 49%



POTOSI - BOLIVIA

B) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MPAL.

Cuadro N° 7

| N° | DETALLE | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | SALDO |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 1.060.278 | 546.714 | 513.564 |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 39.143 | 36.056 | 3.087 |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 59.357 | 56.377 | 2.980 |
| | SUB TOTAL | 1.158.778 | 639.147 | 519.631 |



55%



POTOSI - BOLIVIA

C) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuadro Nº 8

| Nº | DETALLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|----|-----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 5.910.171 | 4.211.627 | 1.698.544 |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 335.822 | 157.732 | 178.090 |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 701.818 | 430.711 | 271.107 |
| 4 | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 3.000 | 312 | 2.689 |
| 5 | OTROS GASTOS | | 120.342 | -120.342 |
| | SUB TOTAL | 6.950.812 | 4.920.723 | 2.030.088 |





71%

TOTAL DE EJECUCIO

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO

Cuadro Nº 9

| | | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO | % |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| No | DETALLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | | % |
| 3 | GASTOS DE INVERSION | 84.017.442 | 41.280.312 | 42.737.127 | 49 |
| 1 | GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL | 1.158.778 | 639.147 | 519.631 | 71 |
| 2 | GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL | 6.950.812 | 4.920.723 | 2.030.088 | 55 |
| | TOTAL | 8.109.590 | 5.559.870 | 2.549.719 | 69 |





69%



C | O |


RESUMEN TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION

| N⁰ | MODALIDAD | CUANTIA | TIPO DE CONTRATACION | CANTIDAD |
|----|--|---|---|-------------------|
| 1 | CONTRATACION MENOR | De Bs 1 (UN 00/100 B QLI VI AN Q) hast a Bs 50.000(C NCUENT A MIL 00/100 BOLIVIANOS | OBRAS ADQUISICIONES | 20 7 7 0 |
| 2 | APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEC (ANPE) | Mayar a Bs 50.000(00/100 | CONSULTORIAS | 6 19 1 2 |
| 3 | LICITACION PUBLICA (LP) | Mayar a Bs 1.000.000 | OBRAS ADQUISICIONES CONSULTORIAS SERVICIOS GENER. | 1 1 0 0 |
| 4 | CONTRATACION POR EXCEPCION | SIN LIMITE DE MONTO | OBRAS ADQUISICIONES CONSULTORIAS SERVICIOS GENER. | 0 1 0 0 |
| 5 | CONTRATACION DIRECTA | SIN LIMITE DE MONTO | OBRAS ADQUISICIONES CONSULTORIAS SERVICIOS GENER. | 1 12 0 0 |
| | | TOTAL | | 78 |



POTOSI - BOLIVIA

EJECUCION FISICA VS FINANCIERA

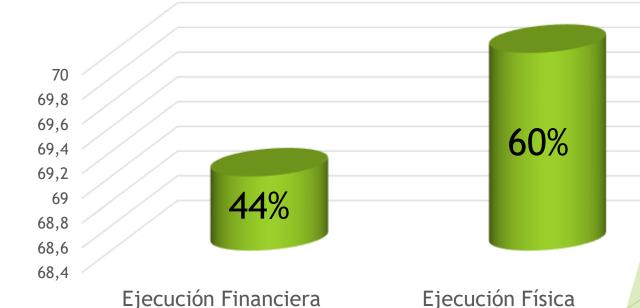

POTOSI - BOLIVIA



..!TRABAJANDO POR UNA CIUDAD DE VERDAD DEL NORTE POTOSI!..



POTOSI - BOLIVIA

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA





Potosí - Bolivia



Convenio SENASAG



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|------|
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100% |

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de equipos
- En proceso de ejecución financiera

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Coordinación con el Encargado de SENASAG-Potosí para la capacitación en Sanidad Animal a los promotores de los Ayllus Chullpa y Sikuya.
- Registro de Ferias Ganaderas que se desarrollan en el municipio de Llallagua.
- Coordinación con el SENASAG Departamental Potosí, cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en cuanto a Registro y Certificación Zoosanitaria.
- Coordinación con el SENASAG Departamental Potosí, en el control e inspección de productos y subproductos pecuarios en los puestos de ventas establecidas en el Municipio de Llallagua que no cuenten con el debido registro sanitario.

Reportes epidemiológicos del municipio de Llallagua (gastroenteritis, parásitos externos, otitis, conjuntivitis, oestrus ovis, traumatismo y otros).



Potosí - Bolivia



Construcción de Invernaderos Tipo Tunel



| EMPRESA CONTRATISTA | - |
|---------------------|--------|
| SUPERVISOR | - |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 90 D/C |
| AVANCE FISICO | 0% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | - |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|------------|
| 913.748,00 | - | 913.748,00 |

• Se encuentra en proceso de inscripción de recursos en la entidad financiadora para su posterior licitación





POTOSI - BOLIVIA





Potosí - Bolivia



Ampliación Sistema de Microriego en el Cabildo Qollana Ayllu <mark>Sikuya</mark>



| 44 . 4 | The second of | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 5 3 A B | 773 F S 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| B B - 7 - 2 - 4 - 4 | GEN | ACT | H-722 |
| | 1000 0000 | | E. Carrier and Applications |
| | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | | |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|-----------|--------------|
| 1.708.768,38 | 0,00 | 1.708.768,38 |

 Proyecto financiando por FPS, actualmente en ejecución

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | ATRALID |
|---------------------|-----------------------|
| SUPERVISOR | ING. VEIMAR CASTRO |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 240 D/C |
| AVANCE FISICO | 17% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL TÉCNICA Potosí - Bolivia



Ampliación Sistema de Microriego Purcilamayu Ayllu Sikuya



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|-----------|--------------|
| 2.058.517,38 | 0,00 | 2.058.517,38 |

FPS, **Proyecto** financiado por actualmente en ejecución.

| EMPRESA CONTRATISTA | SERVIC S.R.L. |
|---------------------|-----------------------|
| SUPERVISOR | ING. VEIMAR CASTRO |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 240 D/C |
| AVANCE FÍSICO | 24% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |





POTOSI - BOLIVIA





Potosí - Bolivia



Unidad de Medio Ambiente



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|-----|
| 400.000,00 | 273.785,82 | 126.214,18 | 68% |

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de equipos, materiales y suministros.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Campañas de limpieza (Cementerio General de Llallagua, Sector Final Rio Seco, sector campamento Villarroel, Av. Cívica Zona 10)
- Elaboración y gestión para la promulgación de leyes municipales a favor del Medio Ambiente y CONVENIOS MUNICIPALES.
- Fiscalización de los proyectos productivos.
- Supervisión de los proyectos productivos.
- Supervisión de las fichas ambientales.
- Coordinación de actividades con el encargado/a de áreas verdes, Gestión de riesgos, zoonosis, SENASAG- POTOSI.



POTOSI - BOLIVIA

SANEAMIENTO BASICO





Potosí - Bolivia



Mejoramiento Sistema de Agua Potable Piacala Ayllu Chullpa



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 29.957,81 | 0,00 | 29.957,80 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA DELMIT |
|---------------------|------------------------|
| SUPERVISOR | DAVID PEREZ M. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 06/07/2021 |





30/06/2021

Potosí - Bolivia

Adquisición de tuberías HDPE + accesorios para sistema de agua potable Jachojo



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 32.353,00 | 0,00 | 32.353,00 |

 Adquisición ejecutada físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | PLASTIFORT S.R.L. |
|---------------------|-------------------|
| SUPERVISOR | DAVID PEREZ M. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 7 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| | |

FECHA DE ENTREGA





Potosí - Bolivia



Mejoramiento Sistema de Agua Potable Katiri Ayllu Chullpa





IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 26.927,14 | 0,00 | 26.927,14 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA F.C.J. |
|---------------------|---------------------|
| SUPERVISOR | DAVID PEREZ M. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 07/07/2021 |





Potosí - Bolivia



Construcción Sistema de Agua Potable Chilliguani Ayllu Chullpa



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 26.927,14 | 0,00 | 26.927,14 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA F.C.J. |
|---------------------|------------------------|
| SUPERVISOR | DAVID PEREZ M. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 07/07/2021 |





POTOSI - BOLIVIA





Potosí - Bolivia



Gastos de Funcionamiento Dirección de Aseo Urbano



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|------------|------------|-----|
| 1.020.000,00 | 460.849,25 | 559.150,75 | 45% |

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de equipos, materiales y suministros.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza de sectores públicos.
- Recolección y transporte de residuos.
- Disposición final de Residuos.
- Aprovechamiento de Material Reciclable
- Manejo de Residuos Bioinfecciosos.
- Campañas de Limpieza, en los diferentes distritos.
- Erradicación de Micro basurales.
- Seguimiento de Proyectos.



TO Y DESAURA

Potosí - Bolivia

Gastos de Funcionamiento Dirección de Aseo Urbano

Venta de material reciclado en el Semestre

| MATERIAL | SUB TOTAL KG | PRECIO | TOTALES (Bs) |
|---------------|-----------------|--------|--------------|
| ALUM. DURO | 187.50 | 5 | 937.50 |
| ALUM. TAQUIÑA | 1419.18 | 4 | 5676.72 |
| PLASTICOS | 7510.37 | 1.3 | 9763.48 |
| NYLON | 2364.20 | 1.5 | 3546.30 |
| PAPEL | 2306.00 | 1 | 2306.00 |
| BOTELLA PET | 13798.00 | 0.4 | 5519.20 |
| V. BLANCO | 81.50 | 3 | 326.00 |
| V. CAFÉ | 18.71 | 2 | 37.42 |
| V. VERDE | 46.08 | 1 | 46.08 |
| COBRE | 20.00 | 25 | 500.00 |
| TOTAL KG | 29.360,75 | | 28.658,70 |
| | | | |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO





SEON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Potosí - Bolivia

Adquisición de Material Eléctrico y Luminarias para Alumbrado Publico



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-------|
| 43.905,00 | 43.905,00 | 0,00 |

 Adquisición ejecutada físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | ELIZABETH SANDRA CRUZ TUMIRI |
|---------------------|---------------------------------|
| SUPERVISOR | REYNALDO MEDRANO IBAÑEZ |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 5 D/C |
| AVANCE FISICO | 100 % |
| AVANCE FINANCIERO | 100 % |
| FECHA DE ENTREGA | 05/07/2021 |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

DE ESTANDAMENTO E 4 PIT

POTOSI - BOLIVIA

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL





Potosí - Bolivia



Mantenimiento de Calles: Construcción de Aceras Calle David Choque Victoria



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 19.981,31 | 0,00 | 19.981,31 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| DATOS DEL PROYECTO | | |
|---------------------|----------------------|--|
| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA YATO | |
| SUPERVISOR | SILVIA LOPEZ S. | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 13 D/C | |
| AVANCE FISICO | 100% | |
| AVANCE FINANCIERO | 0% | |
| FFCHA DE ENTREGA | 22/03/2021 | |





Potosí - Bolivia



Const. Pavimento rígido Av. David Choque Zona 4 y 6



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|------------|
| 215.998,98 | 0,00 | 215.998,98 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CA-DUCH CONSULTORES ASOCIADOS |
|---------------------|-------------------------------------|
| SUPERVISOR | SILVIA LOPEZ S. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 70 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 09/10/2021 |





Potosí - Bolivia

Const. Pavimento Rígido Calle Final Omiste



| DATOS DEL PROYECTO | | |
|---------------------|------------------------------|--|
| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA ELECTRO-POOL | |
| SUPERVISOR | SILVIA LOPEZ S. | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 78 D/C | |
| AVANCE FISICO | 100% | |
| AVANCE FINANCIERO | 100% | |
| FECHA DE ENTREGA | 29/01/2021 | |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|------------|-------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Proyecto ejecutado física y financieramente al 100%





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL TÉCNICA Potosí - Bolivia

NAME OF THE PERSON OF THE PERS

Const. Pavimento Rígido Calle Final Oblitas Zona 9



| 11 1/19 CIV/10 14/10 | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
| 99.895,20 | 0,00 | 99.895,20 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA NEW ONE S.R.L. |
|---------------------|--------------------------------|
| SUPERVISOR | SILVIA LOPEZ S. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 36 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 28/05/2021 |





Potosí - Bolivia



Const. Pavimento rígido prolongación calle 9 de Abril

REDMINOTE B AT GUAD GAMERA IMÁGEN ACTUAL

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|------------|
| 200.320,19 | 0,00 | 200.320,19 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CA-DUCH CONSULTORES ASOCIADOS |
|---------------------|-------------------------------------|
| SUPERVISOR | SILVIA LOPEZ S. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 70 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 15/03/2021 |





Potosí - Bolivia



Const. Piso Carpeta calle Martin Cárdenas Zona 8 Distrito 22 de Diciembre



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|----------|
| 76.145,69 | 66.823,57 | 9.322,00 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA CANLIC |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | Mario Caisina Quispe |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 44 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 94,36% |
| FECHA DE ENTREGA | 15/03/2021 |





Potosí - Bolivia



Refacción Casa Comunal Chorolque Camp. #2-B Siglo XX



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-------|
| 44.400,00 | 44.400,00 | 0,00 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA MONTAÑO |
|---------------------|----------------------------|
| SUPERVISOR | REYNALDO MEDRANO IBAÑEZ |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 100% |
| FECHA DE ENTREGA | 09/07/2021 |



Potosí - Bolivia



Const. de Barandas en la Parte Superior del Campamento 6 tipo-H



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-------|
| 19.993,74 | 19.993,74 | 0,00 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | HILARION PACARA JORGE |
|---------------------|----------------------------|
| SUPERVISOR | REYNALDO MEDRANO IBAÑEZ |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 100% |
| FECHA DE ENTREGA | 22/07/2021 |



Potosí - Bolivia



Construcción complemento del pavimento calle Ingenieros Camp. #6 Tipo H



| EMPRESA CONTRATISTA | HILARION PACARA JORGE |
|---------------------|----------------------------|
| SUPERVISOR | REYNALDO MEDRANO IBAÑEZ |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 100% |
| FECHA DE ENTREGA | 24/06/2021 |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-------|
| 19.670,80 | 19.670,80 | 0,00 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%





Potosí - Bolivia



Const. Enlosetado calle Tarija Zona 10 distrito 22 de Diciembre



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|------------|-------|
| 119.999,29 | 119.999,29 | 0,00 |

Proyecto ejecutado físicamente y financieramente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA TOMKAT |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | Mario Caisina Quispe |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 55 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 100% |
| FECHA DE ENTREGA | 17/06/2021 |





Potosí - Bolivia



Const. Pavimento Rígido Calle Nº5 Zona Residencial Catavi



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|------------|----------|
| 198 953 58 | 185 026 83 | 13 926 7 |

Proyecto ejecutado físicamente y financieramente al 100%

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA TOMKAT |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | Guido García Condori |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 35 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 95 % |
| FECHA DE ENTREGA | 08/06/2021 |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES





Potosí - Bolivia



Construcción Puente Vehicular Rio Ventilla Ayllu Chulpa



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|------------|--------------|
| 1.780.137,35 | 712.054,94 | 1.068.082,41 |

- Proyecto ejecutado físicamente al 100%
- La solicitud de desembolso esta en curso en FDI La Paz

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA RAM-C |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | EMILIANO FLORES LOBA |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 230 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 40% |
| FECHA DE ENTREGA | 9/10/2021 |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

OF COMMISSION FAMIL

POTOSI - BOLIVIA

SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL






GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO Potosí - Bolivia




Unidad de Ordenamiento Territorial (U.N.O.T)

| terora | 4.77 | | -1 |
|---|-------------|-------------|-----|
| DETALLE O TIPOLOGIA DE LOS CASOS ATENDIDOS (ENE- JUL) | ENE- ABR | MAY- JUL | |
| Revisión, inspección y aprobación de planos | 194 | 294 | |
| Autorizaciones de Construcción | 24 | 31 | |
| Trabajo de evaluación de carpetas (minutación) por el equipo multidisciplinario | 64 | 33 | NO. |

ACTIVIDADES REALIZADAS POR UNOT



- 1 Responsable de UNOT
- **Notificadores**
- Secretaria
- **Asesor Legal**

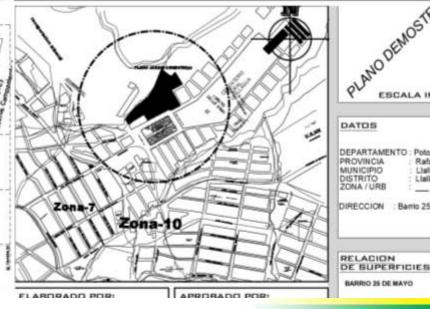





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL DE DESARROLLO HUMANO Potosí - Bolivia



Unidad de Ordenamiento Territorial (UN.O.T)



- Asesor Legal
- Arquitecto
- Trabajador Social
- Notificador



OTRAS TAREAS O ACTIVIDADES A CARGO DE UN.O.T.

Homologación del Radio Urbano

Regularización de barrios y/o urbanizaciones

Plano Director Distrito Siglo XX

Plano Director Distrito Catavi Inspecciones y Aprobación de Planos



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE SALUD





TO YORK MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

Potosí - Bolivia

Apoyo funcionamiento de Salud

| Νº | 1 er NIVEL PERSONAL CLINICO | CANTIDAD |
|----|--------------------------------|----------|
| 1 | Lic. En enfermeria | 15 |
| 2 | Medico General | 2 |
| 3 | Farmaceutico | 2 |
| 4 | medico cirujano | 1 |
| 5 | Odontologo | 1 |
| 6 | Auxiliar de Enfermeria | 4 |
| | TOTAL | 25 |



| | 1 er NIVEL PERSONAL | |
|---------|---|---------------|
| Νº | ADMINISTRATIVO | CANTIDAD |
| 1 | secretaria red de salud | 1 |
| 2 | Estadistico | 2 |
| | TOTAL | 3 |
| | | |
| | | |
| | 1 er NIVEL PERSONAL DE | |
| Nο | 1 er NIVEL PERSONAL DE SERVICIO | CANTIDAD |
| Nº 1 | | CANTIDAD 2 |
| | SERVICIO | |
| 1 | SERVICIO portero | 2 |
| 1 2 | SERVICIO portero Chofer de ambulancia | 2 |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|--------------|--------------|-----|
| 5.282.330,74 | 3.491.436,93 | 1.793.893,81 | 66% |

- Cancelación de Servicios Básicos.
- Sueldos del personal eventual de salud PRIMER NIVEL entre personal Administrativo,
 Clínico y de servicio se tienen 35 personas contratadas.



Potosí - Bolivia



Apoyo funcionamiento de Salud

| Nº | 2° NIVEL H.G.M.O PERSONAL ADMINISTRATIVO | CANTIDAD |
|----|---|----------|
| 1 | Trabajadora Social | 1 |
| 2 | Secretaria laboratorio | 1 |
| 3 | Secretaria Hospital | 1 |
| 4 | Contador | 1 |
| 5 | Responsable de recursos humanos | 1 |
| 6 | Responsable de almacenes | 1 |
| 7 | activos fijos | 1 |
| 8 | Responsable de informacion | 1 |
| 9 | Responsable de caja recaudaciones | 1 |
| 10 | Encargada de Admision | 1 |
| 11 | encargado de sistemas | 1 |
| | TOTAL | 11 |
| | | |

| , | N° | 2° NIVEL H.G.M.O DE PERSONAL DE SERVICIO | CANTIDAD | | |
|---|----|---|----------|--|--|
| ~ | N° | | JANTIDAL | | |
| ~ | 1 | Personal de servicio en gral. (6 limpieza, 2 cocinera, 3 lavanderia) | 11 | | |
| | 2 | Guardia camillero | 2 | | |
| | 3 | Chofer | 2 | | |
| | 4 | Portero | 2 . | | |
| | 5 | Servicios | 2 | | |
| | 6 | Responsable de mantenimiento | 1 | | |
| | 7 | encargado ing. Electromecanico | 1 | | |

| | | 2° NIVEL H.G.M.O. PERSONAL | |
|---|----|----------------------------|----------|
| Ν | l° | CLINICO | CANTIDAD |
| | 1 | Medico General | 2 |
| 2 | 2 | Medico Traumatologo | 1 |
| 3 | 3 | Medico anestesiologo | 1 |
| 4 | 4 | Bioquimico/Farmaceutico | 5 |
| į | 5 | Farmaceutico | 5 |
| (| 6 | Ecografista | 1 |
| - | 7 | Radiologo | 1 |
| 8 | 8 | Pediatra | 1 |
| Ç | 9 | Odontologo | 1 |
| 1 | .0 | Lic. de Enfermeria | 12 |
| 1 | .1 | Auxiliar de Enfermeria | 1 |
| 1 | .2 | Tec Laboratorio | 2 |
| | | TOTAL | 33 |
| 1 | | | 100 |

Sueldos del personal eventual de salud SEGUNDO NIVEL H.G.M.O. entre personal Administrativo, Clínico y de servicio se tienen 68 personas contratadas.

mantenimiento

Servicio de mantenimiento





TOY DE SA

Potosí - Bolivia

Apoyo funcionamiento de Salud





ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo la compra de llantas para los vehículos. (Ambulancia)



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|--------------|--------------|-----|
| 5.282.330,74 | 3.491.436,93 | 1.793.893,81 | 66% |

- Cancelación de Servicios Básicos.
- Sueldos del personal eventual de salud.
- Mantenimiento de ambulancias, motocicletas y compra de repuestos.



Potosí - Bolivia



Apoyo funcionamiento de Salud







| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|--------------|--------------|-----|
| 5.282.330.74 | 3,491,436,93 | 1,793,893,81 | 66% |

Cancelación de Servicios Básicos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo la compra de material de escritorio y limpieza

| SE | RV | ICI | OS | BASI | COS |
|----|-----------|-----|----|-------------|-----|
| | | | | | |

ENERGIA ELECTRICA

AGUA

TELEFONIA

GAS DOMICILIARIO

INTERNET

SEGUROS



Seq.

Potosí - Bolivia

Apoyo funcionamiento UNI



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Promoción de las prácticas alimentarias saludables, la lactancia materna por sus beneficios entre niños y niñas desde el nacimiento.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 100.000,00 | 39.740,42 | 60.259,58 | 39,74% |

 En el marco de la Política Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI)





Potosí - Bolivia



Gastos de funcionamiento Centro de Rehabilitación para personas con Discapacidad



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Atención en salud a las personas con discapacidad en los centros de habilitación y rehabilitación.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|------------|--------|
| 180.000,00 | 40.734,42 | 139.265,58 | 30,37% |

 En el marco de la Ley 223 (Ley General para personas con discapacidad)





Potosí - Bolivia



Apoyo a programas de Salud



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|-----------|-------|
| 250.000,00 | 216.571,34 | 33.428,66 | 86,62 |

 Se realizaron campañas de promoción para la salud y la prevención de enfermedades.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Campañas participativas realizadas hacia la población en general en sus diferentes programas: VIH - SIDA, DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO -TUBERCULOSIS - PAI -**ENFERMEDADES NO** TRANSMISIBLES - MI SALUD - FIM DE REFERENCIA, ADOLESCENTES -**BONO JUANA AZURDUY -**ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.



Potosí - Bolivia



Adquisición de Nutribebes



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se procedió con la cancelación de la adquisición de productos de la anterior gestión.
- Se procedió a la licitación pública en dos oportunidades, correspondiendo la contratación por excepción.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|--------|
| 920.000,00 | 413.127,00 | 506.873,00 | 44,90% |

 De acuerdo al Programa Desnutrición Cero.





Potosí - Bolivia



Funcionamiento Centro Municipal de Zoonosis



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Campaña de vacunación antirrábica.
- Esterilización de animales
- Eutanasia y curación de animales.

IMAGEN DE REFERENCIA

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 100.000,00 | 18.627,21 | 81.373,21 | 20,87% |

- Compra de insumos.
- Sueldos y salarios personal





Potosí - Bolivia



Servicios de Salud Universal y Gratuito



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adquisición de medicamentos bajo la modalidad ANPE.
- Proceso de cancelación sueldos y salarios personal del 1er nivel.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|------------|--------------|
| 3.787.946,00 | 568.251,01 | 3.219.694,66 |

 Adquisición de medicamentos para el Hospital General Madre Obrera y para 1er nivel.



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCIÓN



Potosí - Bolivia



Servicios de Salud Universal y Gratuito



| DETALLE DE COMPRAS EN PROCESO DE ADQUISICION 2 SEMESTRE | CANTIDAD |
|---|------------|
| MEDICAMENTOS PRIMER NIVEL | 784,794.54 |
| INSUMOS MEDICOS PRIMER NIVEL | 115,488.35 |
| INSUMOS ODONTOLOGICOS PRIMER NIVEL | 81,727.74 |
| CARMELO | 499,500.00 |

| 湖 美丽西美国 | 8 | | |
|--------------|------------|--------------|-----|
| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
| 3.787.946,00 | 568.251,01 | 3.219.694,66 | 15% |

 Adquisición de complemento nutricional CARMELO en proceso

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adquisición de medicamentos, insumos médicos, insumos odontológicos bajo la modalidad ANPE.





IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



TO THE STATE OF TH

Potosí - Bolivia

CANTIDAD

584.611.14

282,961.00

20.100.00

278.953.84

344.832.00

75.250.00

960,000,00

Servicios de Salud Universal y Gratuito



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|------------|--------------|-----|
| 3.787.946,00 | 568.251,01 | 3.219.694,66 | 15% |

 Adquisición de medicamentos para el Hospital General Madre Obrera y para 1er nivel.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adquisición de medicamentos, insumos, reactivos insumos odontológicos, ropa hospitalaria, impresión de formularios bajo la modalidad ANPE.



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



Potosí - Bolivia



Prevención, control y atención del CORONAVIRUS



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|--------------|--------------|-----|
| 5.796.987,26 | 4.519.898,89 | 1.277.088,37 | 77% |

 Adquisición de medicamentos e insumos para combatir la enfermedad del COVID-19

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cancelación de sueldos a los Consultores.

Compra de medicamentos e insumos para el COVID-19

DETALLE DE COMPRAS EN PROCESO PENDIENTES

CONTRATACION DE PERSONAL CLINICO Y DE SERVICIO PARA EL COVID

CONTRATCACION DE PERSONAL DE SERVICIO PARA EL COVID

COMPRA DE OXIGENO PARA PACIENTES
COVID

MEDICAMENTOS CONTROL Y ATENCION DE CORONAVIRUS

PROCESO DE LICITACION 2020 DE LOS MEDICAMENTOS

ADQUISICION DE INSUMOS PROCESO DE CONTROL Y ATENCION DE CORONAVIRUS CONTRATACION 2020 DE INSUMOS COVID-

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



TANK TO VOICE AND THE STATE OF THE STATE OF

Potosí - Bolivia

Prevención, control y atención del CORONAVIRUS

| VARIABLE | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------|------|
| CONSULTAS MEDICAS COVID 2020 | 600 | 1520 |
| TOTAL | 600 | 1520 |

IMAGEN ACTUAL


| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|--------------|--------------|
| 5.796.987,26 | 4.519.898,89 | 1.277.088,37 |

 Adquisición de medicamentos e insumos para combatir la enfermedad del COVID-19

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cancelación de sueldos a los Consultores.

Compra de medicamentos e insumos para el COVID-19





TO YOUR MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE PARTY

Potosí - Bolivia

Prevención, control y atención del CORONAVIRUS

| VARIABLE | 2020 | 2021 | | |
|-------------------------|------|------|--|--|
| MUESTRAS TOMADAS COVID | 781 | 975 | | |
| MUESTRAS SISTEMATIZADAS | 404 | 975 | | |
| CASOS POSISITIVOS COVID | 166 | 388 | | |
| CASOS NEGATIVOS COVID | 238 | 586 | | |

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cancelación de sueldos a los Consultores.

Compra de medicamentos e insumos para el COVID-19

| IMAGEN ACTUAL | |
|---------------|--|
| | |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|--------------|--------------|-----|
| 5.796.987,26 | 4.519.898,89 | 1.277.088,37 | 77% |

 Adquisición de medicamentos e insumos para combatir la enfermedad del COVID-19

| VARIABLE | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|
| ATENCION DE PARTOS | 29 | 85 |
| ATENCION CESAREAS | | 18 |
| TOTAL | 29 | 103 |

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE EDUCACIÓN







Provisión alimentación complementaria escolar Área concentrada Gestión 2021





ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley N° 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 12.033,00 alumnos (nivel inicial, primaria y secundaria).

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 6.147.042,00 | 3.409.741,38 | 2.737.300,62 | 55,47 |

 Provisión de desayuno escolar para 12.033,00 estudiantes de 23 unidades educativas en el área concentrada.





TALL MAN SHOPE

Potosí - Bolivia

Provisión alimentación complementaria escolar Área concentrada Gestión 2021

| DÍA 1: LUNES | DÍA 2: MARTES | DÍA 3: MIÉRCOLES | DÍA 4: JUEVES | DÍA 5: VIERNES |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Leche Chocolatada 140 ml | Yogurt batido en vasito 90 gr. | Leche Chocolatada 140 ml | Yogurt en Sachet 100 ml | Leche con avena 140 ml |
| Galleta Crakers Sachet 35 gr. | | Granola 30 gr. | Galleta Crackers Sachet 35 gr. | Galleta Wafer 30 gr. |











Provisión alimentación complementaria escolar Área concentrada Gestión 2021









Provisión alimentación complementaria escolar Área dispersa Gestión 2021





| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|------------|------|
| 406.600,00 | 15.729,97 | 390.870,03 | 3,87 |

 Provisión de desayuno escolar para estudiantes de 18 unidades educativas en el área dispersa.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley Nº 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 1.117,00 alumnos (nivel inicial, primaria y secundaria).





SOOE SOOE

Potosí - Bolivia

Provisión alimentación complementaria escolar Área dispersa Gestión 2021

| | P | RIMERA SEMANA | | |
|---|--|---------------------------|---|---|
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Yogurt en sachet (100 ml) Galleta Crackers sachet (35 gr) | Fruta natural manzana (170 gr) | Sopa de maní con fideo | Yogurt en sachet (100 ml) Empanada de Queso (40 gr) | Chicolac. Leche chocolatada (140 ml.) Queque (40 gr.) |
| | SE | EGUNDA SEMANA | | |
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Fruta natural manzana (170 gr) | Yogurt en sachet (100 ml) Granola (30 gr) | Sopa de Chairo | Yogurt batido en vasito | Yogurt en sachet (100 ml) Galleta Crackers sachet (35 gr) |











Provisión alimentación complementaria escolar Área dispersa Gestión 2021









Potosí - Bolivia



Funcionamiento Programa PAPI



ACTIVIDADES REALIZADAS

- No se realizaron actividades, debido a que los centros PAPI, no se encuentran en funcionamiento a causa de la pandemia, por lo que solo se tiene serenas en los centros.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|-----------|--------|
| 200.000,00 | 183.420,50 | 16.579,50 | 97,71% |

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Encargada y 18 Serenas).
- Material de escritorio.





The same of the sa

Potosí - Bolivia

Funcionamiento Programa PAPI









Funcionamiento Establecimientos Educativos



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|-------|
| 275.257,00 | 131.025,94 | 143.981,06 | 47,64 |

- Servicio de consultoría personal de servicio
- Servicios Básicos de las Unidades Educativas.
- Fondos en Auxilio.
- Servicios de imprenta y otros.









Apoyo al Funcionamiento Dirección Distrital



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 43.858,00 | 20.665,66 | 22.935,86 | 48,00 |

- Servicios básicos.
- Material de Escritorio y otros.







Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Uyuni Ayllu Sikuya







| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|------------|-------|
| 200.000,00 | 76.522,00 | 123.478,00 | 38,26 |

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Coordinador, 12 Anfitrionas y 35 Becarios).
- Material de escritorio.
- Materiales didácticos y educativos .







Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Uyuni Ayllu Sikuya















Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Jiskanki Ayllu Chullpa





| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 150.000,00 | 72.638,68 | 77.461,32 | 48,36 |

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Coordinadora, 9 Anfitrionas y 24 Becarios).
- Material de escritorio.
- Materiales didácticos y educativos.







Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Jiskanki Ayllu Chullpa













Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Capunita Ayllu Sikuya



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 150.000,00 | 61.655,15 | 88.344,85 | 41,10 |

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Coordinador, 12 Anfitrionas y 35 Becarios).
- Material de escritorio.
- Materiales didácticos y educativos .









Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Capunita Ayllu Sikuya











Potosí - Bolivia



Transporte Escolar Ayllu Chullpa Gestión 2021



| IMAGEN ACTUAL | | | | | |
|----------------|------------|------------|-------|--|--|
| PROGRAMAD O | EJECUTADO | SALDO | % | | |
| 400.000,00 | 141.277,50 | 258.722,50 | 35,32 | | |

Proyecto se encuentra en ejecución

DETALLE DE LAS RUTAS

| 1 | 1 II I A | VIII | ~ A A A | VA/A I | OUFRI |
|---|----------|------|---------|--------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |

2. SIVINGANI - VICTATA

3. SARAQUE - IRRUPAMPA - PINTATA

4. NAVIDAD - JANKO CALANI

5. WICHOCOLLO - QUITARJANI - SIRCUYO

6. KUCHUYO

7. FALAUCANI - CHACALACAÑA

8. SOL DE MAYO - AYONOMA

9. CALAMARCA - UMIRI

10. MARKA KUNCA - CUMJASI

| 1 | | \sim 11 | | A I I | ~ | ` . | A 1 | ш |
|---|-----|-----------|----|-------|---|------------|-----|----|
| | | С.Н | ΔL | :HA | | M | ΔI | VІ |
| • | • • | • | | | | | | ٠. |

12 CONDOR CUYO

13. ANDAVILLOUE

14. CHUARIRI

15. SIRI SIRI - VENTILLA

16. NAVIDAD - SIRCUYO

17. QUITARJANI

18. NAVIDAD

19. KULTA



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL TÉCNICA Potosí - Bolivia



Transporte Escolar Ayllu Chullpa Gestión 2021









Potosí - Bolivia

Transporte Escolar Ayllu Sikuya Gestión 2021



DATOS DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | MARCO GASPAR CUYO |
|---------------------|-----------------------|
| SUPERVISOR | OMAR CRUZ VILLEGAS |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 165 D/C |
| AVANCE FISICO | 55% |
| AVANCE FINANCIERO | 35% |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | |
|------------|------------|------------|--|
| 300.000,00 | 102.926,61 | 197.073,39 | |

Proyecto se encuentra en ejecución





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL TÉCNICA Potosí - Bolivia



Transporte Escolar Ayllu Sikuya Gestión 2021













Potosí - Bolivia



Transporte Escolar San Benito Menin



DETALLE DE LAS RUTAS

- ✓ MERCADO CENTRAL
- ✓ SALVADORA
- ✓ SIGLO XX MONTES
- ✓ LLALLAGUA EX CONCEJO
- ✓ CAMPAMENTO 1 SIGLO XX
- ✓ CATAVI VILLA NUEVA
- ✓ SAKAMARCA VILLA NUEVA
- ✓ CANCAÑIRI

IMAGEN ACTUAL

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|------------|------|
| 60.000,00 | 1.388,00 | 136.612,00 | 1,01 |

• Proyecto se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 28.000,00 (VEI NTI OCH O NIL 00/100 B OLI VI ANOS), teniendo a 67 estudiantes beneficiarios(as).





Potosí - Bolivia



Transporte Escolar U.E. Mayo Nocturno



IMAGEN DE REFERENCIA

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|----|
| 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0% |

• Proyecto se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 14.994 (CATORCE NIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS), teniendo a 63 estudiantes beneficiarios(as).

DETALLE DE LAS RUTAS

- ✓ VILLA 22 DE DICIEMBRE (PARTE ALTA)
- ✓ SAKAMARCA Y VILLA 22 DE DICIEMBRE (PARTE BAJA)
- **✓ CATAVI**
- √ SIGLO XX





Potosí - Bolivia



Apoyo al funcionamiento Centro Integral Multisectorial San Benito Menin



- Material Eléctrico y Escritorio.
- Consultoría en Línea Servicio de Consultoría en Línea (1 Psicopedagogo, 2 Fisioterapeutas, 1 Trabajadora Social, 1 Cocinero y 1 Auxiliar).

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|------------|----|
| 138.000,00 | 1.388,00 | 136.612,00 | 0% |







IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION





Programa de Post-Alfabetización





| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|----------|-------|
| 30.000,00 | 20.447,00 | 9.553,00 | 68,16 |



Material de Escritorio.







Potosí - Bolivia



Equipamiento CEAs



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Compra de herramientas y materiales para los distintos centros de educación alternativa.

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|------------|-------|
| 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

- Equipamiento ŒA "Santa Rta" se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 50.000,00.
- Equipamiento ŒA "Gtavi" se encuentra en ejecución con un monto de Bs 50.000,00.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas de trabajo en el aula taller.





Potosí - Bolivia



Const. Baño U.E. Capunita Nivel Secundario Ayllu Sikuya



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|----------|
| 49.954,46 | 46.941,45 | 3.013,01 |

• Proyecto se encuentra en ejecución

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | REYMUNDO COLQUECHACA |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | OMAR CRUZ VILLEGAS |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 45% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |





Potosí - Bolivia



Const. Baños Ecológicos Unidad Educativa Uyuni Ayllu Sikuya



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|--------|
| 44.102,00 | 43.978,12 | 123,88 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA VILLMUR |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | OMAR CRUZ VILLEGAS |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 100% |
| FECHA DE ENTREGA | 09/07/2021 |





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA FISCAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Potosí - Bolivia



CONSTRUCCIÓN U.E. CARLOS MEDINACELI



| EMPRESA CONTRATISTA | EMPRESA CONSTRUCTORA SOLCAM |
|---------------------|--------------------------------|
| SUPERVISOR | Consultora VALLECUEVAS |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 420 D/C |
| AVANCE FISICO | 62,81 % |
| AVANCE FINANCIERO | 56,34 % |
| FECHA DE ENTREGA | 23/02/2022 |

DATOS DEL PROYECTO

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|--------------|--------------|
| 6'535.943,56 | 3'682.469,32 | 2'853.474,24 |

Proyecto ejecutado físicamente al 62,81 %





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA FISCAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SONE

Potosí - Bolivia

CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA: LIBERTAD DISTRITO SAMAMARKA



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|--------------|------------|
| 2'837.356,79 | 2'167.697,84 | 669.658,95 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| DATOS DEL PROTECTO | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| EMPRESA CONTRATISTA | Asociación Accidental "SAENCO" | |
| SUPERVISOR | Consultora VALLECUEVAS | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 200 D/C | |
| AVANCE FISICO | 100% | |
| AVANCE FINANCIERO | 76,39 % | |
| FECHA DE ENTREGA | 11/07/2021 | |



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



POTOSI - BOLIVIA





Potosí - Bolivia



Apoyo al Deporte



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|-------|
| 800.000,00 | 487.502,00 | 312.498,00 | 62,30 |

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio.
- Gastos para la realización de actividades

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Apoyo a las diferentes asociaciones deportivas de nuestro municipio, con materiales e implementos deportivos (7 asociaciones deportivas)
- Apoyo a las ligas deportivas de los Distritos del Ayllu Chullpa y Sikuya
- Mantenimiento de Campos deportivos en los 7 Distritos del Municipio de Llallagua
- Incentivo deportivo a las Ligas Deportivas y Asociaciones Municipales de Liallagua, en los Niveles, Formativo, Recreativo y Competitivo y otros Gastos





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA FISCAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Potosí - Bolivia



Construccion estadio irineo pimentel rojas municipio de llallagua



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|------------|--------------|
| 6'929.035,29 | 863.211,04 | 6'065.824,25 |

Proyecto ejecutado físicamente al 61,42 %

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | EMPRESA CONSTRUCTORA ATRALID |
|---------------------|--|
| SUPERVISOR | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "LOVA" |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 365 D/C |
| AVANCE FISICO | 61,42 % |
| AVANCE FINANCIERO | 12,46 % |
| FECHA DE ENTREGA | 27/01/2022 |





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL TÉCNICA Potosí - Bolivia



Const. Cancha Polifuncional Zona 7



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|-----------|----|
| 245.543,05 | 228.355,37 | 17.188,13 | 98 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSTRUCTORA P.C.Y. |
|---------------------|------------------------|
| SUPERVISOR | SILVIA LOPEZ S. |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 60 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 80% |
| FECHA DE ENTREGA | 12/03/2021 |





Potosí - Bolivia

Const. Cerramiento tinglado U.E. Junin de Catavi



DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | NESTOR OROPEZ CHIARA |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | WILDER ACHAYA HUANCA |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 10/08/2021 |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

 Proyecto se encuentra concluido físicamente





TO DESAM

100%

0%

10/08/2021

Potosí - Bolivia

Refac. Piso Parquet de Cancha Poligimnacio de Catavi



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|----------|
| 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| • | Proyecto | se | encuentra | concluido |
|-------------|----------|----|-----------|-----------|
| físicamente | | | | |

| EMPRESA CONTRATISTA | NESTOR OROPEZ CHIARA |
|---------------------|-------------------------|
| SUPERVISOR | WILDER ACHAYA HUANCA |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 15 D/C |

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

FECHA DE ENTREGA

DATOS DEL PROYECTO





Potosí - Bolivia



Construcción Tinglado Piscina 1ro de Mayo



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|-----------|--------------|
| 1.187.909,65 | 0,00 | 1.187.909,65 |

| • | Proyecto | se | encuentra | concluido |
|-------------|----------|----|-----------|-----------|
| físicamente | | | | |

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | Raúl Alberto Nina Rodríguez |
|---------------------|--------------------------------|
| SUPERVISOR | Guido García Condori |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 130 D/C |
| AVANCE FISICO | 40,50% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |
| FECHA DE ENTREGA | 15/10/2021 |





POTOSI - BOLIVIA

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO





Potosí - Bolivia



Apoyo a la Cultura



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|------|
| 150.000,00 | 60.890,54 | 89.109,46 | 40,5 |

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio.
- Gastos para la realización de actividades.

- Gastos realizados en actividades municipales, Aniversarios de las sub Alcaldías.
- Festividades religiosas Ayllu Chullpa y Sikuya, toro Tinku, Takiy Tinku





POTOSI - BOLIVIA

DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO





Potosí - Bolivia

Apoyo a la Unidad de Turismo





MAGEN ACTUAL

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-----|
| 100.000,00 | 30.213,00 | 69.787,00 | 45% |

- Salario del responsable de Unidad de turismo
- Gasto en todas las actividades programadas

- Elaboración de calendarios conmemorativos.
- Proyecto de elaboración de portal o señalética de ingreso a Llallagua.
- Actos de homenaje.
- Recorrido de ruta turística con el embajador de Rusia





POTOSI - BOLIVIA





Potosí - Bolivia



Servicio Legal Integral Municipal



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|-----------|-----|
| 250.000,00 | 104.185,87 | 99.241,79 | 69% |

- Salario Personal de Servicio
- Servicios Básicos
- Viáticos y Pasajes
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales
- Servicios de Fotocopias e imprenta y otros

- Caravana vehicular por un carnavales sin violencia gestión 2021.
- Diseño, diagramación e impresión de banners, pasacalles y rollers para la unidad de SLIM.
- Acto de conmemoración al día internacional de la mujer 2021.
- Feria de sensibilización y revalorización en conmemoración al día internacional de la familia.
- Taller de socialización rol de la madre en la familia
- Talleres dirigidos a la población sobre la ley 348, 548 y los protocolos de atención.



Potosí - Bolivia



Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)

Intervenciones Área Legal

Acuerdos Regulador de Separación Acuerdo voluntario de Asistencia Familiar

Denuncias instauradas en el Ministerio Publico

Procesos para Juicio Oral

Sentencias

Rechazo, sobreseimiento

Orientación legal

Resoluciones inmediatas Juzgado de

Familia

TOTAL CASOS ATENDIDOS 270



Intervenciones Área Social

Casos de Orientación social y atención de casos.

Visitas Domiciliarias a través de intervención social y acompañamiento a víctimas en casos de riesgo, adultos mayores. Elaborar de Informes de Seguimiento Social previa intervención a domicilio de cada caso Remisión de Informes Sociales al Área Legal en casos.

Requerimientos de Informes sociales por el Ministerio Publico y Juzgado de Familia (Procesos de Violencia intra familiar) Atención y gestión de apoyo social en casos extrema indigencia (Se elaboró Informe Socioeconómico)

Casos de Orientación social y atención de casos.

TOTAL CASOS ATENDIDOS 239



Potosí - Bolivia



Funcionamiento UMADIS



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|------|
| 40.000,00 | 24.792,00 | 15.208,00 | 61,9 |

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Servicio de fotocopias

- Tramites realizados ante SERECI, SEGIP en favor de personas con discapacidad
- Visitas realizadas a los domicilios de personas con discapacidad para obtener información sobre las condiciones de vida de los mismos.
- Atención en oficina de distintos casos por parte del personal de UMADIS
- Campañas en beneficio de personas con discapacidad.
- Reuniones de coordinación para la evaluación y posterior calificación de grado de discapacidad.
- Talleres dirigidos a la población.



| DETALLE O TIPOLOGIA DE LOS CASOS ATENDIDOS (ENE- JUL) | CANT · |
|--|-----------|
| Visitas domiciliarias realizadas | 10 |
| Consultas sobre renovación de Carnet de Discapacidad | 30 |
| Consultas sobre la nueva afiliación para obtener Carnet de Discapacidad | 20 |
| Consultas efectuadas por la población y atendidas por la Unidad | 20 |
| Tramite de Libreta de Servicio Militar Auxiliar "D" | 1 |
| Cumplimiento a requerimiento fiscal | 1 |
| Casos solucionados en la oficina de UMADIS () | 1 |
| Casos con detenidos en la cárcel San Miguel de Uncía | 1 |
| Total Casos Atendidos por UMADIS | 84 |











Bono para personas con discapacidad



| DETALLE | CANTIDAD |
|---------------------------|------------|
| Monto cancelado (ENE-JUL) | 306.750,00 |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|-------|
| 565.500,00 | 306.750,00 | 258.750,00 | 54,24 |

 Pago en efectivo (250.- Bolivianos) realizado a personas con discapacidad a partir del grado según D.S.





Potosí - Bolivia



Unidad del Adulto Mayor



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|----|
| 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0% |

- Salario Personal de Servicio
- Servicios Básicos
- Viáticos y Pasajes
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Servicios de Fotocopias e imprenta y otros.
- En proceso de ejecución financiera

- Gestión de atención y tratamiento en el Hospital Bracamonte de Potosí.
- Ferias Distritales por el Día de la Familia.
- Gestión de atención y acompañamiento a personas adultas mayores en instituciones de nuestro municipio (SERECI, SEGIP, HOSPITAL MADRE OBRERA, INTENDENCIA, POLICIA)





POTOSI - BOLIVIA

DEFENSORIA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA





Potosí - Bolivia



Funcionamiento Defensoría de la Niñez y Adolescencia



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|-----------|-----|
| 320.378,00 | 221.136,21 | 99.241,79 | 69% |

- Salario Personal de Servicio
- Servicios Básicos
- Viáticos y Pasajes
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales
- Servicios de Fotocopias e imprenta y otros

- Inauguración de nueva oficina en el distrito Catavi.
- Ferias distritales por el Día de la Familia.
- Ferias distritales en conmemoración a victimas de violencia sexual
- Operativos de coordinación con la policía.
- Inspección a centros de acogida Margarita Auger y Miraflores en Uncía.
- Campañas solidarias en apoyo a niños y adolecentes.
- Apoyo por parte de Visión Mundial y SAVE THE CHILDREN
- Atención en la terminal de Buses de Llallagua.



SPOLE TO SPON

Potosí - Bolivia

Funcionamiento Defensoría de la Niñez y Adolescencia

| Casos atendidos por el Area Legal | Nº de casos |
|--|-------------|
| - Acuerdos de Asistencia Familiar | 180 |
| - Demandas de Asistencia Familiar | 220 |
| - Procesos Penales | 60 |
| - Procesos de Tutela | 20 |
| - Procesos de Guarda | 30 |
| - Acogimientos Institucionales | 5 |
| Resumen casos atendidos por las 4 defensorías de la niñez y adolescencia | 515 |





SEL FEMORIARESEEV EN WIT

POTOSI - BOLIVIA

SERVICIO DE FAENADO DE GANADO





Potosí - Bolivia



Funcionamiento Matadero Municipal



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|-------|
| 250.000,00 | 138.837,95 | 111.162,05 | 55,53 |

- Salario Personal de Servicio
- Servicios Básicos
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales

- Limpieza e higiene del matadero
- Fumigación de la planta de faeneo, control de vectores, roedores y plagas.
- Cloración del Pozo de agua del Matadero Municipal
- Envió de muestreos al laboratorio de SENASAG
- Inspecciones ante y post morten en corral y en zona de despacho para del mercado central.
- Control de ganado mediante el Sistema gran Paititi Psiringa de SENASAG.
- Emisión de autorizaciones de faeneo de ganado.



POTOSI - BOLIVIA

GESTIÓN DE RIESGOS





Potosí - Bolivia



Gestión de Riesgos



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 125.000,00 | 94.790,00 | 20.953,58 | 75 % |

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de Equipos, Materiales y suministros

- Elaboración de reportes sobre eventos climáticos.
- Levantamiento de información sobre la afectación de eventos climáticos en distintos sembradíos.
- Levantamiento de información sobre la familias criaderos de ganado camélidos
- Elaboración de perfiles de proyecto para adquisición de semillas, herramientas, materiales, etc.
- Socialización del Proyecto "mejoramiento de la producción frutícola con la introducción de especies frutales mejoradas".
- Seguimiento en la entrega de plantines a los distintos distritos.
- Seguimiento a la reforestación con plantines



POTOSI - BOLIVIA

RECURSOS HIDRICOS





Potosí - Bolivia

Manejo Integral Microcuenca Escalerani Ayllu Chullpa



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|-----------|--------------|
| 5.669.840,20 | - | 5.669.840,20 |

 Se debe de garantizar la contraparte municipal del 20% del total del proyecto para realizar su licitación

| DATOS DEL PROYECTO | | |
|---------------------|---------|--|
| EMPRESA CONTRATISTA | - | |
| SUPERVISOR | - | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 365 D/C | |
| AVANCE FISICO | 0% | |
| AVANCE FINANCIERO | 0% | |
| FECHA DE ENTREGA | - | |



IMAGEN ZONA DE INTERVENCIÓN



CALL SEE

Potosí - Bolivia

EDTP Manejo Integral de la Microcuenc<mark>a Media del Rio Verde</mark>



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|-----------|
| 167.000,00 | 17.000,00 | 150.00,00 |

| • | Proyecto | en | etapa | de | ejecució | 'n, |
|---|-------------|------|-------|----|----------|-----|
| | financiamie | ento | entre | le | MMAyA | У |
| | GAMLL | | | | | |

DATOS DEL PROYECTO

| EMPRESA CONTRATISTA | CONSULTORA CONSTRUMAG |
|---------------------|--------------------------|
| SUPERVISOR | OMAR CRUZ VILLEGAS |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 110 D/C |
| AVANCE FISICO | 5% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |





POTOSI - BOLIVIA

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA SECRETARIA MUNICPAL TÉCNICA Potosí - Bolivia

Gastos de Funcionamiento Seguridad Ciudadana



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|------------|------------|
| 517.288,00 | 235.492,00 | 281.796,00 |

- Mantenimiento de equipos y vehículos policiales.
- Material de escritorio, aseo y limpieza.







Potosí - Bolivia



Equipamiento y Mantenimiento de Equipos Policiales



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|------------|
| 250.000,00 | 65.363,08 | 184.636,92 |

- Materiales de escritorio
- Combustible (gasolina)
- Equipamiento
- Seguros
- Pago de servicios básicos (telefonía, agua, energía eléctrica)







POTOSI - BOLIVIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL





SOOL

Potosí - Bolivia

Funcionamiento Balnearios Catavi



| | RECAUDACION | | |
|----|-------------------|----------------|--|
| | Balnearios catavi | | |
| | (Expresado | en Bolivianos) | |
| N° | <u>MESES</u> | MONTO EN Bs. | |
| 1 | ENERO | 31.600 | |
| 2 | FEBRERO | 33.150 | |
| 3 | MARZO | 34.730 | |
| 4 | ABRIL | 41.610 | |
| 5 | MAYO | 47.360 | |
| 6 | JUNIO | 49.130 | |
| | TOTAL 237.580 | | |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|----|
| 650.000,00 | 200.187,70 | 449.812,30 | 31 |

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales





Potosí - Bolivia



Funcionamiento Terminal de Buses Llallagua



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|------------|------------|----|
| 500.000,00 | 315.350,84 | 184.649,16 | 63 |

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales

RECAUDACION TERMINAL DE BUSES LLALLAGUA

Por la gestión terminada al 31 de Julio del 2021 (Expresado en Bolivianos)

| | (Expresado en Bolivianos) | | |
|----|---------------------------|--------------|--|
| | | | |
| N° | <u>MESES</u> | MONTO EN Bs. | |
| 1 | ENERO | 55.000 | |
| 2 | FEBRERO | 49.000 | |
| 3 | MARZO | 63.800 | |
| 4 | ABRIL | 39.100 | |
| 5 | MAYO | 43.000 | |
| 6 | JUNIO | 37.300 | |
| 7 | JULIO | 48.300 | |
| | TOTAL | 335.500 | |



Potosí - Bolivia



Unidad de Desarrollo Integral Juvenil



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-------|
| 60.000,00 | 33.870,00 | 26.130,00 | 56,45 |

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio.
- Gastos para la realización de actividades

- Cumbre municipal de la Juventud.
- Programa televisivo concurso "talento joven" (todas y todos somos libres e iguales).
- VII Congreso ordinario de la federación de organizaciones juveniles del municipio de Llallagua 2021
- Grabación de un tema musical en audio y video en conmemoración al día de la juventud del municipio de Llallagua
- Semana aniversario día municipal de la juventud "23 de julio"
- Talleres dirigidos a la población.



Potosí - Bolivia



Fortalecimiento a la Promoción y Desarrollo Económica Local



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO | % |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 100.000,00 | 79.417,00 | 20.582,00 | 77 % |

- Sueldo Asistente U.P.E.P. y Planificación.
- Promoción de actividades productivas.

- Ferias de promoción agropecuarias en los distritos Ayllu Chullpa y Ayllu Sikuya.
- Curso de capacitación a los sectores productivos





Potosí - Bolivia



Adquisición camioneta doble cabina 4x4 Distrito Ayllu Sikuya



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|------------|-------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |

Proyecto ejecutado físicamente al 100%

| DATOS | DEL | PROY | /ECTO |
|-------|-----|------|-------|
| | | | |

| EMPRESA CONTRATISTA | CROW |
|---------------------|-----------------------|
| SUPERVISOR | OMAR CRUZ VILLEGAS |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 30 D/C |
| AVANCE FISICO | 100% |
| AVANCE FINANCIERO | 38% |
| FECHA DE ENTREGA | 10/08/2021 |





Potosí - Bolivia



Equipamiento de Maquinaria para la construcción de Vigiñas distrito Ayllu chullpa



| 57.1.00 522 7.10 720 7 | | |
|------------------------|-----------|--|
| EMPRESA CONTRATISTA | - | |
| SUPERVISOR | - | |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 365 D/C | |
| AVANCE FISICO | 0% | |
| AVANCE FINANCIERO | 0% | |
| FECHA DE ENTREGA | 9/10/2021 | |

| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|--------------|-----------|--------------|
| 1.421.403,80 | - | 1.421.403,80 |

 Se debe de gestionar ante FDI para la transferencia de recursos al GAM Llallagua





Potosí - Bolivia



Fortalecimiento a la producción agropecuaria Ayllu Chullpa



| PROGRAMADO | EJECUTADO | SALDO |
|------------|-----------|------------|
| 260.332,40 | - | 260.332,40 |

 Se encuentra en proceso de inscripción de recursos en la entidad financiadora para su posterior licitación

| EMPRESA CONTRATISTA | - |
|---------------------|--------|
| SUPERVISOR | - |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | 30 D/C |
| AVANCE FISICO | 0% |
| AVANCE FINANCIERO | 0% |



FECHA DE ENTREGA

