

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



RENDICION PUBLICA DE CUENTAS INICIAL GESTION 2022




Adalid Jorge Aguilar
ALCALDE MUNICIPAL

La Presente Rendición Pública de Cuentas Contiene toda la información sobre las políticas de desarrollo que el gobierno municipal ejecutara durante la gestión 2022, además de un resumen de las actividades realizadas a la fecha correspondiente al primer cuatrimestre de la gestión 2022, (Enero a Abril), concerniente a la Administración del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua. En función de una planificación estratégica que nos permitió:

Formular la Programación Operaciones Anual (POA) de la gestión 2022 y la programación presupuestaria.


Determinar los Recursos Municipales en función de Objetivos Institucionales y Objetivos de Gestión, con la finalidad de lograr el desarrollo de nuestro Municipio.



ESTRUCTURA ORGÁNICA

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 2022

ESTRUCTURA

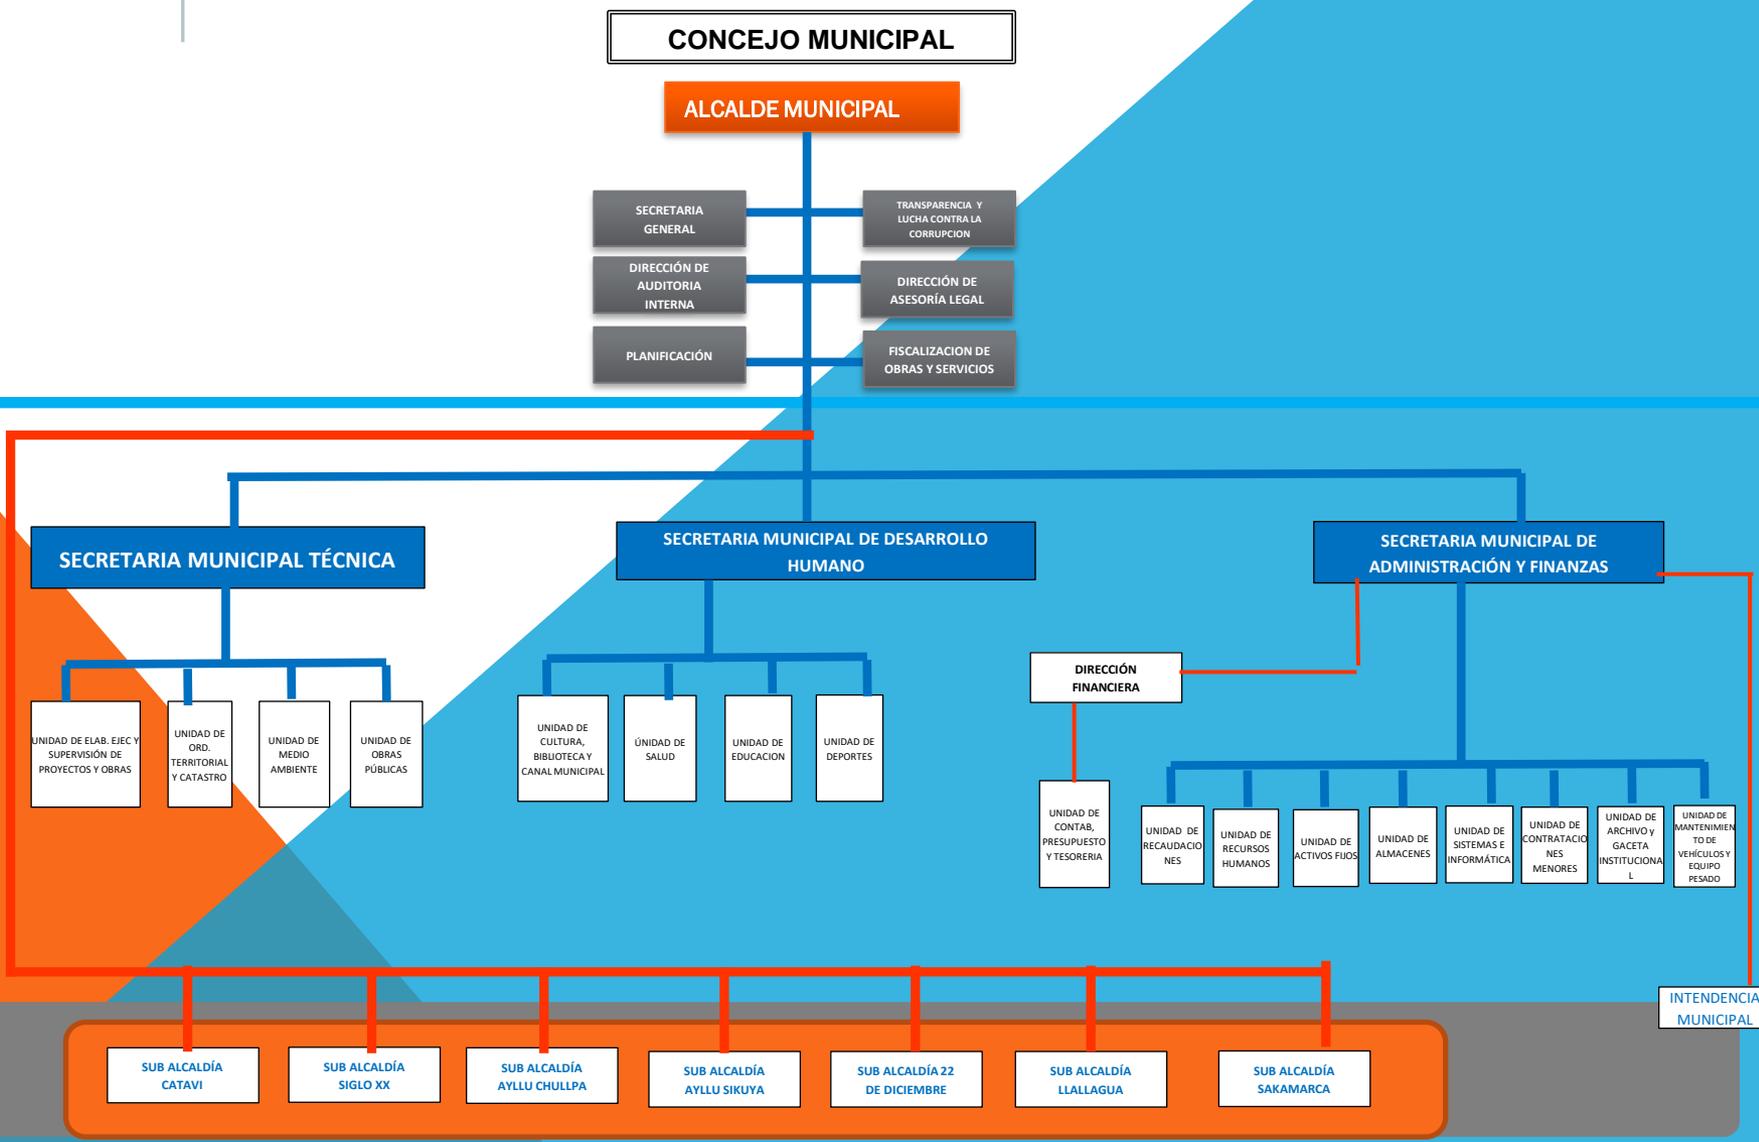

De acuerdo a la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, ley N° 482 del 9 de enero del 2014, Art. 4. (Constitución del Gobierno Autónomo Municipal) los Gobiernos Autónomos Municipales están constituidos por:

- a **Concejo Municipal,**
- b **Órgano Ejecutivo.**

El presupuesto Municipal se elaborara bajo los principios de coordinación y sostenibilidad y este está conformado por el presupuesto del Órgano Ejecutivo y el presupuesto del Concejo Municipal.



Artículo 24. (Estructura organizativa) según la ley 482 el órgano ejecutivo estará conformado por:

- a La alcaldesa o el alcalde municipal.
- b Las Secretarías Municipales.
- c Sub Alcaldías.

La Ley 482, Artículo 26. Parágrafo 20.-
Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto.



TRANSFORMAR LLALLAGUA:

Se está transformando y consolidado en una ciudad intermedia, de oportunidades con infraestructura urbana y rural de vanguardia, con mayores niveles de acceso a:

a **servicios básicos**

b **Mejorar la Educación**

c **Mejorar la Salud**



d **Con avances cualitativos de desarrollo humano.**

V
-
S
-
Z

GENERAL:

Impulsar el desarrollo Integral, sustentable de Transformación del Municipio de Llalagua Trabajando en la mejora de la Educación, Salud, Servicios Básicos, Infraestructura, Seguridad Ciudadana y otros, tanto en el área urbana y el área rural del Municipio.

ESTRATEGICOS:

- a) Ejecutar El Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo
- b) Optimizar y focalizar la inversión pública municipal en la ejecución de proyectos de infraestructura Urbana y Rural
- c) Priorizar la Transparencia como paradigma

RECURSOS POA 2022



1.- ASIGNADOS 2022 M.E.F.P. Y REGALIAS

Cuadro N° 1

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Coparticipación Tributaria	27.729.983	12.387.021	-15.342.962
2	Recursos IDH	10.281.411	3.821.430	-6.459.981
3	Recursos Regalías Mineras	550.000	505.390	-44.610
4	Por subvenciones Personas con discapacidad	44.373	22.187	-22.186
	TOTAL	38.605.767	16.736.029	-21.869.738

2.- RECURSOS PROPIOS 2022

Cuadro N° 2

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Recursos Propios	8.000.000	2.475.387	-5.524.613
	TOTAL	8.000.000	2.475.387	-5.524.613



Fuente: Dirección Financiera

3.- SALDOS 2021

Cuadro N° 3

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
1	Saldos Caja Bancos 2021	17.698.146	17.698.146	0
	TOTAL 2	17.698.146	17.698.146	0

4.- TRANSFERENCIAS

Cuadro N° 4

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA
0	Otras fuentes UPRE, MIN DE MEDIO AMBIENTE, FDI, FNDR	9.741.685	2.412.354	-7.329.331
	TOTAL 2	9.741.685	2.412.354	-7.329.331

SERVICIOS



Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS GESTION 2022

Cuadro Nº 5

Nº	FUENTE	PROGRAMADO	PERCIBIDO
1	Recursos Asignados 2022	38.605.767	16.736.029
3	Recursos propios	8.000.000	2.475.387
3	Saldos Caja Bancos 2021	17.698.146	17.698.146
4	Recursos de Contra Parte (Transferidos)	9.741.685	2.412.354
	TOTAL DE RECURSOS	74.045.598	39.321.916

TOTAL PROGRAMADO POA 2022


74.045.598,00 Bs

Fuente: Dirección Financiera

R
E
C
U
R
S
O
S

PROGRAMA ZONIC

- 1 GASTOS RECURRENTE OBLIGATORIOS POR LEY
- 2 GASTOS RECURRENTE POR COMPETENCIAS MUNICIPAL
- 3 GASTOS PARA CONVENIOS
- 4 GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO
- 5 GASTOS PARA INVERSION (Disponible para Formular)



DESGLOSE DE GASTO POR PARTIDA

a) Programas e Inversión

Cuadro N° 6

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
1	PROM. Y FOMENTO A LA PROD. AGROPECUARIA	1.240.625	483.952	756.673	39
2	SANEAMIENTO BASICO	283.523	49.874	233.649	18
3	CONST. Y MANT. DE MICRORIEGOS	318.593	-	318.593	0
4	DES. Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	750.000	174.442	575.558	23
5	ASEO URBANO MANEJO Y TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	1.020.000	251.161	768.839	25
6	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	142.675	101.820	40.855	71
7	INFRAESTUCTURA URBANA Y RURAL	5.546.327	547.936	4.998.391	10
8	GESTION DE CAMINOS VECINALES	461.784	144.117	317.667	31
9	SERVICIO DE CATASTRO URBANO RURAL	700.000	173.185	526.815	25
10	GESTION DE SALUD (2)	17.820.497	4.238.119	13.582.378	24

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

Nº	DETALLE PARTIDA DE INVERSION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	%
11	GESTION DE EDUCACION	10.766.843	994.619	9.772.224	9
12	DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE	6.537.093	74.327	6.462.766	1
13	PROM. Y CONSERV. DE CULTURA Y PATRIMONIO	150.000	22.135	127.865	15
14	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	100.000	16.592	83.408	17
15	PROM.POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	4.835.413	1.423.689	3.411.724	29
16	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (3)	300.000	116.515	183.485	39
17	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	250.000	79.083	170.917	32
18	GESTION DE RIESGOS	404.012	223.322	180.690	55
18	RECURSOS HIDRICOS	5.713.242	30.000	5.683.242	1
19	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	393.905	10.249	383.656	3
20	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.808.937	763.053	4.045.885	16
TOTAL		64.975.602	10.685.578	54.290.023	16

B) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MPAL.

Cuadro N° 7

N°	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	1.077.894	270.339	807.555
2	SERVICIOS NO PERSONALES	72.200	23.750	48.451
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.200	16.252	56.948
	SUB TOTAL	1.223.294	310.341	912.953



25%

ZONCE

ZONAFIN

C) GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Cuadro N° 8

Nº	DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
1	SERVICIOS PERSONALES	6.803.965	2.228.394	4.575.571
2	SERVICIOS NO PERSONALES	305.821	68.777	237.044
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	733.915	152.611	581.304
4	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	3.000	-	3.000
5	OTROS GASTOS	-	398.892	-398.892
	SUB TOTAL	7.846.702	2.848.674	4.998.027



36%

Fuente: Dirección Financiera

TOTAL DE EJECUCION SOBRE LO PROGRAMADO

Cuadro N° 9

No	DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	%
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
1	GASTOS DE INVERSION	64.975.602	10.685.578	54.290.023	16
2	GASTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1.223.294	310.341	912.953	25
3	GASTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	7.846.702	2.848.674	4.998.027	36
	TOTAL	74.045.598	13.844.592	60.201.004	19



19%

Fuente: Dirección Financiera


ZONAJE EJECUTIVO

EJECUCION FISICA (Procesos de contratación Nuevos)


Nº	MODALIDAD	CUANTIA	TIPO DE CONTRATACION	CANTID.
1	CONTRATACION MENOR	De Bs20.000 hasta Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)	OBRAS	
			ADQUISICIONES	6
			CONSULTORIAS	1
			SERVICIOS GENER.	
2	APOYO NACIONAL A LA PRODUCCION Y EMPLEO (ANPE)	Mayor a Bs 50.000.-(00/100 BOLIVIANOS) HASTA Bs.1.000,000 UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS	OBRAS	3
			ADQUISICIONES	23
			CONSULTORIAS	
			SERVICIOS GENER.	3
3	LICITACION PUBLICA (LP)	Mayor a Bs 1.000.000 (UN MILLON UN 00/100 BOLIVIANOS ADELANTE)	OBRAS	
			ADQUISICIONES	1
			CONSULTORIAS	
			SERVICIOS GENER.	1
4	CONTRATACION POR EXCEPCION	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	
			ADQUISICIONES	3
			CONSULTORIAS	
			SERVICIOS GENER.	
5	CONTRATACION DIRECTA	SIN LIMITE DE MONTO	OBRAS	24
			ADQUISICIONES	
			CONSULTORIAS	
			SERVICIOS GENER.	
TOTAL PROCESOS DE CONTRATACION				65

Z
O
N
A
E
C
O
N
O
M
I
C
A

EJECUCION FISICA VS FINANCIERA

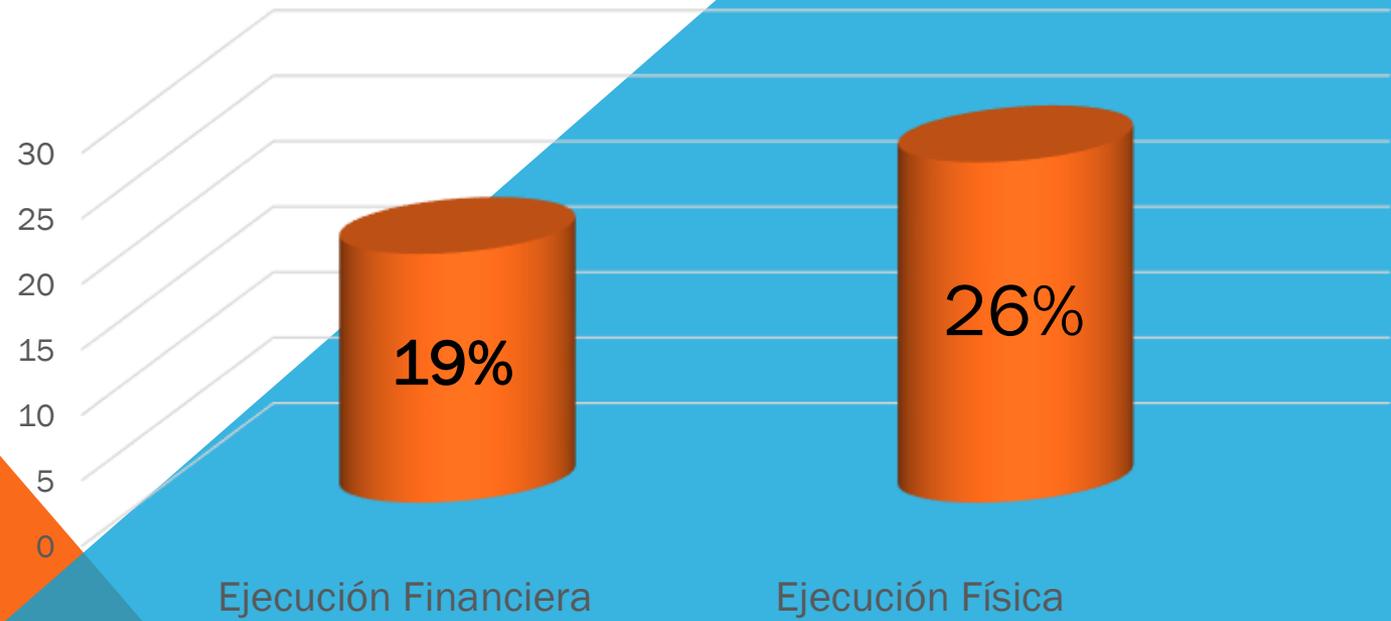

TRABAJO DESARROLLADO



**...!TRABAJANDO POR UNA CIUDAD DE VERDAD DEL
NORTE POTOSÍ!..**

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA





MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA CON LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA"



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	ASOCIACION ACCIDENTAL KADEMCORP BOLIVIA Y ASOCIADOS
SUPERVISOR	ING. ALEJANDRO PEREZ JORGE
TIEMPO DE EJECUCIÓN	497 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	52%
FECHA DE ENTREGA	27/04/2022

FINANCIAMIENTO FDI	EJECUTADO	SALDO
2.089.801.05	1,091.168.4	998.633,1

- Proyecto tiene un avance físico del 100%





MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FRUTICOLA CON LA INTRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES MEJORADAS EN LAS COMUNIDADES DEL AYLLU SIKUYA" (SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	ALEJANDRO PEREZ JORGE
SUPERVISOR	Ing. Omar Cruz Villegas
TIEMPO DE EJECUCIÓN	180 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	-

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
39.476.80	0	39.476.80

- Proyecto tiene una avance físico del 100%



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS





AMPLIACIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO EN EL CABILDO QOLLANA AYLLU SIKUYA (CONVENIO FPS)

DATOS DEL PROYECTO



IMAGEN ACTUAL

EMPRESA CONTRATISTA	ATRALID
SUPERVISOR	ING. VEIMAR CASTRO
TIEMPO DE EJECUCIÓN	240 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	-

FINANCIAMIENTO FPS	EJECUTADO	SALDO
1,708,768.38	0	1,708,768.38

- Proyecto tiene una avance físico del 100% ejecutado por el FPS





AMPLIACION SISTEMA DE MICRORIEGO PURCILAMAYU AYLLU SIKUYA (CONVENIO FPS)



DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	SERVIC S.R.L.
SUPERVISOR	ING. JUAN LUIS MARTINEZ
TIEMPO DE EJECUCIÓN	240 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	-

FINANCIAMIENTO FPS	EJECUTADO	SALDO
2,058,517.38	0	2,058,517.38

- Proyecto tiene una avance físico del 100% ejecutadp por FPS





ELABORACIÓN ESTUDIO DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN

E.D.T.P. "MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MEDIA DEL RIO VERDE"



DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSTRUMAG
SUPERVISOR	ING. Omar Cruz V.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	110 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	20%
FECHA DE ENTREGA	-

FINANCIAMIENTO FPS	FINANCIAMIENTO GAMLL
133,600.00	33,400.00

- Proyecto tiene una avance físico del 100%



DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE





Unidad de Medio Ambiente



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Apoyo con mecanización agrícola a distritos productores agrícolas con técnico y maquinaria para mejora de producción.
- Gestión en manejo de cuenca para la descontaminación de los ríos contaminados por el trabajo minero.
- Fiscalización y supervisión de los proyectos productivos.
- Convenios inter institucionales con UNSXX y ITSIA.
- Mantenimiento de parques y áreas verdes
- Coordinación de actividades con el encargado/a de mecanización agrícola áreas verdes, juzgado agroambiental, SENASAG- POTOSI, FONABOSQUE.

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
750.000,00	178.012,08	571.987,92	23,73%

- **Salario Personal de Servicio**
- **Adquisición de equipos, insumos, materiales y suministros.**
- **Adquisición de combustible.**

SANEAMIENTO BASICO





ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO BOMBA AGUAS ABAJO REPRESA KATIRI



DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA & CONSULTORA ELECTRO POOL
SUPERVISOR	Ing. Rubén Charque Calizaya
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	100%
FECHA DE ENTREGA	14/01/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
119.999,00	119.999,00	0,00

- Proyecto tiene una avance físico/financiero del 100%





CONSTRUCCIÓN LÍNEA MEDIA TENSIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO BOMBA AGUAS ABAJO REPRESA KATIRI

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA & CONSULTORA ELECTRO POOL
SUPERVISOR	Ing. Rubén Charque Calizaya
TIEMPO DE EJECUCIÓN	20 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	100%
FECHA DE ENTREGA	19/01/2022



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
49.923,95	49.923,95	0,00

- El proyecto tiene un avance físico/financiero del 100%



ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS





Gastos de Funcionamiento Dirección de Aseo Urbano



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza de sectores públicos.
- Recolección y transporte de residuos.
- Disposición final de Residuos.
- Aprovechamiento de Material Reciclable
- Manejo de Residuos Bio-infecciosos.
- Campañas de Limpieza, en los diferentes distritos.
- Erradicación de Micro basurales.
- Seguimiento de Proyectos.

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

1.020.000,00

275.177.79

744.822.21

26%

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de equipos, materiales y suministros.


VENTA DE MATERIAL RECICLADO

MATERIAL	SUB TOTAL	PRECIO	TOTALES
ALUM. DURO	130,00	5	650,00
ALUM. TAQUIÑ	1954,50	4	7818,00
PLASTICOS	4498,50	1,3	5848,05
NYLON	1062,00	1,5	1593
PAPEL	1935,00	1	1935
BOTELLA PET	10999,00	0,4	4399,6
V. BLANCO	0,00	3	0,00
V. CAFÉ	0,00	2	0,00
V. VERDE	0,00	1	0,00
COBRE	35,00	25	875,0
TOTAL KG	20614,00		
TOTAL RECAUDADO			23118,65

Venta correspondiente trimestre

La venta de material reciclado anual:
CANTIDAD: 20614 kg/trimes. = 20,6 Toneladas
RECAUDADO: 23.118,65 bs
INCREMENTO: En un 0,4 %

Ventas de material reciclado

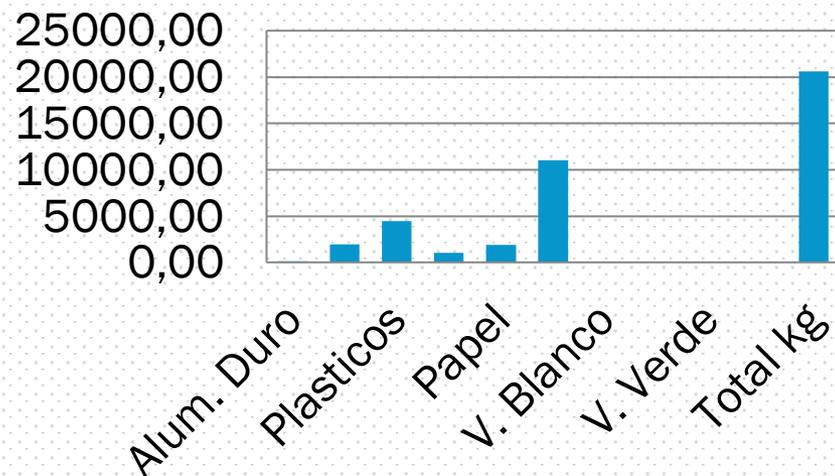

G.A.M.LL.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

GESTIÓN 2022

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO





ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA BARRIO LINDO DISTRITO CATAVI



IMAGENES DE LOS MATERIALES

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	“ELECTRO POOL CONSTRUCTORA & CONSULTORA”
SUPERVISOR	VICTOR QUISPE OSSIO
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	89,13 %
FECHA DE ENTREGA	20/12/2021

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
16.830,00	15.000,00	1.830,00



- Adquisición ejecutada físicamente al 100%

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL





“MATENIMIENTO Y REFACCION UNIDADES EDUCATIVAS” (REFACCION UNIDAD EDUCATIVA LIBERTAD SAKAMARKA)



DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA “YAPURA
SUPERVISOR	GADIEL SOTOMAYOR ORDOÑEZ
TIEMPO DE EJECUCIÓN	30 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	03/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
45.233,18	0	45.233,18

• Proyecto ejecutado físicamente al 100%





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
FISCAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Potosí - Bolivia



**“MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS” (AMPLIACION CORDONES PARA ACERA
AV. MONTES y CALLE ALIANZA DISTRITO SAKAMARKA)**



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	“CONSTRUCTORA YAPURA”
SUPERVISOR	GADIEL SOTOMAYOR ORDOÑEZ
TIEMPO DE EJECUCIÓN	55 D/C
AVANCE FISICO	50 %
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	EN EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.537,75	0	99.537,75

- Proyecto ejecutado físicamente al 50 %





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
FISCAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Potosí - Bolivia



“REFACCION ARBITRIOS MUNICIPALES”
(REFACCION CUBIERTA EDIFICIO MUNICIPAL)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	“CONSTRUCTORA YAPURA”
SUPERVISOR	GADIEL SOTOMAYOR ORDOÑEZ
TIEMPO DE EJECUCIÓN	52 D/C
AVANCE FISICO	40 %
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	EN EJECUCION

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
98.854,01	0	98.854,01



• Proyecto ejecutado físicamente al 40 %



“CONSTRUCCION MINI MERCADO ZONA 2



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	“ TRAVEJ S.R.L”
SUPERVISOR	Ing. Silvia López S.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	150 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	PARA INICIO DE OBRA

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
655.706,17	432.244,16	223,462,00

- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %





“CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA POLIFUNCIONAL ZONA 9



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA YATO”
SUPERVISOR	ING. SILVIA LÓPEZ SIACARA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	14 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	24/05/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
14.000,00	0	14.000,00

- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %



“Mantenimiento de vías urbanas y refacción Muro de Contención Calle Topater Zona 9”



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA “ ROLANDO CHAMBI QUISPE ”
SUPERVISOR	ING. SILVIA LÓPEZ SIACARA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	26/05/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
14.995,75	0	14.000,00

- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %



“CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDAD ZONA 6 DISTRITO 22 DE DICIEMBRE (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN)”



IMAGEN ACTUAL

PRESUPUESTO PROGRAMADO	COSTO DEL PROYECTO
47.864,00 Bs	33.258,50 Bs

DATOS DEL PROYECTO

Ejecución Directa	Mano de obra de la Sub Alcaldía – Obras Publicas
SUPERVISOR	Mario Caisina Quispe
TIEMPO DE EJECUCIÓN	48 D/C
AVANCE FISICO	100 %
FECHA DE ENTREGA	08/03/2022



- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %



"CONSTRUCCIÓN BAÑO HIGIÉNICO U. E. MONSEÑOR CLETO LOAYZA"

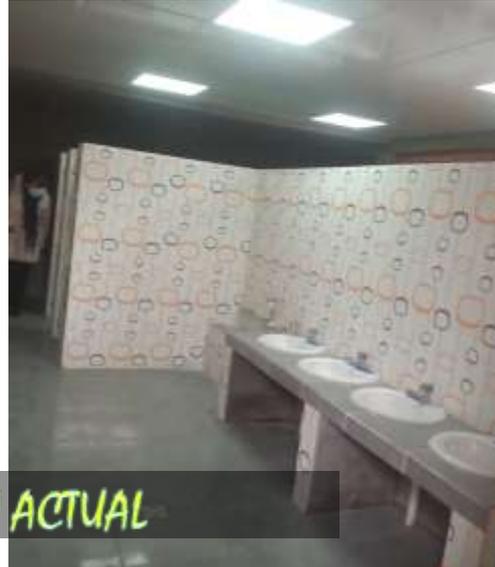


IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL "YACIK"
SUPERVISOR	Mario Caisina Quispe
TIEMPO DE EJECUCIÓN	48 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	93 %
FECHA DE ENTREGA	08/03/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
72.593,00	67.509,50	5.034,00



- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %



“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EL CORTE Y NIVELACIÓN DEL PROYECTO “CAMPO FERIAL NORTE POTOSÍ”



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	“Constructora y Consultora SAENCO”
SUPERVISOR	Mario Caisina Quispe
TIEMPO DE EJECUCIÓN	100 D/C
AVANCE FISICO	93 %
AVANCE FINANCIERO	0 %
FECHA DE ENTREGA	11/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
395.531,00	366.964,61	28.567,00

- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %





Mejoramiento de Vía con Muro de Contención la Revuelta Distrito Siglo XX



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA CONSULTORA PERDAF S.R.L.
SUPERVISOR	ING. JHOVANA GONZALEZ A.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	34 D/C
AVANCE FISICO	92%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	11/05/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.019,64	0,00	99.019,64

- Proyecto ejecutado físicamente al 92%



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



Ampliación de Cordones de H° C° Av. Cancañiri Distrito Siglo XX



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAENCO
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCIA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	30 D/C
AVANCE FISICO	55%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	17/05/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.607,23	0,00	99.607,23

- Proyecto ejecutado físicamente al 55%



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



LOTE N°1 Const. Enlosetado Avenida Cancañiri (Llalagua)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA "MATCONY"
SUPERVISOR	Externo
TIEMPO DE EJECUCIÓN	90 D/C
AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
864.821,05	0,00	864.821,05

- Proyecto se encuentra en proceso de contratación



Construcción Alcantarillado Revuelta Camp. Cancañiri Siglo XX



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA "F.J.C."
SUPERVISOR	A asignar
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
44.276,05	0,00	44.276,05

- Proyecto en proceso de contratación



Refacción Casa Comunal Camp. Salvadora Siglo XX



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA CONSULTORA "EDEN"
SUPERVISOR	A asignar
TIEMPO DE EJECUCIÓN	27 D/C
AVANCE FISICO	0%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
44.300,57	0,00	44.300,57

- Proyecto en proceso de contratación



REFACCIÓN ARBITRIOS MUNICIPALES (REFACCIÓN CUBIERTA ZONA ESTE MERCADO CENTRAL)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAENCO
SUPERVISOR	Ing. Rubén Charque Calizaya
TIEMPO DE EJECUCIÓN	30 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	29/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.927,53	0,00	99.927,53

- Proyecto tiene avance físico del 100% y falta hacer la cancelación de las planillas



GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES





Ampliación de Cordones de H° C° Av. Cancañiri Distrito Siglo XX



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAENCO
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	30 D/C
AVANCE FISICO	55,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	17/05/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.607,23	0	99.607,23

- Proyecto ejecutado físicamente al 55,00 %



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



SERVICIO DE CATASTRO URBANO





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA

Potosí - Bolivia



Unidad de Ordenamiento Territorial (U.N.O.T)

DETALLE O TIPOLOGIA DE LOS CASOS ATENDIDOS (ENE-JUL)

ENE-ABR

Revisión, inspección y aprobación de planos

205

Autorizaciones de Construcción

52

Trabajo de evaluación de carpetas (minutación) por el equipo multidisciplinario

21

Minutas de transferencia de COMIBOL AL G.A.M.LL.

12

ACTIVIDADES REALIZADAS POR UNOT

• 1 Responsable de UNOT

• Notificadores

• Secretaria

• Asesor Legal

PLANO DEMOSTRATIVO

ESCALA INDICADA

DATOS

DEPARTAMENTO : Potosí
 PROVINCIA : Rafael Bustillo
 MUNICIPIO : Llalagua
 DISTRITO : Llalagua
 ZONA / URB :
 DIRECCION : Barrio 25 de Mayo

RELACION DE SUPERFICIES

BARRO 25 DE MAYO

ELABORADO POR: | APROBADO POR:



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL TÉCNICA
Potosí- Bolivia



Unidad de Ordenamiento Territorial (UN.O.T)

N°	Denominacion del Terreno	DISTRITO	AREA
1	BARRIO SALVADORA B-1	Siglo XX	15583,626
2	BARRIO 25 DE MAYO	Llalagua	17200,621
3	BARRIO COOPERATIVAS –BELLA VISTA	Siglo XX	48632,736
4	BARRIO CINCO CASAS – B	Siglo XX	7490,792
5	BARRIO CALVARIO	Llalagua	86799,23
6	BARRIO RICON PACEÑO	Siglo XX	41415,62
7	BARRIO CANCAÑIRI II	Siglo XX	30330,007
8	BARRIO SALVADORA A-1	Siglo XX	5704,58
9	ZONA RESIDENCIAL	Catavi	72328,02
10	ZONA 12 DE FEBRERO	Catavi	33635,07
11	ZONA CHALET	Catavi	45657,29
12	ZONA TIPO H	Catavi	85593,72
TOTAL GENERAL m2			490371,312
TOTAL GENERAL HECTAREAS			49,04



Unidad de Ordenamiento Territorial (UN.O.T)



- Asesor Legal
- Arquitecto
- Trabajador Social
- Notificador



OTRAS TAREAS O ACTIVIDADES A CARGO DE UN.O.T.

- Actualización del plano Catastral
- Regularización de barrios y/o urbanizaciones
- Plano Director Distrito Siglo XX
- Plano Director Distrito Catavi
- Inspecciones y Aprobación de Planos



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



GESTIÓN DE SALUD





Apoyo funcionamiento de Salud

Nº	1 er NIVEL	CANTIDAD
1	Lic. En enfermeria	16
2	Medico General	3
3	Farmacutico	3
4	Responsable de la FIM	1
5	Odontologo	2
6	Estadistico	2
7	Auxiliar de Enfermeria	4
9	portero	1
10	Chofer de ambulancia	1
11	Personal de servicio (limpieza)	4
12	Sereno	3
13	Tecnico en resago	1
Subtotal		41



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
7,000.000.00	1,800.349.70	5,200.868.3	25.72%

- **Cancelación de Servicios Básicos.**
- **Sueldos del personal eventual de salud PRIMER NIVEL entre personal Administrativo, Clínico y de servicio se tienen 41 personas contratadas.**



Apoyo funcionamiento de Salud

Nº	2º NIVEL H.G.M.O	CANTIDAD			Nº	2º NIVEL H.G.M.O	CANTIDAD	Nº	2º NIVEL H.G.M.O	CANTIDAD														
1	Medico General	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>2º NIVEL H.G.M.O</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Personal de servicio en gral. (0 limpieza, 0 cocinera, Olavanderia)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guardia camillero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chofer-Portero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Portero</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>mantenimiento</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Nº	2º NIVEL H.G.M.O	CANTIDAD	1	Personal de servicio en gral. (0 limpieza, 0 cocinera, Olavanderia)	10	2	Guardia camillero	1	3	Chofer-Portero	1	4	Portero	3	5	mantenimiento	1	1	Trabajadora Social	1
Nº	2º NIVEL H.G.M.O	CANTIDAD																						
1	Personal de servicio en gral. (0 limpieza, 0 cocinera, Olavanderia)	10																						
2	Guardia camillero	1																						
3	Chofer-Portero	1																						
4	Portero	3																						
5	mantenimiento	1																						
2	Bioquimico/Farmaceutico	5		2	Secretaria Hospital	1																		
3	Farmaceutico	3		3	Contador	1																		
4	Ecografista	1		4	Responsable de recursos humanos	1																		
5	Radiologo	1	5	Encargado de almacenes	1																			
6	Odontologo	1	6	activos fijos	1																			
7	Lic. de Enfermeria	10	7	Informacion	1																			
8	Auxiliar de Enfermeria	1	8	Caja recaudaciones	2																			
9	Tec Laboratorio	2	9	Admision	2																			
10	Asistente de laboratorio	1	10	Responsable de mantenimiento	1																			
			11	Tecnico de sistemas	1																			

Sueldos del personal eventual de salud SEGUNDO NIVEL H.G.M.O. entre personal Administrativo, Clínico y de servicio se tienen 55 personas contratadas.



Apoyo funcionamiento UNI



IMAGEN DE REFERENCIA



IMAGEN DE REFERENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Promoción de las prácticas alimentarias saludables, la lactancia materna por sus beneficios entre niños y niñas desde el nacimiento.

- En el marco de la Política Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI)

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
100.000,00	35.332,02	76.356,98	31,63 %



Gastos de funcionamiento Centro de Rehabilitación para personas con Discapacidad



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Atención en salud a las personas con discapacidad en los centros de habilitación y rehabilitación.



IMAGEN DE REFERENCIA

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
217,927.00	18,983.74	198,943.26	8.71%

- En el marco de la Ley 223 (Ley General para personas con discapacidad)



Apoyo a programas de Salud



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Campañas participativas realizadas hacia la población en general en sus diferentes programas:
VIH - SIDA, DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - TUBERCULOSIS - PAI - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- MI SALUD - FIM DE REFERENCIA, ADOLESCENTES - BONO JUANA AZURDUY - ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA recién están en procesos de ejecución

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00	1,091.94	248.908,06	0.44

- Se realizaran campañas de promoción para la salud y la prevención de enfermedades.



Adquisición de Nutribebes

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se procedió a la convocatoria pública la cual fue declarada desierta. Se encuentra en curso.



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

500.000,00

0,00

500.000,00

0%

- De acuerdo al Programa Desnutrición Cero.



Funcionamiento Centro Municipal de Zoonosis



IMAGEN DE REFERENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Campaña de vacunación antirrábica.
- Esterilización de animales
- Eutanasia y curación de animales.




IMAGEN DE REFERENCIA

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

118.514,00

11,443.83

107,069.17

9.66%

- Sueldos y salarios personal



Servicios de Salud Universal y Gratuito



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Adquisición de medicamentos, insumos médicos, insumos odontológicos bajo la modalidad ANPE

LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

MODALIDAD	DETALLE	MONTO Bs.
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Medicamentos Para Los Centros De Salud Primer Nivel Gestion 2022)	721,341.73
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Medicamentos Para Los Puestos De Salud Primer Nivel Gestion 2022)	357,479.70
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus" (Adquisicion Complemento Nutricional Para El Adulto Mayor Carmelo Gestion 2022)	499,500.00
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Abarrotes Para La Preparacion De Alimentos Para La Atencion De Los Pacientes Beneficiados Por La Ley 1152 Para La Gestion 2022)	132,749.00
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Insumos Medicos Para Los Centros Y Puestos De Salud Gestion 2022)	139,818.82
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Reactivos De Laboratorio Del Seguro Universal De Salud Y Gratuita Sus Para El Hospital General Madre Obrera 1er Semestre Gestion 2022)	222,015.00
CM	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Oxigeno Medicinal Para El Primer Trimestre Gestion 2022 Para Atencion De Los Pacientes Que Son Beneficiados Por La Ley 1152 Hospital General Madre Obrera)	32,000.00
EX	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus" (Adquisicion De Verduras, Raices, Tuberculos, Hierbas Frescas Y Frutas Para La Preparacion De Alimentos Para La Atencion De Los Pacientes Beneficiados Por La Ley 1152 Sus Gestion 2022)	119,280.00
EX	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita - Sus" (Adquisicion De Pollo, Carne Y Huevo Para La Preparacion De Alimentos Para La Atencion De Los Pacientes Beneficiados Por La Ley 1152 Sus Gestion 2022)	123,792.00
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Insumos Odontologicos Gestion 2022 Para Primer Nivel)	291,298.48
ANPE	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Medicamentos Para El Sistema Unico De Salud Ley 1152 Para El Primer Semestre De La Gestion 2022 Para El Hospital General Madre Obrera)	668,231.20
ANPP	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion De Insumos Medicos Para El Sistema Unico De Salud Ley 1152 Sus Primer Semestre De La Gestion 2022 Para El Hospital General Madre Obrera)	299,745.00
CM	"Servicios De Salud Universal Y Gratuita -Sus" (Adquisicion Electrodo Y Tuberias Para El Equipo Analizador De Electrolytos Del 1° Semestre Gestion 2022)	46,240.00

EN PROCESO DE CONTRATACION

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

4.298.147.00

5,871.22

4.292,275.78

0.14%

- Adquisición de complemento nutricional CARMELO en proceso

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



Prevención, control y atención del **CORONAVIRUS**



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cancelación de sueldos a los Consultores.
- Compra de oxígeno para el COVID -19

MODALIDAD	DETALLE	MONTO Bs.
ANPP	"Prevención Control Y Atención Del Coronavirus" (Adquisición De Reactivos De Antígeno Nasal Y Ferritina Para La Detección De COVID - 19 Primer Trimestre Gestión 2022)	282,000.00
ANPP	"Prevención Control Y Atención Del Coronavirus" (Adquisición De Prueba Antígeno Nasal Para La Detección De Covid - 19 En Los Centros De Salud De Primer Nivel Del Municipio De Llacabunga Gestión 2022)	280,000.00

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
2,419.532.00	559.963.14	1,851.910.86	23.46%

- Adquisición de **PRUEBAS ANTÍGENO NASAL** para la detección de la enfermedad del COVID-19

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



GESTIÓN DE EDUCACIÓN





Provisión Alimentación Complementaria Escolar Área Concentrada Gestión 2022



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley N° 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 12.251 estudiantes (nivel inicial, primaria y secundaria).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
4.682.740,00	0,00	4.682.740,00	0%

- La Provisión de Desayuno Escolar se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 4.664.462,79 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 79/100 BOLIVIANOS), teniendo a 12.251 estudiantes beneficiarios(as) de 23 unidades educativas en el área concentrada.





Provisión Alimentación Complementaria Escolar Área Concentrada Gestión 2022

DÍA 1: LUNES	DÍA 2: MARTES	DÍA 3: MIÉRCOLES	DÍA 4: JUEVES	DÍA 5: VIERNES
Leche Chocolatada 140 ml (Bs. 1,50)	Yogurt batido en vasito 90 gr. Bs. 1,50	Leche con avena 140 ml Bs. 1,50	Yogurt en Sachet 100 ml Bs. 1,00	Cereal para Desayuno 20gr Bs. 1,00
Galleta salada 35 gr. Bs. 0,80	Galleta Dulce Wafler 60 gr. Bs. 1,30	Granola con uva seca 30 gr. Bs. 1,00	Galleta Dulce con relleno de crema 38 gr. Bs. 1,00	





Provisión Alimentación Complementaria Escolar Área Concentrada Gestión 2022





Provisión Alimentación Complementaria Escolar Área Dispersa Gestión 2022



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Alimento complementario según la Ley N° 622.
- Distribución del Desayuno Escolar a 1.047 estudiantes (nivel inicial, primaria y secundaria).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
406.600,00	0,00	406.600,00	0%

- La Provisión de Desayuno Escolar se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 404.756,80 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 80/100 BOLIVIANOS), teniendo a 1.047 estudiantes beneficiarios(as) de 18 unidades educativas en el área dispersa.





Funcionamiento Programa PAPI



IMAGEN ACTUAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se espera la Notificación para la Firma del Convenio entre GAMLL y SEDEGES POTOSI para reapertura los 21 Centros PAPI (18 en área concentrada y 3 en área dispersa).



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

300.000,00

0,00

300.000,00

0%

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Encargada y 18 Serenas).
- Material de escritorio.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DESARROLLO HUMANO
Potosí- Bolivia



Funcionamiento Programa PAPI





Funcionamiento Establecimientos Educativos



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
270.000,00	0,00	270.000,00	0%

- Servicio de Wi Fi para 11 Unidades Educativas.
- Servicios Básicos de las Unidades Educativas.
- Fondos en Auxilio.
- Servicios de imprenta y otros.



Apoyo al Funcionamiento Dirección Distrital



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

40.000,00

0,00

40.000,00

0%

- Servicios básicos.
- Material de Escritorio y otros.



Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Uyuni Ayllu Sikuya



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
200.000,00	0,00	200.000,00	0%

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Coordinadora, 13 Anfitrionas y 45 Becarios).
- Material de escritorio.
- Materiales didácticos y educativos .



Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Uyuni Ayllu Sikuya





Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Jiskanki Ayllu Chullpa



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
150.000,00	0,00	150.000,00	0%

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Coordinador, 9 Anfitrionas y 24 Becarios).
- Material de escritorio.
- Materiales didácticos y educativos.



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
Potosí- Bolivia



Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Jiskanki Ayllu Chullpa





Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Capunita Ayllu Sikuya



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

127.000,00

0,00

127,000,00

0%

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Coordinadora, 9 Anfitrionas y 15 Becarios).
- Material de escritorio.
- Materiales didácticos y educativos .



Hospedaje Estudiantil en Familia U.E. Capunita Ayllu Sikuya





Transporte Escolar Ayllu Chullpa Gestión 2022

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA TICOL
SUPERVISOR	VLADIMIR TICONA CASTRO
TIEMPO DE EJECUCIÓN	118 D/C

- HUAYLLOMA - WALQUERI
- SIVINGANI - VICTATA
- SARAQUE - IRRUPAMPA - PINTATA
- NAVIDAD - JANKO CALANI
- WICHOCOLLO - QUITARJANI - SIRCUYO
- KUCHUYO
- FALAUCA NI - CHACALACAÑA
- SOL DE MAYO - AYONOMA
- CALAMARCA - UMIRI
- MARKA KUNCA - CUMJASI



IMAGEN ACTUAL



- CHACHACOMANI
- CONDOR CUYO
- ANDAVILLQUE
- CHUARIRI
- SIRI SIRI - VENTILLA
- NAVIDAD - SIRCUYO
- QUITARJANI
- NAVIDAD
- KULTA

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

400.000,00

0,00

400,000,00

0,00

- El Transporte Escolar Ayllu Chullpa se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 398.722,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00/100 BOLIVIANOS).



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DESARROLLO HUMANO
Potosí - Bolivia



Transporte Escolar Ayllu Chullpa Gestión 2022





Transporte Escolar Avllu Sikuya Gestión 2022




IMAGEN ACTUAL

RUTA	DE	A
1	INCACHALLWIRI - LLALLAGUITA	U.E. SAJSANI
4	SAJSANI - INCA CHALLWIRI	U.E. UYUNI
5	MACHAYA CALA - MACHAYA GRANDE	
6	YANGA YANGANI	
7	SACA SACA	U.E. CHIRU CHIRU
8	RIO VERDE	
9	RANCHO KUCHO	U.E. SACA SACA
10	CHAQUENI	
11	JERIPOCO	U.E. UYUNI

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
323.000,00	0,00	323.000,00	0%

- El Transporte Escolar Ayllu Sikuya tiene a dos empresas contratistas adjudicadas en ejecución, el primero con un monto de Bs. 53.242,50 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 BOLIVIANOS) y el segundo contrato con un costo de Bs. 187.869,30 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 30/100 BOLIVIANOS), haciéndose un Total de Bs. 241.111,80 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO ONCE CON 80/100 BOLIVIANOS).

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA (1)	CIRILO CHOQUE GASPAR
EMPRESA CONTRATISTA (2)	BENITO GASPAR CUYO
SUPERVISOR	OMAR CRUZ VILLEGAS
TIEMPO DE EJECUCIÓN	165 D/C

IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



Transporte Escolar Ayllu Sikuya Núcleo Capunita Gestión 2022



RUTAS	2	QOANI	U.E. CAPUNITA
	3	WILAQAWA	

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	HUGO VARGAS MUELA
SUPERVISOR	OMAR CRUZ VILLEGAS
TIEMPO DE EJECUCIÓN	155 D/C

• El Transporte Escolar Ayllu Sikuya Núcleo Capunita se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 80.860,40 (OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 40/100 BOLIVIANOS).



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DESARROLLO HUMANO
Potosí - Bolivia



Transporte Escolar Ayllu Sikuya Gestión 2022





Transporte Escolar San Benito Menin



DETALLE DE LAS RUTAS:

- ✓ MERCADO CENTRAL
- ✓ SALVADORA
- ✓ SIGLO XX MONTES
- ✓ LLALLAGUA EX CONCEJO
- ✓ CAMPAMENTO 1 SIGLO XX
- ✓ CATAVI VILLA NUEVA
- ✓ SAKAMARCA VILLA NUEVA
- ✓ CANCAÑIRI

IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
77.665,00	0,00	77.665,00	0%

- Proyecto se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 60.102,00 (SESENTA MIL CIENTO DOS 00/100 BOLIVIANOS), teniendo a 70 estudiantes beneficiarios(as).



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



Transporte Escolar U.E. Mayo Nocturno



DETALLE DE LAS RUTAS:

- ✓ VILLA 22 DE DICIEMBRE (PARTE ALTA)
- ✓ SAKAMARCA Y VILLA 22 DE DICIEMBRE (PARTE BAJA)
- ✓ CATAVI
- ✓ SIGLO XX



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
45.006,00	0,00	45.006,00	0%

- Proyecto se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 37.366,00 (TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS), teniendo a 68 estudiantes beneficiarios(as).

IMAGEN DE REFERENCIA



Apoyo al funcionamiento Centro Integral Multisectorial San Benito Menin



IMAGEN ACTUAL

- Material de Eléctrico y Escritorio.
- Consultoría en Línea Servicio de Consultoría en Línea (1 Psicopedagogo, 1 Fisioterapeuta, 1 Trabajadora Social, 1 Cocinera).
- Compra de alimentos frescos (carnes y derivados, frutas y verduras).

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
138.000,00	0,00	138.000,00	0%





Programa de Post-Alfabetización



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

30.000,00

0,00

30.000,00

0%

- Servicio de Consultoría en Línea (1 Personal).
- Material de Escritorio.



Equipamiento CEAs

IMAGEN ACTUAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Compra de herramientas y materiales para los distintos centros de educación alternativa.



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
100.000,00	33.614,00	66.386,00	33,61%

- Equipamiento CEA "Santa Rita" se encuentra en ejecución con un monto de Bs. 50.000,00.
- Equipamiento CEA "Catavi" se encuentra en ejecución con un monto de Bs 50.000,00.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas de trabajo en el aula taller.



CONSTRUCCIÓN U.E. CARLOS MEDINACELLI

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA SOLCAM
SUPERVISOR	Emp. Consultora VALLECUEVAS
TIEMPO DE EJECUCIÓN	483 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	98,22 %
FECHA DE ENTREGA	27/04/2022

IMAGEN DE LA UNIDAD EDUCATIVA

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
7'186.863,29	7'059.066,15	127.797,14

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LA UNIDAD EDUCATIVA



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS (REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAENCO
SUPERVISOR	Ing. Rubén Charque Calizaya
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	19/01/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
39.987,65	0,00	39.987,65

- Proyecto ejecutado físicamente al 100%



REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS (REFACCIÓN BAÑO HIGIÉNICO U.E. MARTIN CÁRDENAS)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	HILARIÓN PACARA JORGE
SUPERVISOR	Ing. Rubén Charque Calizaya
TIEMPO DE EJECUCIÓN	30 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	93%
FECHA DE ENTREGA	17/01/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
36.677,46	34.110,04	2.567,42

- Se esta procediendo con la cancelación de la garantía del 7%



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION



REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO SIGLO XX



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA ENOSUR
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCIA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	25 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	23/03/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.820,00	0,00	99.820,00

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



REFACCIÓN U. E. MARTIN CÁRDENAS Y CLETO LOAYZA



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA INCODEPRO
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	25 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	22/03/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
39.080,00	0,00	39.080,00

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



REFACCIONES UNIDADES EDUCATIVAS TOMAS FRÍAS Y KÍNDER LITORAL

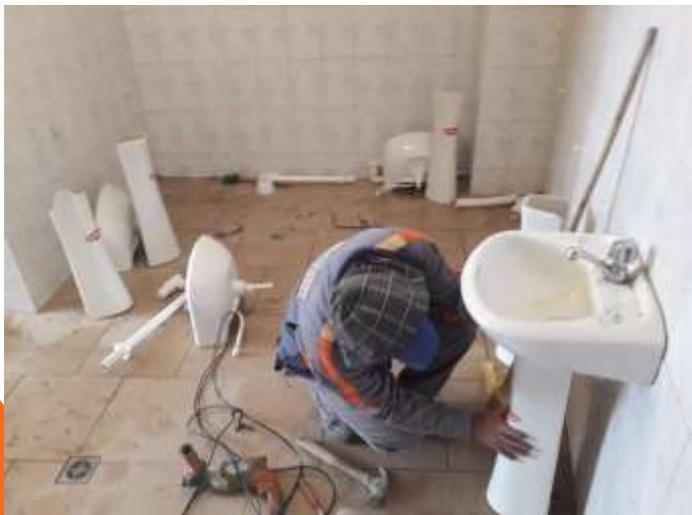


IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA "YATO"
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	25 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	01/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
30.050,80	0,00	30.050,80

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA HILARIÓN PACARA JORGE
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	25 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
50.474,54	0,00	50.474,54

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO CATAVI



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAENCO
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	30 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	12/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
99.924,83	0,00	99.924,83

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS

(REFACCIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO INDÍGENA AYLLU CHULLPA)

(REFACCIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO INDÍGENA AYLLU CHULLPA)

DATOS DEL PROYECTO



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL F.C.J.
SUPERVISOR	Vladimir Ticona Castro
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	06/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
46,802.19	0,00	46,802.19

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %

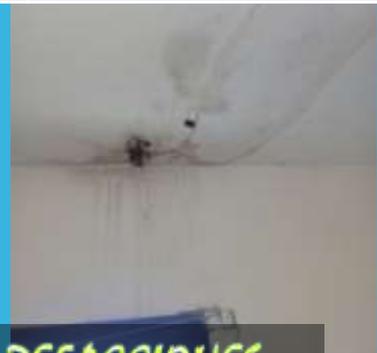


IMAGEN DE LAS REFACCIONES



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS (REFACCIÓN DE DOS AULAS UNIDAD CAPUNITA AYLLU SIKUYA)

DATOS DEL PROYECTO



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA COPA DE PIEDRA
SUPERVISOR	ING. Omar Cruz V
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	100,00 %
FECHA DE ENTREGA	23/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
25.061,93	0	25.061,93

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %





"MANTENIMIENTO Y REFACCION UNIDADES EDUCATIVAS (REFACCION DE AULAS EN CINCO UNIDADES EDUCATIVAS DEL NUCLEO UYUNI AYLLU SIKUYA)"

DATOS DEL PROYECTO



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA CONSTRUCTORA PUCA
SUPERVISOR	ING. Omar Cruz V
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	100,00 %
FECHA DE ENTREGA	19/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
48.718,73	48.718,73	0,00

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN UNIDADES EDUCATIVAS (MANTENIMIENTO DE AULAS EN TRES UNIDADES EDUCATIVAS DEL NÚCLEO UYUNI AYLLU SIKUYA)



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL YACIK
SUPERVISOR	ING. Omar Cruz V
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	23/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
25.209,03	0	25.209,03

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LLALLAGUA



IMAGEN DE LAS REFACCIONES

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	ELMIX
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	15 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	0,00 %
FECHA DE ENTREGA	13/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
29.811,50	0	29.811,50

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LAS REFACCIONES



DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE





APOYO AL DEPORTE



PROGRAMADO

800.000,00

EJECUTADO

104.860,00

SALDO

695.140,00

%

15%

- Gastos realizados en :
- Competencia de nivel Recreativo, Competitivo y Formativo, por el cual se realizaron los gasto trimestral de todas las disciplinas

- Apoyo para el funcionamiento de las asociaciones y escuelas municipales de: Futbol, Básquet, raqueta frontón, Ligas deportivas de los Ayllus



CONSTRUCCION ESTADIO IRINEO PIMENTEL ROJAS MUNICIPIO DE LLALLAGUA



IMAGEN DE LA CONSTRUCCION

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	ATRALID
SUPERVISOR	Emp. Consultora LOVA
TIEMPO DE EJECUCIÓN	416 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	76,72 %
FECHA DE ENTREGA	18/03/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
7'048.953,59	5'408.000,64	1'640.952,95

Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN DE LA CONSTRUCCION



REFACCIÓN ARBITRIOS MUNICIPALES (REFACCIÓN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (CANCHA NACIONAL)



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA UNIPERSONAL "YACIK"
SUPERVISOR	Ing. Rubén Charque Calizaya
TIEMPO DE EJECUCIÓN	25 D/C
AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO	0%
FECHA DE ENTREGA	18/04/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
26.011,38	0,00	26.011,38

- Proyecto tiene avance físico del 100% y falta hacer la cancelación de las planillas





PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO





Unidad de Cultura



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

150.000,00

29.122,00

120.878,00

100%

- Festivales en las comunidades del municipio de Llalagua
- Homenajes cívicos.

PROMOCIÓN Y POLITICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER



SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL

OBJETIVO

Contribuir a la Prevención, disminución y erradicación de la violencia familiar, y hacia la mujer, brindando tratamiento psico-socio- legal adecuado a las denuncias de Violencia Intrafamiliar

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FUNCIONAMIENTO SLIM (LEY 348)

Presupuesto programado	Ejecutado	Por ejecutar	Porcentaje
258.469,34	23.7532,10	20.937,24	91,%



G.A.M.LL.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

GESTIÓN 2022

INFORME DE EJECUCION

UNIDAD DEL ADULTO MAYOR

OBJETIVO

Contribuir a la Prevención, disminución y erradicación de la violencia, y vulneración a los Derechos de las personas adultas mayores, brindando tratamiento psico-socio- legal adecuado a las denuncias de personas Adultas Mayores.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORTALECIMIENTO Y APOYO ADULTOS MAYORES LEY 369

Presupuesto programado	Ejecutado	Por ejecutar	Porcentaje
24.429,00	13.356,90	11.072,10	54,68%



G.A.M.LL.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA

GESTIÓN 2022

INFORME DE EJECUCION



FUNCIONAMIENTO UMADIS



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Demandas remitos al Juzgado
- Tramites realizados ante SERECI, SEGIP en favor de personas con discapacidad
- Visitas realizadas a los domicilios de personas con discapacidad para obtener información sobre las condiciones de vida de los mismos.
- Atención en oficina de distintos casos por parte del personal de UMADIS
- Se solicito la conformación del Equipo de Calificación.
- Reuniones de coordinación con diferentes instituciones.
- Talleres dirigidos a favor de Personas con Discapacidad y a la población.

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
40.000,00	13.497,34	27.702,66	31,47

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Refrigerios



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO
Potosí- Bolivia



DETALLE O TIPOLOGIA DE LOS CASOS ATENDIDOS (ENE- ABRI)	CANT.
Visitas domiciliarias realizadas	18
Consultas sobre renovación de Carnet de Discapacidad	7
Consultas sobre la nueva afiliación para obtener Carnet de Discapacidad	21
Consultas sobre el bono de discapacidad	102
Consultas sobre el Tramite de Libreta de Servicio Militar Auxiliar "D"	2
Consultas sobre mejoramiento de viviendas	2
Tramite de reposición de carnet de discapacidad	2
Consultas sobre la habilitación en plataforma de Eustaquio Moto Méndez	22
Consultas sobre el paquete alimentario	11

DETALLE O TIPOLOGIA DE LOS CASOS ATENDIDOS (ENE- ABRI)	CANT.
Consultas respecto al tramite de tutor Legal	2
Consultas sobre los beneficios que tiene una persona con discapacidad	2
Informes sociales	7
Denuncias atendidos	6
Carnets de discapacidad entregados	5
Asesoramientos brindados en problemas familiares, negación de paternidad, asistencia familiar, declaración de herederos, etc.	6
Casos remitidos a la fiscalía	0
Casos remitidos al juzgado	3
Casos con detención preventiva	0
Casos con acusación formal	1
Casos con sentencia	1
TOTAL	209





DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA





Funcionamiento Defensoría de la Niñez y Adolescencia



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Actividad carnavalera “ prevención de embarazos en adolescentes”
- Intercambio de experiencias “PROGRAMA ENTORNOS SEGUROS” en coordinación con Save the Children
- Presentación de informe CAI DE PROTECCION en coordinación de Visión Mundial .
- Operativos de coordinación con la policía.
- Gestión de apoyo de solidario para niños y niñas de bajos recursos en coordinación con diferentes instituciones.
- Operativos programa Mochila Segura en las distintas unidades educativas .
- Feria de concientización “ CONECTATE CON TU NIÑO”
- Caravana de socialización por el día del niño con la participación de diferentes autoridades e instituciones .

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
300.000	119.644,92	180.355,08	60 %

- Salario Personal de Servicio
- Servicios Básicos
- Viáticos y Pasajes
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales
- Servicios de Fotocopias e imprenta y otros



Funcionamiento Defensoría de la Niñez y Adolescencia



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Acto de "Sesión de honor de concejalitos" por día del niño .
- Operativos en buses actividad excursiones de las diferentes unidades educativas "
- Feria de corte de cabello gratis para niños y niñas de la unidad educativa German Busch
-





Funcionamiento Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Casos atendidos por el Área Legal	Nº de casos
- Demandas de Asistencia Familiar	150
- Procesos Penales	39
-Procesos de Guarda	16
-Procesos de tutela	13
-negligencia y violencia	68
- Acogimientos Institucionales	26
Resumen casos atendidos por las 4 defensorías de la niñez y adolescencia	312





SERVICIO DE FAENADO DE GANADO





Funcionamiento Matadero Municipal



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Limpieza e higiene del matadero
- Fumigación de la planta de faeneo, control de vectores, roedores y plagas.
- Cloración del Pozo de agua del Matadero Municipal
- Envió de muestreos al laboratorio de SENASAG
- Inspecciones ante y post mortem en corral y en zona de despacho para del mercado central.
- Control de ganado mediante el Sistema gran Paititi Psiringa de SENASAG.
- Emisión de autorizaciones de faeneo de ganado.

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00	70.728.00	179.272,00	28,29

- Salario Personal de Servicio
- Servicios Básicos
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales



GESTIÓN DE RIESGOS





GESTIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Elaboración de 7 reportes sobre eventos climáticos (Inundaciones, granizada y helada)
- Levantamiento de información sobre la afectación de eventos climáticos en distintos sembradíos.
- Indemnización a 1906 familias por el Instituto Nacional del Seguro Agrario a los productores agropecuarios del municipio Llallagua de las campañas agrícolas 2020-2021
- Desinfección a 44 unidades educativas del municipio de Llallagua para prevenir del contagio del covid- 19
- mantenimiento y limpieza de las boca tormentas



PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

150.000,00

59.821,00

94.191,00

38%

- Salario Personal de Servicio
- Adquisición de Materiales y suministros



ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO (ALCOHOL AL 70 % Y AMONIO CUATERNARIO)



DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA PROVEEDOR	WILSON GODOY - FAPROLIMPG
SUPERVISOR	ARMANDO TICONA JORGE
TIEMPO DE EJECUCIÓN	20 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	65 %
FECHA DE ENTREGA	15/03/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
250.000,00	163.791,00	86.209,00	65%



- Adquisición ejecutada físicamente al 100%



RECURSOS HIDRICOS





ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



IMAGEN ACTUAL

DATOS DEL PROYECTO	
EMPRESA CONTRATISTA	SIERRA TRADING S.R.L.
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	05 D/C
AVANCE FISICO	100,00 %
AVANCE FINANCIERO	100,00 %
FECHA DE ENTREGA	21/01/2022

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
49.873,80	49.873,80	0,00

- Proyecto ejecutado físicamente al 100,00 %



IMAGEN ACTUAL



SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA





Gastos de Funcionamiento Policía Regional Llallagua



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
315.692,00 Bs.-	10.249.-	305.443.-	3,25

- Avance Financiero: 3,25
- Presupuesto destinado a: Combustible, material de escritorio, aseo y limpieza.



Equipamiento y Mantenimiento de Equipos Policiales



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
1.895 Bs.-	0 Bs.-	1.895 Bs.-	0 %

•Avance Financiero: 0 %

- Presupuesto destinado a: Equipamiento y Mantenimiento de vehículos y motocicletas y Equipos Policiales.
- En la partida presupuestaria correspondiente se realizo la reformulación de la suma de Bolivianos 75.000 Bs de la partida presupuestaria de Gastos de Funcionamiento Policía Regional Llallagua por que el presupuesto asignado no alcanzaba, donde al presente se encuentra en proceso de mantenimiento y equipamiento de los vehículos policiales correspondientes.



Fortalecimiento a la F.E.L.C.V.



PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
76.318,00 Bs.-	0 Bs.-	76.318,00 Bs.-	0 %

•Avance Financiero: 0 %

- Presupuesto destinado a: Fortalecimiento a la F.E.L.C.V. en Equipamiento y Mantenimiento de vehículos, motocicletas y Equipos de Investigaciones Policiales para la F.E.L.C.V.
- Hasta la presente fecha no se realizo requerimientos o solicitudes correspondientes por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Viloencia (F.E.L.C.V.)



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL





Funcionamiento Balnearios Catavi



RECAUDACION Balnearios catavi		
(Expresado en Bolivianos)		
N°	MESES	MONTO EN Bs.
1	ENERO	34.947,5
2	FEBRERO	31.697,5
3	MARZO	31.926,5
4	ABRIL	37.482,5
5		
6		
TOTAL		141.0540

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
650.000,00	200.187,70	449.812,30	31



- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales



Funcionamiento Terminal de Buses Llallagua



RECAUDACION TERMINAL DE BUSES LLALLAGUA		
Por la gestión terminada al 31 de Abril del 2022 (Expresado en Bolivianos)		
N°	MESES	MONTO EN Bs.
1	ENERO	34.000
2	FEBRERO	53.600
3	MARZO	51.600
4	ABRIL	33.100
TOTAL		172.300.-

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
500.000,00	315.350,84	184.649,16	63

- Salario Personal de Servicio
- Material de Escritorio, Limpieza e Higiene
- Mantenimiento de Arbitrios Municipales



Unidad de Desarrollo Integral Juvenil



ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cumbre municipal de la Juventud.
- Realización de políticas publicas destinadas a la juventud y FOJ.
- Elaborar un plan municipal de la juventud.
- Sacar una reglamentación de la ley 056 a nivel municipal
- Realizar jornada de encuentros juveniles a nivel municipal
- Semana aniversario día municipal de la juventud "23 de julio"
- Talleres dirigidos a la población.

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

%

60.000,00

0

60.000,00

100

- **Observación**
- **No se realizo ninguna actividad por motivos de contratación de personal a destiempo.**
- **El personal recién ingreso en fecha 11 de Abril.**
- **Falta de directiva reconocida de la FOJ**



Fortalecimiento a la Promoción y Desarrollo Económica Local



IMAGEN ACTUAL



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Ferias de promoción agropecuarias en los distritos Ayllu Chullpa y Ayllu Sikuya.
- Curso de capacitación a los sectores productivos

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	%
100.000,00	79.417,00	20.582,00	77%

- Sueldo Resoinsable U.P.E.P.
- Promoción de actividades productivas.



"APOYO A LA MINERÍA" (ADQUISICIÓN DE CALLAPOS L=2.50 M)



IMAGEN ACTUAL

PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
125.151,50	125.151,50	0,00

- Proyecto ejecutado físicamente al 100 %

DATOS DEL PROYECTO

EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA MULTIDISCIPLINARIA HITACHI
SUPERVISOR	ING. GUIDO GARCÍA C.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	05 D/C
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %
FECHA DE ENTREGA	14/12/2021



IMAGEN ANTES DE SU EJECUCION

INFORME DE RECAUDACIONES 1ER CUATRIMESTRE GESTIÓN 2022





RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS

Monto Programado según POA 2022



MONTO ANUAL PROGRAMADO GESTIÓN 2022 EN Bs	MONTO CUATRIMESTRAL PROGRAMADO EN Bs
8'000.000,00	2'666.666,66

Resultados alcanzados hasta el 30 de abril 2022

MONTO CAUSTRIMESTRAL PROGRAMADO	MONTO RECAUDADO 1ER CUATRIMESTRE	%	DEFICIT
2'666.666,66	2'475.387,30	92,82	- 191.279,36

Recaudación Municipal es por el cobro de Impuestos Municipales (Inmuebles, Vehículos y Patentes) y por otros ingresos (Alquiler de predios, uso de Balnearios Catavi, Piscina 1º de Mayo, terminal de Buses, Camal Municipal y otros.)





RECAUDACIÓN POR COBRO A LOS PATENTES



RECAUDACIÓN GLOBAL POR MES EN Bs

ENERO	8.605,00
FEBRERO	4.174,00
MARZO	11.561,00
ABRIL	11.076,00
TOTAL	Bs 33.789,00

IMÁGENES DEL COMERCIO CON PATENTES

RECAUDACIÓN IMPUESTO A LOS PATENTES	MONTO RECAUDADO 1ER CUATRIMESTRE 2022
Bs 33.789,00	Bs 33.789,00

- La recaudación realizada por el cobro de patentes desde 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022



IMÁGENES DE TIENDAS



RECAUDACIÓN POR COBRO DE IMPUESTO A LAS VIVIENDAS

RECAUDACIÓN GLOBAL POR MES EN Bs

ENERO	83.104,00
FEBRERO	97.921,00
MARZO	194.199,00
ABRIL	292.530,00
TOTAL	Bs 647.750,00



IMAGEN DE VIVIENDAS LLALLAGUA

RECAUDACIÓN IMPUESTO A BIENES INMUEBLES	RECAUDACIÓN IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS	MONTO RECAUDADO 1ER CUATRIMESTRE 2020
Bs 498.674,00	Bs 149.076,00	Bs 647.750,00

- La recaudación realizada por el cobro de impuestos y transferencias de inmuebles desde 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022



IMÁGENES DE VIVIENDAS



RECAUDACIÓN POR COBRO DE IMPUESTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES



RECAUDACIÓN POR MES 2022 EN Bs

ENERO	36.658,00
FEBRERO	27.649,00
MARZO	36.865,00
ABRIL	198.103,00
TOTAL	Bs 286.473,00

IMAGENES DE VEHÍCULOS

RECAUDACIÓN 1ER CUATRIMESTRE IMPUESTO A LOS VEHICULOS AUTOMOTORES	RECAUDACIÓN 1ER CUATRIMESTRE IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS	RECAUDACIÓN 1ER CUATRIMESTRE RECIBOS	MONTO 1ER CUATRIMESTRE RECAUDADO GLOBAL 2022
Bs 274.909,00	Bs 6.186,00	Bs 5.378,00	Bs 286.473,00

- La recaudación por cobro a los impuestos de vehículos automotores y transferencias desde 1 de enero hasta el 30 de abril 2022





RESUMEN DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS



RECAUDACIÓN GLOBAL POR MES GESTIÓN 2022 (EN Bs)

ENERO	547.714,70
FEBRERO	472.882,15
MARZO	667.313,35
ABRIL	787.477,10
TOTAL	2.475.387,30

MONTO TOTAL
RECAUDADO 1ER
CUATRIMESTRE
GESTION 2022

Bs 2'475.387,30

RECAUDACIÓN 1ER
CUATRIMESTRE POR
IMPUESTOS
MUNICIPALES

Bs 968.012,00

RECAUDACIÓN 1ER
CUATRIMESTRE POR
OTROS INGRESOS

Bs 1'507.375,30

- La recaudación realizada por el cobro de impuestos municipales, tasas y otros gravámenes desde 1 de enero hasta el 30 de abril de 2022



IMAGEN DEL COMERCIO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA



GRACIAS...

